



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMNBRADO PUBLICO EN PROL. DE AVE. HOMERO Y C. SAM MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICION DE LA ESCLAVITUD (AMPLIACIÓN) No CONTRATO 196/2017
CARACTERISTICAS: COLOCACIÓN DE POSTES CON SUS RESPECTIVAS LAMPARAS, ASI COMO 1 SUBESTACIONES DE 25 KVA OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-465

MONTO DE CONTRATO: \$143,537.83
MONTO DE CONVENIO:

CON IVA
CON IVA

MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.DE.C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 08 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 27 DE DICIEMBRE DE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: No procedió
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO: Se requiere elaborar el convenio

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCION


ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$
REAL: \$ 609,136.52
POR PARTIDA POR PARTIDA
PROGR. REAL PROGR. REAL

1
2
3
4
5
6
7
8

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

GRAFICA DE AVANCE

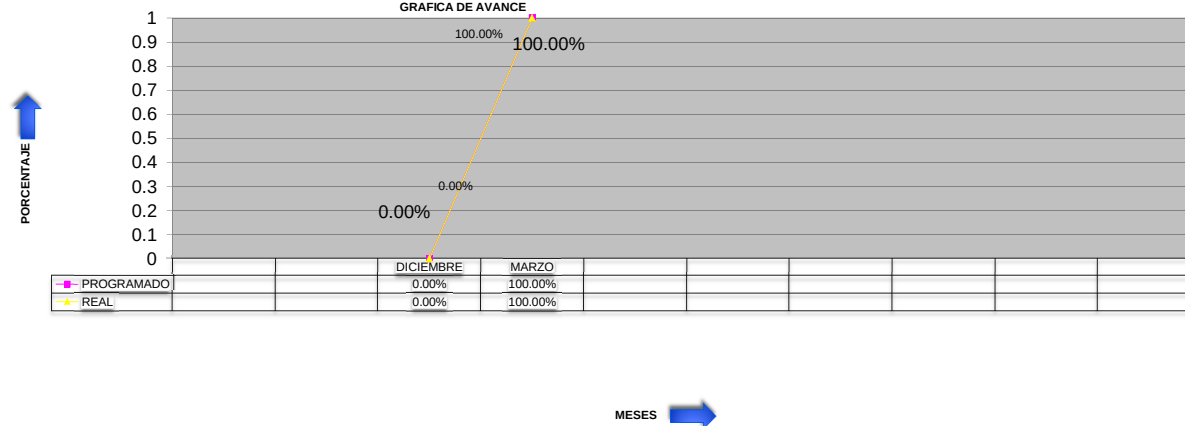

PROGRAMA OBRA

DICIEMBRE MARZO
0.00% 100.00%
0.00% 100.00%

PROGRAMADO
REAL

13 DE MARZO DE 2018

