



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA980529MW0
PROGRESO 102 - 1
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
CHIHUAHUA, México C.P. 31000
(601) General de Ley Personas Morales
Teléfonos: 614-4109550
Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Factura M 75
Folio fiscal
3e15f147-aa06-4231-a085-caee0c9ef649
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2018-05-22 18:21:58
Lugar Expedición: 31000

RFC	MCI651010V22	Fecha expedición	22/05/2018 18:21:57
Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	(P01) Por definir
Calle	CALLE MINA 408		
Colonia	CENTRO Municipio CHIHUAHUA C.P. 31000		
Ciudad, Estado	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	Fecha pago	22/05/2018

Concepto	Monto
ESTIMACIÓN 1 (UNO) RELATIVO A: RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP. DE ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	MONTO BASE 1,074,750.89

72101500 (E48) Unidad de servicio
Traslado Base 1,074,750.89 (002)
IVA 0.160000 171,960.14

AJUSTE DE COSTOS 0.00
(+)

Traslado Base 0.00 0.00

AMORTIZACION 0.00
ANTICIPO (-)*

SUB TOTAL 1,074,750.89

(002) IVA 16 % (+) 171,960.14

SUB TOTAL CON IVA 1,246,711.03

CMIC 0.20 % 2,149.50

DIF 0.20 % 2,149.50

Total Retenciones Locales 4,299.00

TOTAL RETENCIONES (-) 4,299.00

SANCION POR RETRASO (-) 0.00

SUB TOTAL MENOS RETENCIONES 1,242,412.03

RETENCION POR RETRASO (-) 0.00

REINTEGRO RETENCION (+) 0.00

Traslado Base 0.00 0.00

OTRAS SANCIONES (-) 0.00

TOTAL FACTURA 1,242,412.03

CONTRATO NO. 040/2018

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 03/100 M.N.

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Condiciones pago : crédito Forma pago : (99) Por definir

Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000409201741

Sello digital del CFDI

Md/cNt0XhtgXen1K2pm7rwyMig5zIahVIWR/HgHg410IXpgs3pggt21VhLoT15DeqPJf2x+6cDaaQzYGP510I+0A0HHSXF0EdeUhcuaTfIBB10W7W44YQf3/2PPv9F8Gx386PdBATep8hWv2Urg81YCT53VBPA/HQhsmY09WD1BSCoyumhQ9EjRbhlSGxd0VcD0RNHU/HODg+pywp41T7jgHV1/OHfac+ouBgx8Wg8UAUvM1sT8UoWhLhrJ2wupbMIKb4ufEcd88HJKzbaTj4hLMHJKAha15i7I2voAacJPgvVjVaCsm1s/0o7r7F/2r+twANs1WKd0/WiFw==

Sello del SAT

h0oRh10cKoeLVX121ncq20CCX90YktBp8PDhxx2xrp5/ud2Ffg0Kgu/tNYouuYKkngTpQhyxrvvpD28f/9IdfEvs+3jd6cm06Vi2aKQBwupM/34fImtZicdFU27p0c3FM0d1ZbeACAdMgK5sRBN2ZKs2v05g3Hz5ms12BdDlx2tb2TvwvpcU6+4YGPkRe+zUjkl0CeU/NMxKvhdVaBqgnhTlW1aJSHmdkUsKer0En68jaZcggGuA0PsjjXCsAwGsy/mir2AsC2mdGb6R9ntu91Rh8tcfh7LeLEQ138dh0AOS18+aDa9D/BgiVpEEqQ/1E70NpJvH2iMzn8Ihg4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111,113e15f147-aa06-4231-a085-caee0c9ef649|2018-05-22T18:21:58|LSO1306189R5|Hc/cNt0XhtgXen1K2pm7rwyMig5zIahVIWR/HgHg410IXpgs3pggt21VhLoT15DeqPJf2x+6cDaaQzYGP510I+0A0HHSXF0EdeUhcuaTfIBB10W7W44YQf3/2PPv9F8Gx386PdBATep8hWv2Urg81YCT53VBPA/HQhsmY09WD1BSCoyumhQ9EjRbhlSGxd0VcD0RNHU/HODg+pywp41T7jgHV1/OHfac+ouBgx8Wg8UAUvM13T8UoWhLhrJ2wupbMIKb4ufEcd88HJKzbaTj4hLMHJKAha15i7I2voAacJPgvVjVaCsm1s/0o7r7F/2r+twANs1WKd0/WiFw==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA980529MW0	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E15F147-AA06-4231-A085-CAEE0C9EF649	2018-05-22T18:21:57	2018-05-22T18:21:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,242,412.03	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
[Sistema Informex \(https://www.informex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.informex.org.mx/gobierno/federal/home.action)
[INAI \(http://inicio.ifa.org.mx/SitePages/ifa.aspx\)](http://inicio.ifa.org.mx/SitePages/ifa.aspx)
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfu/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfu/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.





Síguenos en:

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 040/2018	CONTRATADOS
OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 1,799,989.08 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 25 de abril al 15 de mayo de 2018	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,246,711.03 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$
RFC CMA-980529MW0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,246,711.03 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 1,074,750.89 ✓	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 1,074,750.89 ✓	

DESCUENTOS			
0.20% C.M.I.C.	\$	2,149.50 ✓	
0.20% DIF	\$	2,149.50 ✓	
SUMA DESCUENTOS	\$	4,299.00 ✓	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	1,074,750.89 ✓	
AMORT ANTICIPO	\$	0.00	
SUB-TOTAL	\$	1,074,750.89 ✓	
I.V.A.	\$	171,960.14 ✓	
TOTAL	\$	1,246,711.03 ✓	
(CON LETRA)			
(UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 3/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	4,299.00 ✓	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	1,242,412.03 ✓	

AUTORIZO	ELABORO
	
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
	
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA	ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 de mayo de 2018

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$1'242,412.03 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 3/100 M.N.) COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 040/2018 POR LA CANTIDAD DE : \$1'799,989.08 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP

		ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	1,074,750.89
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
		SUBTOTAL	\$	1,074,750.89
		IVA	\$	171,960.14
		TOTAL	\$	1,246,711.03
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
C.M.I.C. DEL 0.2%	2,149.50			
D.I.F. DEL 0.2%	2,149.50			
SUMA	4,299.00			

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

		CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$	1,799,989.08
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	1,246,711.03
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	1,246,711.03
POR EJERCER	\$	553,278.05

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

		CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

<u>ACTADAS EN CONTRATO</u>	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -		\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 2,149.50	\$ -	\$ 2,149.50
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,149.50	\$ -	\$ 2,149.50

R E C I B I M O S



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA-980529MW0

OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH
UBICADO EN LA COLONIA CDP

No. CONTRATO: 040/2018

ESTIMACIÓN No. 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 25 de abril al 15 de mayo de 2018

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

\$1,074,750.89

SUBTOTAL	\$1,074,750.89
I.V.A.	\$171,960.14
TOTAL	\$1,246,711.03

POR EL CONSTATISTA

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ERNESTO PEREZ BAILON

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN No. 1 PERIODO: 25 de abril al 15 de mayo de 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	


OBRA NORMAL

\$1,074,750.89

1	Trazo con cal, medición, profundidad y referenciación de línea general, tomas domiciliarias y cruceros contruidos de agua potable, y elaboración de planta de obra terminada; incluye materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	ml	650.00	118.00	0.00	118.00	\$7.93	\$935.74
2	Excavación en zanjas, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad, en seco o en presencia de agua, tablestacado para mantener estabilidad de taludes, donde ser requiera. Por unidad de obra terminada, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, sobreexcavaion, afine y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	2,443.50	443.32	0.00	443.32	\$142.11	\$63,000.21
3	Plantilla a base de caliche para apoyo de tubería, incluye: selección y volteo del material, incorporacion de agua, acomodo, apisionado con pison de mano, formacion de apoyo semicircular (conchas) en camapanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a a misma, etc. p.u.o.t.	m3	78.00	14.16	0.00	14.16	\$127.15	\$1,800.44

POR EL CONTRATISTA

IC. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION

ING. ERNESTO PEREZ BAILON

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN No. 1 PERIODO: 25 de abril al 15 de mayo de 2018

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
No.	DESCRIPCIÓN				VOL. ESTIMADO		
5	5 Suninistro de tubería de PVC de 24" (630mm) de diametro Serie 20, con campana y junta hermetica de material elastomerico, serie metica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra	ml	650.00	650.00	0.00	\$1,552.33	\$1,009,014.50

POR EL CONTRATISTA


IC. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ERNESTO PEREZ BAILON

ANEXO 1

CONTRATO:	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	1		
CONCEPTO:	1		

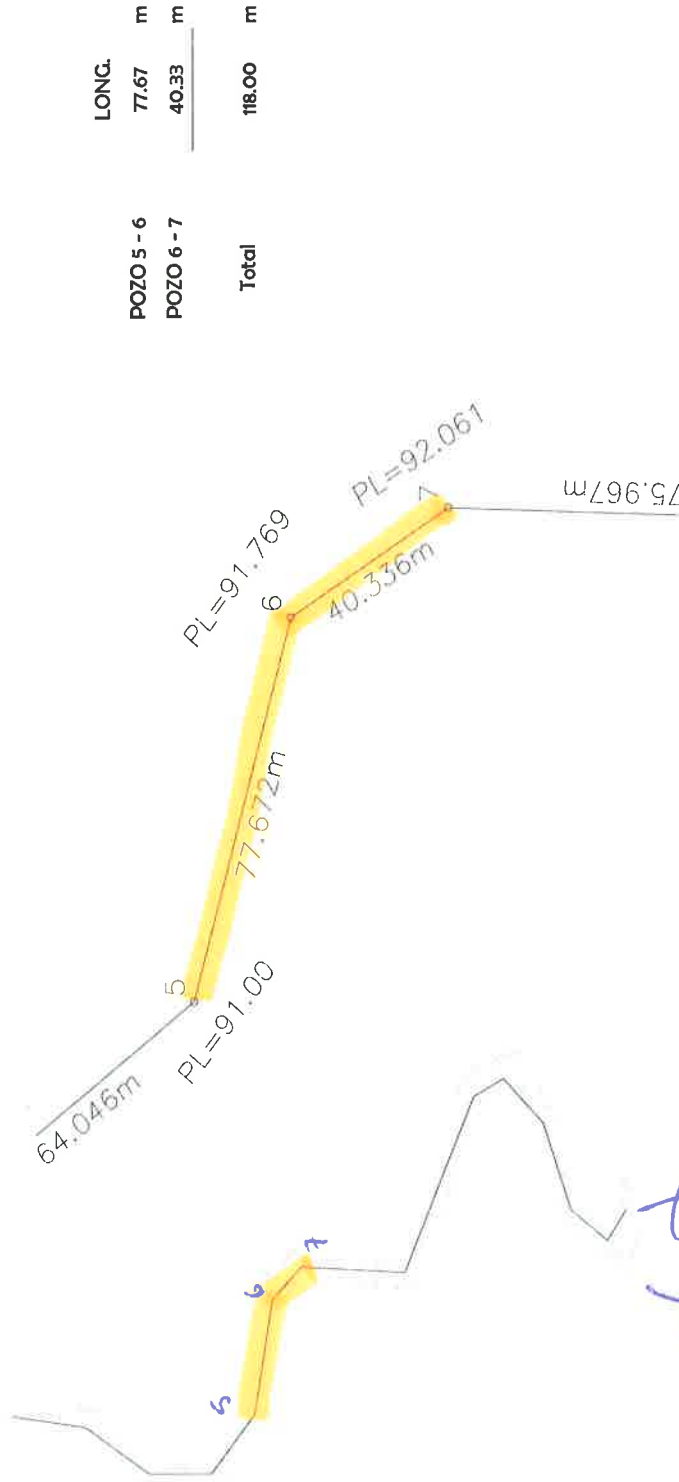



TOTAL 118.00

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	1		
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO :	1		
REPORTE FOTOGRAFICO			

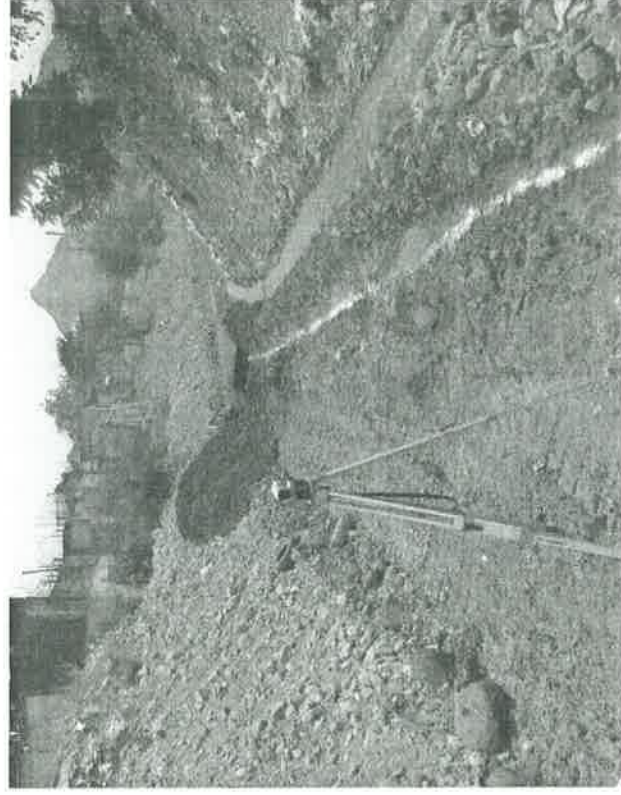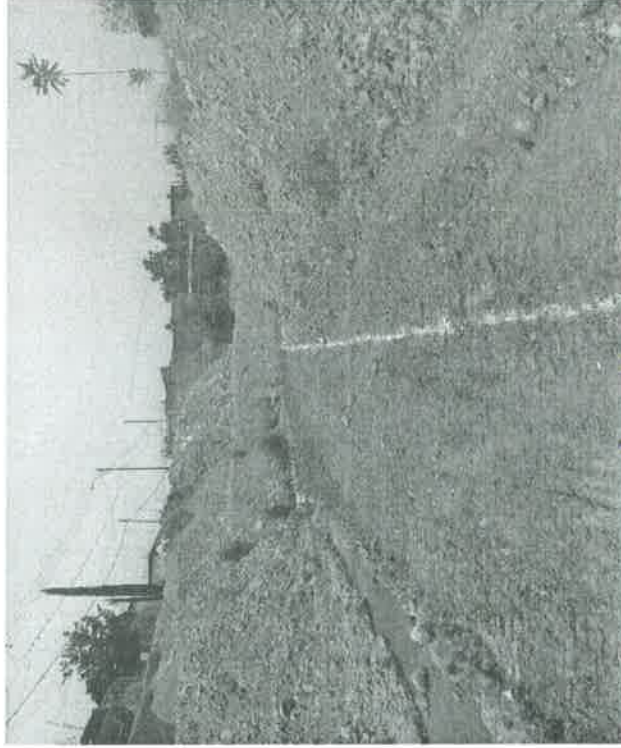


RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO : 040/2018		TRAMO: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.	
OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	1		

CONCEPTO	2	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Excavacion en zanjas, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificaci3n y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificaci3n y profundidad, en seco o en presencia de agua, tablestacado para mantener estabilidad de taludes, donde se requiera. Por unidad de obra terminada. incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta ,sobreeexcavacion, afine y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n. .	TOTAL	443.32 M3	ANEXO	443.32
TOTAL				443.32

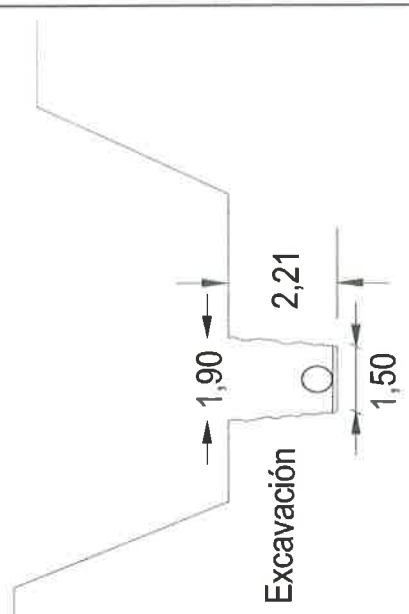

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.


CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION	1		
CONCEPTO :	2		

POZO 5 - 6	77.67	m
POZO 6 - 7	40.33	m
Total	118.00	m

LONG.

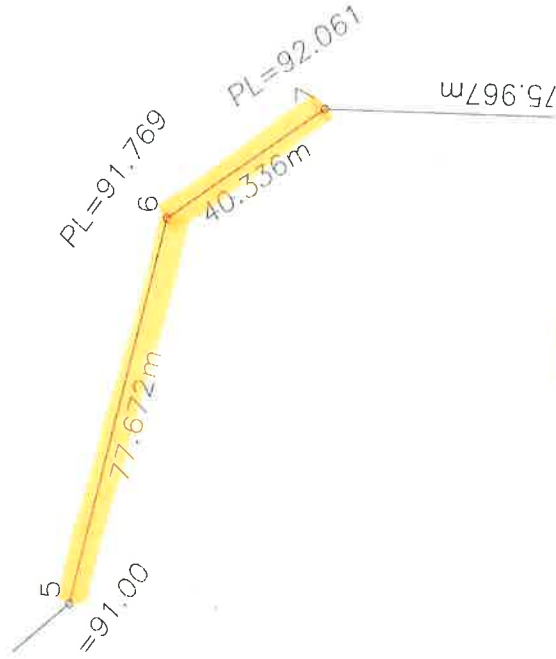

Excavación

$$\text{Excavación} = 118 \text{ m} \times 2.21 \text{ m} \times (1.90 + 1.50 \text{m}) / 2 = 443.32 \text{ m}^3$$

TOTAL 443.32 M3

RESIDENTE

ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

ANEXO 2

CONTRATO : 040/2018		TRAMO: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.	
OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	1		
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO :		2	

ALTURAS DE EXC.		ALTURAS DE EXC.	
ALTURAS		ALTURAS	
1	2.1	19	2.05
2	2.1	20	1.94
3	2.12	21	2.1
4	2.12	22	3.03
5	2.17	23	2.14
6	2.43	24	2.07
7	3.21	25	2.1
8	1.82	26	2.16
9	2.27	27	2.08
10	4.11	28	1.93
11	2.34	29	1.9
12	2.23	30	1.97
13	2.12	31	2.05
14	3.1	32	2.1
15	2.05	33	2.22
16	2.05	34	1.03
17	2.14	35	2.07
18	2.1	TOTAL	77.5 M

ALTURA PROMEDIO = 77.5 / 35 = 2.21 M

TOTAL	2.21 M
-------	--------

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION	1		
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO :	2		

REPORTE FOTOGRAFICO



EXCAVACIONES


RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	1		

CONCEPTO	3	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Plantilla a base de caliche para apoyo de tubería. Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, etc. p.u.o.t.	TOTAL	14.16 M3	ANEXO	TOTAL
				14.16 M3

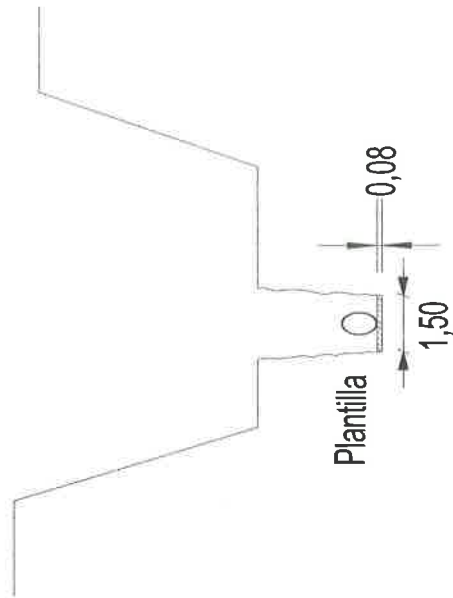

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	1		
CONCEPTO :	3		

	LONG.
POZO 5 - 6	77.67 m
POZO 6 - 7	40.33 m
Total	118.00 m

Plantilla = 118 m x 0.08 m x 1.50 m = 14.16 m³

TOTAL 14.16 m³


RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION			
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO :	3		

REPORTE FOTOGRAFICO

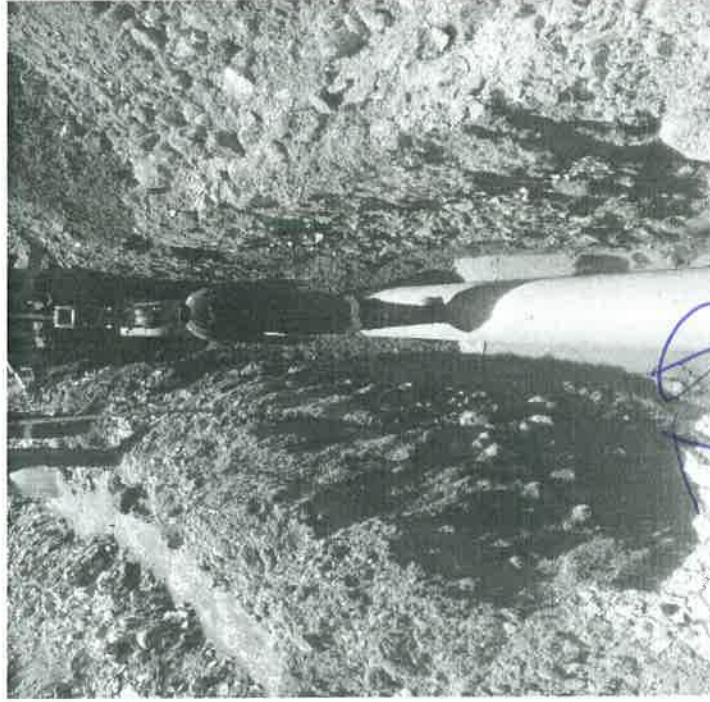

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.		
No. DE ESTIMACION	1		

[illegible]

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

ANEXO 1

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA: RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	1		
CONCEPTO :	5		

TOTAL 650 M

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	040/2018	TRAMO:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA CDP.
OBRA:	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP.	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION			
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO :	5		
REPORTE FOTOGRAFICO			



TUBERIA DE 24 PULGADAS

RESIDENTE

ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA, CHIH. 15 de mayo de 2018

ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COLONIA CDP

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 25 de abril al 15 de mayo de 2018
POR UN SALDO NETO FACTURADO [**\$1,246,711.03** ✓ CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

RECIBE



ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.
