



R.F.C. TCO-810120-DN4 REG.CNIC-22902
CARBONEL #3702 TELS. 413-45-45 Y 426-57-28 CHIHUAHUA, CHIH.

TEPORACA
CONSTRUCTORA SA DE
CV
RFC: TCO810120DN4

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de Expedición: 31203
Régimen Fiscal: 601 - General
de Ley Personas Morales

Forma de pago 02 - Cheque nominativo
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

CH - 808
1/6/2018 11:59:34

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141107 - Servicio de construcción y reparación de puentes	ESTIMACION PUENTE ESTIMACION No. 2 (DOS) Construcción de Puentes en Fraccionamiento Santa Clara en Cd. Chihuahua, Chih. según contrato de Obra Pública No. 034/2018. PERIODO DEL 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018 ALCANJE DE LA ESTIMACION \$622,985.20 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$186,895.56 SUBTOTAL(1) \$436,089.64 16 % I.V.A. \$69,774.34 SUBTOTAL(2) \$505,863.98 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% INST. CAPACIT. C.M.I.C. \$1,245.97 0.2% OBRAS BENEFICIO SCCAL \$1,245.97 SUMA \$2,491.94 NETO A RECIBIR \$503,372.04	436,089.64	0.00	002 - IVA - Tasa - 0.16000 - 69,774.34000 BASE DEL IMPUESTO 436,089.64	

Importe con letra:
QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.

Subtotal	436,089.64
Impuestos Traslados IVA 16%	69,774.34
Total	505,863.98

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de Autorización
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408010822
99D4AD09-9BB7-4FE5-8675-F9AF4A9B08D7
00001000000404486074
Junio 1 2018 - 12:59:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
Nopob0HhmiZnvtNpUvvoCfNkdBqNp385leUzguc3M/KcdThz5f8R9S/tnMd2cnPtdH+/I/7vS46vAFOydz
Uy7PmWP2bF7gW06ApF2zdyX/ISNsWtl5FUAg1VhJPySSfV9UrnS022mVB5UJRFJF66P3xRoTlJGxRPafes:Y6


Lp9yXalOvuQMGSuDbY0kEq3cxQpE0MmHYxalUB6uOTH+y8r4wAhvcYX8C+ITejnt8+HxSSZ+rmCPVBOWcv5
dngYTTICVIOsWgAFIEy/Bk83Opu127mcsHus2q6++hbPGq7btNxf0D15h5SpdZVPKLxxv17bk3XcBvFKreAg==

Seillo del SAT

WlqBlybCWx0TjXE25MX2gNqld9g/ehoNPaAKqGP28kn5gPUA2J9GyBmaWtuq294NcjIP6eBouxxlbWuozm
/RVnP2ox7x5MIP8lp4xh32/721G+ywkQawjk5VnmbSVqQMCAHvCFXl/IU8lyz02RHu+qfqrRlbhTFP
8J25w+xCx2IGMvC+mL/uK3w0NdVNaKMZu0pqcE4g2KJPE++NTUCqOyR9LDdbzr/FzSIOAhE1KhaEOx4
VLJ3RKSgn4URXDagmq7TkeonkEXmv2Ynxv5tqh5o5aNJkPazVedRpuRas5oaSMHy6y+UdggXwpkHEoK
hr6WUSeXcf50zrPF8JGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|99D4AD09-98B7-4FES-8675-F9AF4A9B08D7|2018-06-01T12:59:37|MAS0810247C0|Napo
B0hHmh2mvtNpFGUvyoCfNkdBqNp985ieUZguc3M/KcDThz5f8R9GitrMd2cnPtHd+/Bx5sl6vAPOy
zdUy7PmWP2bF7gWO6ApF2zdyX/15NsWtISFUAg1Vj+JPYSSIV9Ums021mVBbUJRF1F66P3wRoTLJGxa
RPafo5Y6Lp9yXalOvuQMGSuDbY0kEq3cxQpE0MmHYxalUB6uOTH+y8r4wAhvcYX8C+ITejnt8+HxS
SZ+rmCPVBOWcv5dngYTTICVIOsWgAFIEy/Bk83Opu127mcsHus2q6++hbPGq7btNxf0D15h5SpdZVPKL
xxv17bk3XcBvFKreAg=|00001000000404486074|]



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



[Handwritten signature]

Proporcione los dígitos de la imagen*:

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCO810120DN4	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99D4AD09-9BB7-4FE5-8675-F9AF4A9B08D7	2018-06-01T11:59:34	2018-06-01T12:59:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$505,863.98	Ingreso	Vigente	

Imprimir

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'C. [illegible]'. To the right of the center, there is a signature that looks like 'D. [illegible]'. At the bottom right, there is a small, simple signature.

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

[\(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'C' and a signature that appears to say 'Quiero saber más']

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

31 DE MAYO DEL 2018

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 034/2018	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 4,399,802.55 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 1o DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018.	
UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 722,662.83 CON IVA
CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 49,965.17 CON IVA
RFC TCO 810120 DN4	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 772,628.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 622,985.20 ✓	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 622,985.20 ✓	

DESCUENTOS			
0.2% I.C.I.C.	\$	1,245.97 ✓	
0.2% D.I.F.	\$	1,245.97 ✓	
SUMA DESCUENTOS	\$	2,491.94 ✓	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	622,985.20 ✓	
AMORT ANTICIPO	\$	186,895.56 ✓	
SUB-TOTAL	\$	436,089.64 ✓	
I.V.A.	\$	69,774.34 ✓	
TOTAL	\$	505,863.98 ✓	
(CON LETRA)			
(QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	2,491.94 ✓	
Saldo NETO A RECIBIR	\$	503,372.04 ✓	

AUTORIZO	ELABORO
 ING. ERNESTO PÉREZ BAYLON RESIDENTE D.O.P.M. Vo. Bo.	 TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CONTRATISTA REVISO
 ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Vo. Bo.	 ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA
 ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE MAYO DEL 2018

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ **503,372.04**
(QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 4/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 034/2018 POR LA CANTIDAD DE: \$ 4,399,802.55 INCLUYE CONVENIO
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 55/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	622,985.20
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	186,895.56
	SUBTOTAL	\$	436,089.64
	IVA	\$	69,774.34
	TOTAL	\$	505,863.98
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
0.2% DEL I.C.I.C.	1,245.97		
0.2% DEL D.I.F.	1,245.97		
SUMA	2,491.94		
		NETO A RECIBIR \$	503,372.04

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 4,399,802.55
CONVENIOS MODIFICATORIOS	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 49,965.17
ESTA ESTIMACION	\$ 722,662.83
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 772,628.00
POR EJERCER	\$ 3,627,174.55

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,319,940.77
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 14,989.55
ESTA ESTIMACION	\$ 216,798.85
ACUMULADO ACTUAL	\$ 231,788.40
POR AMORTIZAR	\$ 1,088,152.37

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DEL I.C.I.C.	0.2% DEL D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 86.15	\$ 86.15
ESTA ESTIMACION	\$ 1,245.97	\$ 1,245.97
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,332.12	\$ 1,332.12

R E C I B I M O S


TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
TCO 810120 DN4



31 DE MAYO DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
MUNICIPIO: FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
PERÍODO: DEL 1o DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018.
ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)
No. CONTRATO: 034/2018

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			IMPORTE	
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS			
NORMALES				
III	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$	365,348.08	622,985.20
IV	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	\$	255,847.60	
V	TRABAJOS DIVERSOS	\$	1,789.52	

SUBTOTAL	\$	622,985.20
I.V.A.	\$	99,677.63
TOTAL	\$	722,662.83

POR EL CONTRATISTA

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ

POR EL DPTO DE CONSTRUCCION
SUPERVISION

ING. ERNESTO PEREZ BAYLON



OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
MUNICIPIO:	FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
CONTRATISTA:	TEFORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
PERIODO:	DEL 1o DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018.
ESTIMACION No.	2 (DOS)
No. CONTRATO:	034/2018

31 DE MAYO DEL 2018

CONCEPTOS		DESCRIPCION	VOLUMENES				PRECIO		IMPORTE
No.			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		x

TOTAL ESTIMADO

OBRA NORMAL									
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE									
11	047-D.-02.d).1)	Rellenos para la protección de las obras de drenaje formado con material del banco que elija el contratista en capas de 20 cms. de espesor, con tma 2 1/2", para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: material, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización.	m3	299.00	30.48	0.00	30.48	\$ 191.24	\$ 622,985.20
12	047-E-13.a)	Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-arena 1:3 utilizada en estribos y aleros. Incluye: Materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m3	545.00	219.00	0.00	219.00	\$ 1,411.78	\$ 309,179.82
13	047-F-07.c)	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f'c= 200 Kg/cm2, utilizado en zampado y dentellón. Incluye: materiales, bombeado, cimbra aparente, descimbrado, vacado, a cualquier altura, equipo, herramienta, mano de obra, vibrado, acarreo, las maniobras necesarias y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	100.10	19.13	0.00	19.13	\$ 2,631.43	\$ 50,339.26
17	047-H-04-a)2)a)1)	ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO Suministro de acero de refuerzo, L.A.B. puesto en obra, varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 Kg/cm² para los diferentes elementos estructurales. Incluye: adquisición de materiales (Se pagaran volúmenes de proyecto puestos en almacén del lugar de la obra), volumen de desperdicio, cargas, descargas y almacenamientos dentro de la obra.	kg	16,700.00	13,689.01	0.00	13,689.01	\$ 18.69	\$ 255,847.60
21	047-Y-22.b)	TRABAJO DIVERSOS Suministro y colocación tubería de 4" de diámetro de PVC, utilizada en drenes. Incluye: materiales, mano de obra, sujeción, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m	280.00	23.04	0.00	23.04	\$ 77.67	\$ 1,789.52

[Signature]

POR EL CONTRATISTA
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ
TEFORACA CONSTRUCTORA SA DE CV

[Signature]

POR EL DEPTO DE CONSTRUCCION
ING. ERNESTO PEREZ BAYLON

GENERADOR DE OBRA			
CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA:	
		TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO	11	RESUMEN	CROQUIS
Relleno para proteccion de las obras de drenaje en capas de 20 cms, al 90 % por unidad de obra terminada.		ANEXO	
ZAPATA N.-1 PTE ACCESOS			
ZAPATA VOL= (0.87 + 0.50)/2 X (1.50) X (19.32) = VOL= (0.69) X (1.50) X (19.32) = VOL= 20.00 M3 ✓			
ALERO DER. VOL= (1.25 + 0.87 +0.50)/3 X (1.50 + 0.50)/2 X (6.00) = VOL.= (0.87) X (1.00) X (6.00) = VOL= 5.24 M3 ✓			
ALERO IZQ. VOL= (1.25 + 0.87 +0.50)/3 X (1.50 + 0.50)/2 X (6.00) = VOL= (0.87) X (1.00) X (6.00) = VOL= 5.24 M3 ✓			
TOTAL		30.48 M3 ✓	30.48 M3


CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.


ANEXO 1

CONTRATO:	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO:	II		


ZAPATA N.-I
PTE ACCESOS



ALERO IZQ.



MURO



ALERO DER.

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO :	11		

REPORTE FOTOGRAFICO



RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO: 034/2018		TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO	12	RESUMEN	CROQUIS
Suministro y colocacion de mamposteria de tercera, acentada con mortero cemento.		ANEXO	
ZAPATA N.-1 PTE. ACCESOS VOL = $(19.32 \times 2.00) \times (0.50)$ VOL = 19.32 M3 ✓ ALERO DER. VOL = $(2.00 + 1.00)/2 \times (0.50) \times 6.00$ VOL = 4.50 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL = $(2.00 + 1.00)/2 \times (0.50) \times 6.00$ VOL = 4.50 M3 ✓ MURO N.-1 PTE. ACCESOS VOL = $(1.40 + 1.15)/2 \times (1.00) \times 19.32$ VOL = 24.63 M3 ✓ ALERO DER. VOL = $(1.15 + 0.50)/2 \times (1.42 + 0.50)/2 \times 6.00$ VOL = 4.75 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL = $(1.15 + 0.50)/2 \times (1.42 + 0.50)/2 \times 6.00$ VOL = 4.75 M3 ✓ TOTAL 62.45 M3 ✓			
		VOLUMEN A PAGAR	

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO: 034/2018		TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO	12	RESUMEN	CROQUIS
Suministro y colocacion de mamposteria de tercera, acentada con mortero cemento.		ANEXO	
ZAPATA N.-2 PTE. ACCESOS ZAPATA VOL= $(19.32) \times (2.00) \times (0.50)$ ✓ VOL= 19.32 M3 ✓ ALERO DER. VOL= $(2.00 + 1.00)/2 \times (0.50) \times 5.00$ VOL= 3.75 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL= $(2.00 + 1.00)/2 \times (0.50) \times 5.00$ VOL= 3.75 M3 ✓ MURO N.-2 PTE. ACCESOS MURO VOL= $(1.40 + 1.15)/2 \times (1.00) \times 19.32$ VOL= 24.63 M3 ✓ ALERO DER. VOL= $(1.15 + 0.50)/2 \times (1.42 + 0.50)/2 \times 5.00$ VOL= 3.96 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL= $(1.15 + 0.50)/2 \times (1.42 + 0.50)/2 \times 5.00$ VOL= 3.96 M3 ✓ TOTAL 59.37 M3 ✓			
		VOLUMEN A PAGAR	

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

GENERADOR DE OBRA			
CONTRATO :	034/2018	TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO	12	RESUMEN	CROQUIS
VOLUMEN A PAGAR		ANEXO	
Suministro y colocacion de mamposteria de tercera, acentuada con mortero cemento.		ZAPATA N.-1 PTE. ALBACETE ZAPATA VOL = $(14.58) \times (2.00) \times (0.50)$ VOL = 14.58 M3 ✓ ALERO DER. VOL = $(2.00 + 1.00)/2 \times (0.50) \times 5.00$ VOL = 3.75 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL = $(2.00 + 1.00)/2 \times (0.50) \times 5.00$ VOL = 3.75 M3 ✓ MURO N.-1 PTE. ALBACETE MURO VOL = $(1.40 + 1.15)/2 \times (1.00) \times 14.58$ VOL = 18.59 M3 ✓ ALERO DER. VOL = $(1.15 + 0.50)/2 \times (1.42 + 0.50)/2 \times 5.00$ VOL = 3.96 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL = $(1.15 + 0.50)/2 \times (1.42 + 0.50)/2 \times 5.00$ VOL = 3.96 M3 ✓ TOTAL 48.59 m³ ✓	

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

GENERADOR DE OBRA			
CONTRATO: 034/2018	TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION 2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108		
CONCEPTO 12	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocacion de mamposteria de tercera, acentada con mortero cemento.		ANEXO	
	ZAPATA N.-2 PTE. ALBACETE VOL= (14.58) X (2.00) X (0.50) ✓ VOL= 14.58 M3 ✓ ZAPATA ALERO DER. VOL= (2.00 + 1.00)/2 X (0.50) X 5.00 ✓ VOL= 3.75 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL= (2.00 + 1.00)/2 X (0.50) X 5.00 ✓ VOL= 3.75 M3 ✓ MURO N.-2 PTE. ALBACETE MURO VOL= (1.40 + 1.15)/2 X (1.00) X 14.58 ✓ VOL= 18.59 M3 ✓ ALERO DER. VOL= (1.15 + 0.50)/2 X (1.42 + 0.50)/2 X 5.00 ✓ VOL= 3.96 M3 ✓ ALERO IZQ. VOL= (1.15 + 0.50)/2 X (1.42 + 0.50)/2 X 5.00 ✓ VOL= 3.96 M3 ✓ TOTAL 48.59 m3 ✓		219.00 ✓ M3

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

ANEXO 1

CONTRATO : 034/2018		TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO : 12			







ALERO IZQ.	MURO N.-I PTE. ACCESOS	ALERO DER.
ALERO IZQ.	ZAPATA N.-I PTE. ACCESOS	ALERO DER.

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

ANEXO 1

CONTRATO: 034/2018		TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO: 12			

MURO N.-2 PTE. ACCESOS		
ALERO IZQ. 		ALERO DER. 
ZAPATA N.-2 PTE. ACCESOS		
ALERO IZQ. 		ALERO DER. 

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

ANEXO 1

CONTRATO :	034/2018	TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108
CONCEPTO :	12	

ALERO	MURO N.-I PTE. ALBACETE	ALERO
ZAPATA N.-I PTE. ALBACETE		
TOTAL	0.00	

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

RESIDENTE
ING. ENNESTO PÉREZ BAILÓN

ANEXO 1


CONTRATO:	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO:	12		

ALERO	MURO N.-2 PTE. ALBACETE	ALERO

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.		
Nº. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL	31 MAYO DEL 2108
OBRAS PRELIMINALES	CONCEPTO : 12		

REPORTE FOTOGRAFICO

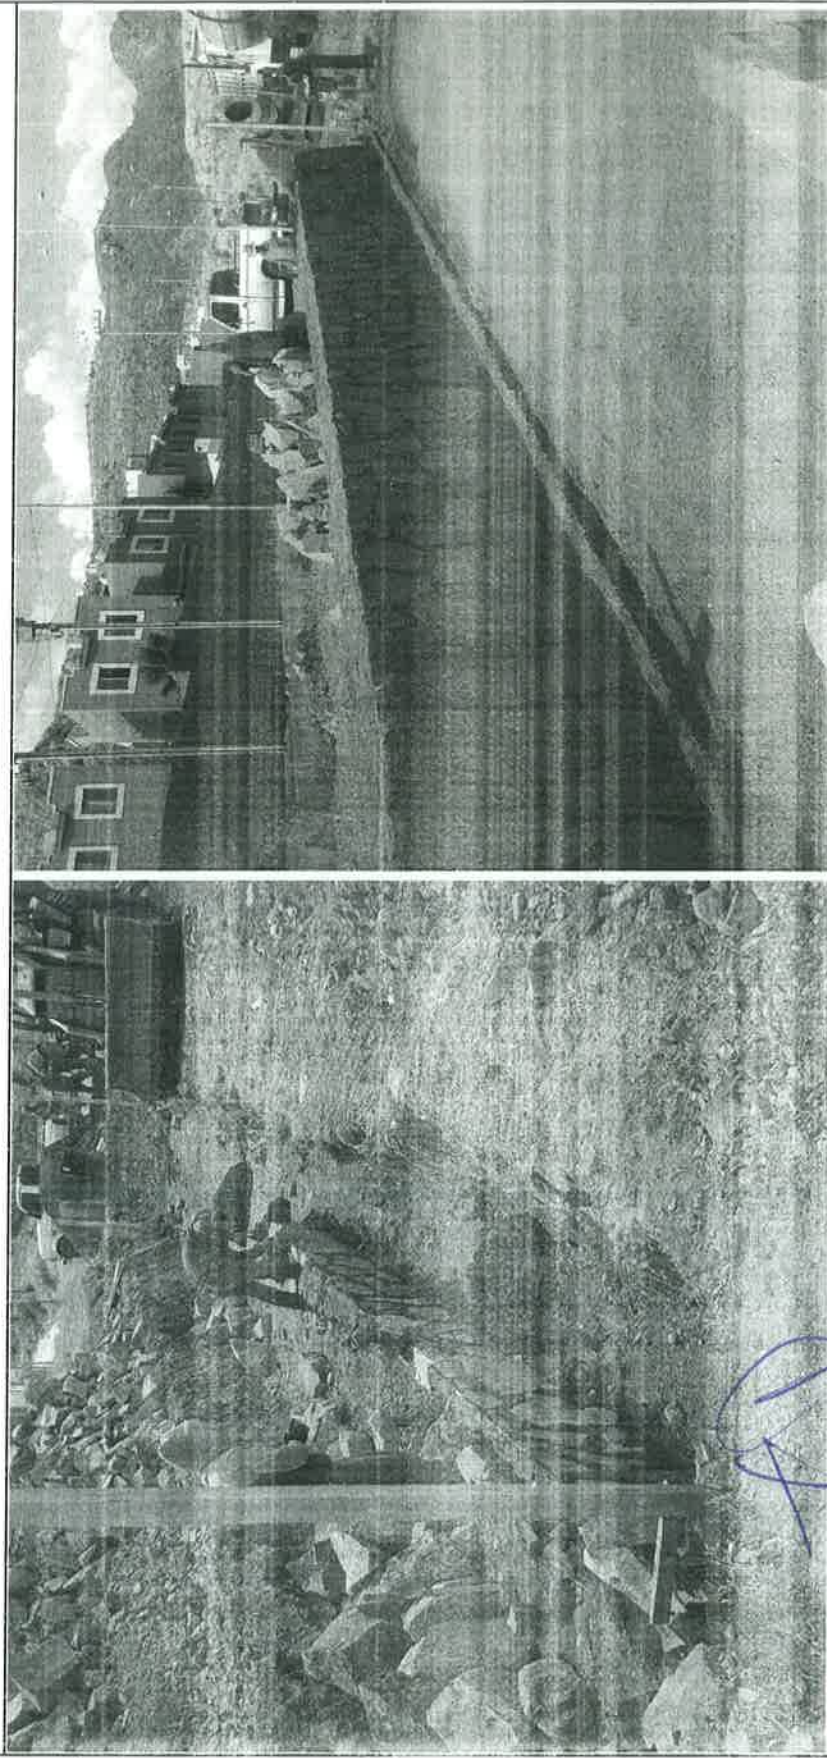


RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL	31 MAYO DEL 2108
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO :	12		

REPORTE FOTOGRAFICO

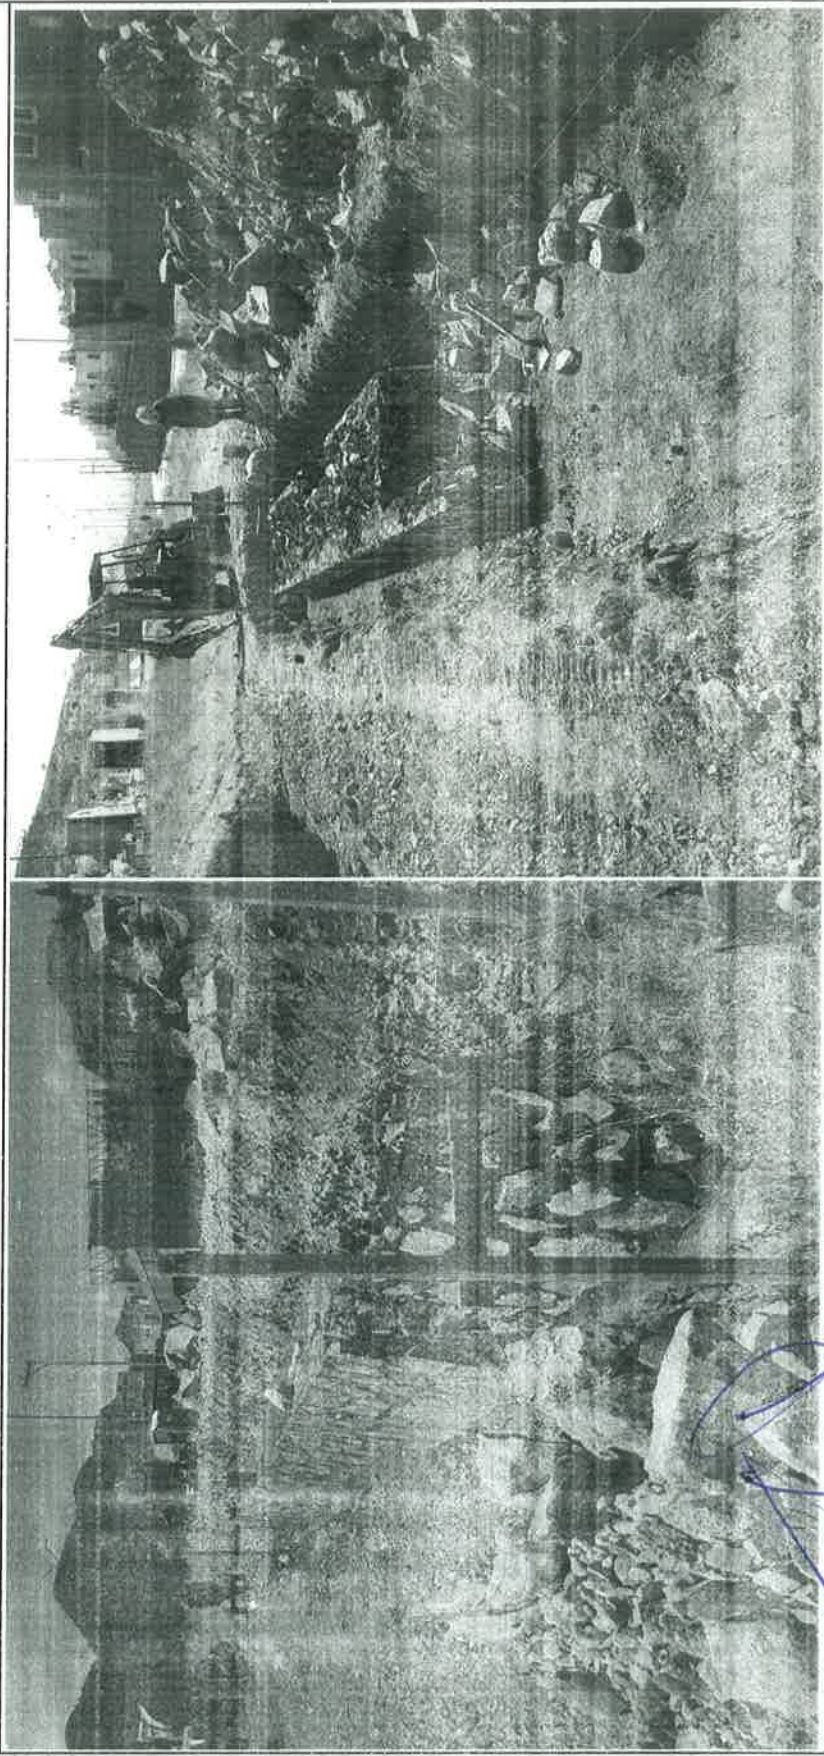

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

GENERADOR DE OBRA


CONTRATO : 034/2018		TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO	13	RESUMEN	CROQUIS
Suministro y colocacion de concreto Hidraulico simple de f'c=200 kg/cm2 en zampeado y dentellon.			VOLUMEN A PAGAR
		ANEXO	
ZAMPEADO FC=200 KG/CM2 PUENTE ACCESOS ZONA DE PUENTE $VOL = (19.32) \times (4.94) \times (0.10) =$ $VOL = 9.54 \text{ M}^3 \checkmark$ AGUAS ABAJO ABANICO $VOL = (15.76 + 5.30)/2 \times (3.66) \times (0.10)$ $VOL = 3.85 \text{ M}^3 \checkmark$ AGUAS ARRIBA ABANICO $VOL = (15.67 + 5.30)/2 \times (3.67) \times (0.10) :$ $VOL = 3.85 \text{ M}^3 \checkmark$ DENTELLON FC=200 KG/CM2 PUENTE ACCESOS AGUAS ABAJO $VOL = (15.76) \times (0.30) \times (0.20) =$ $VOL = 0.95 \text{ M}^3 \checkmark$ AGUAS ARRIBA $VOL = (15.67) \times (0.30) \times (0.20) =$ $VOL = 0.94 \text{ M}^3 \checkmark$			
TOTAL		19.15 M3	☒

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

ANEXO 1

CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO :	13		

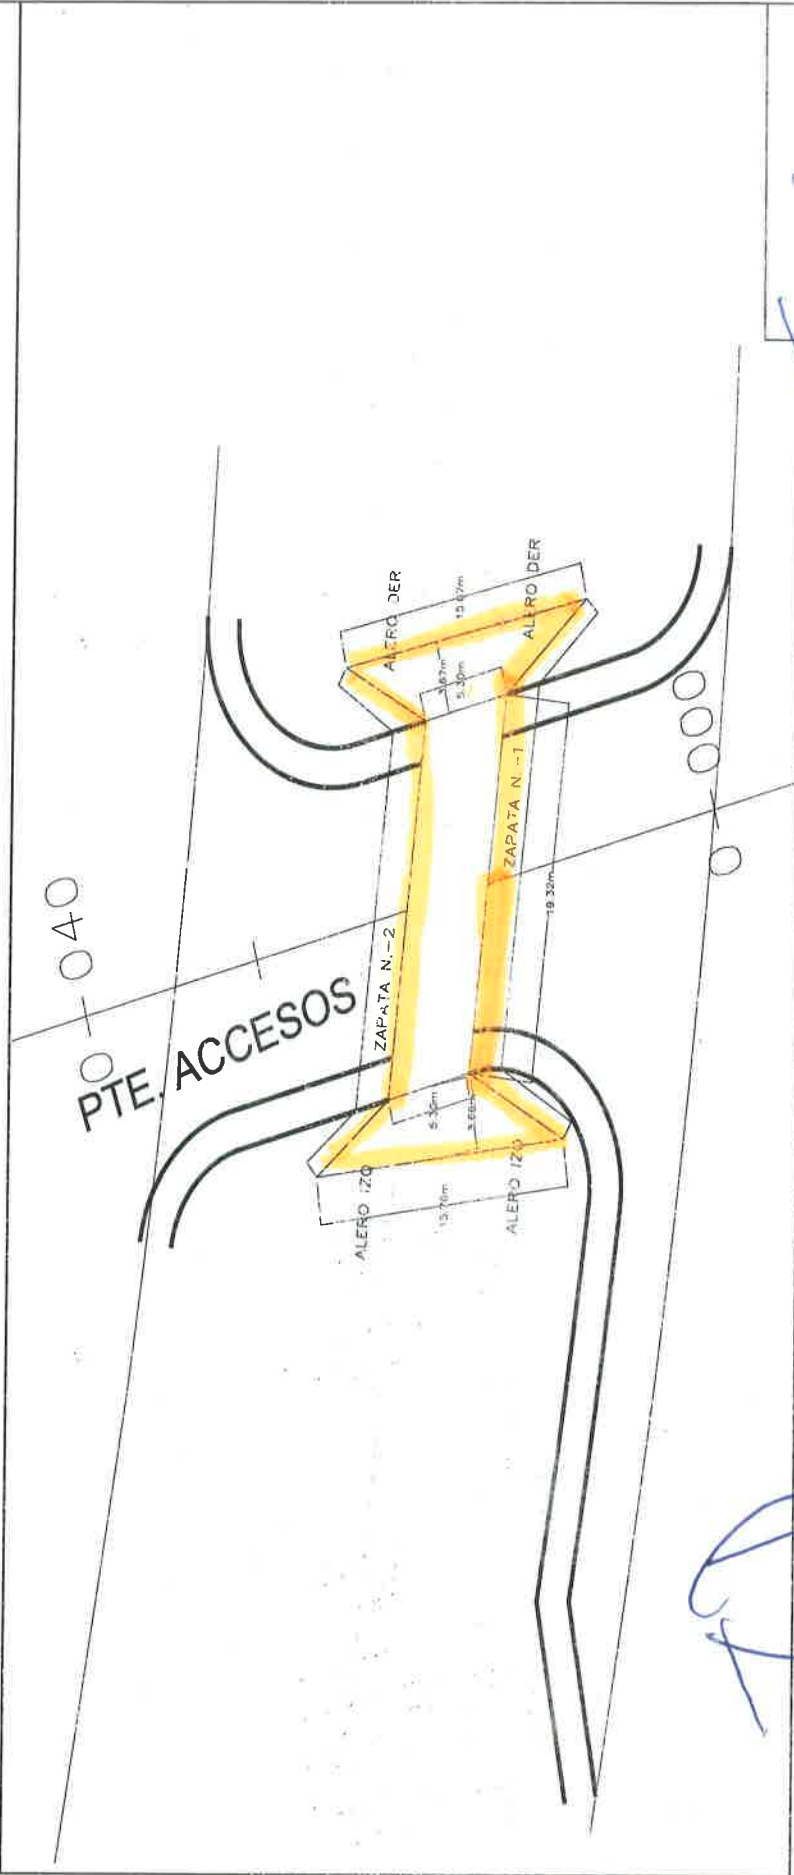


RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO:	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
Nº. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO:	13		
REPORTE FOTOGRAFICO			

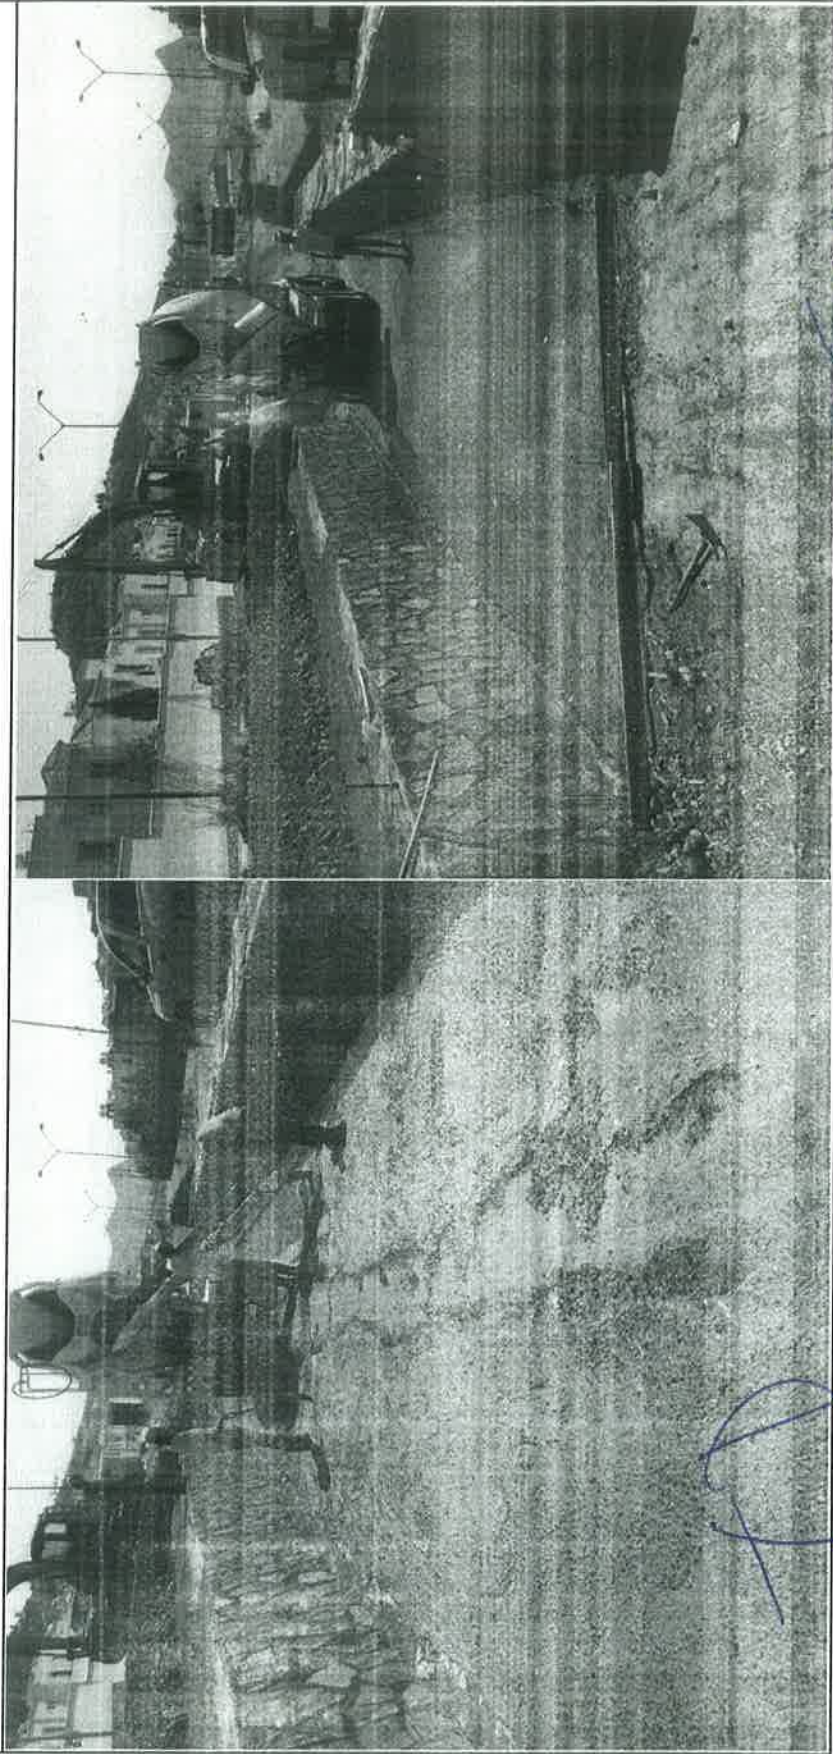

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO :		034/2018		TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA:		TEPORACA S.A. DE C.V.	
No. DE ESTIMACION		2		PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
CONCEPTO	17	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	
Suministro de acero de refuerzo L.A.B. puesto en obra		ANEXO			
ACERO DE REFURZO		VOL = 13,689.01 KG			
TOTAL				13,689.01 KG	

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

Folio Fiscal: AAA71A0B-B245-4415-B794-D237CD085B43
N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 16/05/2018 11:53:32a.m.
N° Certificado: 00001000000404102141

EMISOR:
KFA8112226Z6
KALISCH FIERRO Y ACERO S. A. DE C. V.
601

RECEPTOR:
TCO8101200N4
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Uso CFDI: 101

Remitir a: CARBONEL NUM 3702,,
CHIH
Col. SAN FELIPE IV ETAPA CP31203

Tipo Relación:
UUUD Referenciado:

Orden de Compra: 17389


Asesor Comercial: 1

Referencia:

Formulo: KACMCRA

FACTURA		PAGINA 1 DE 1
Serie: A	Folio: 131060	
Fecha de Emisión: 16/05/2018 10:54:26a.m.		
Lugar de Emisión: 31110		
Método de Pago: PPD		
Forma de Pago: 99		
No. Orden: 2018373081		
No. de Control: 357011		
Tipo de Operación: VENTA		
Código de Cliente: CT012		
Condiciones: CREDITO (N) - 30 DIAS.		
Puntos: En esta Factu		
Saldo: Vencidos:		

Cve.od/Serv	Código Interno	Descripción:	Cantidad	Plezas	U. Interna	CveUnidad:	Preco:	Importe:	Descto	Base	Impuestos
30102404	54854050	VAR CORR AR-42 1 X 12M 175pz	8,948.00		KGS	KGM	15.39	128,475.72		128,475.72	002IVA, 20556.17
30102404	54854045	VAR CORR AR-42 3/4 X 12M 8pz	216.00		KGS	KGM	15.51	3,350.16		3,350.16	002IVA, 536.03
30102404	54854040	VAR CORR AR-42 5/8 X 12M 111pz	2,078.00		KGS	KGM	15.45	32,105.10		32,105.10	002IVA, 5136.82
30102404	54854030	VAR CORR AR-42 1/2 X 12M 237pz	2,832.00		KGS	KGM	15.61	44,207.52		44,207.52	002IVA, 7073.70
30102404	54854020	VAR CORR AR-42 3/8 X 12M 92pz	615.00		KGS	KGM	15.45	9,501.75		9,501.75	002IVA, 1520.78



Kalisch ACERO



CHIHUAHUA CHIH, a miércoles, 16 mayo, 2018. Por este Pagare me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V. la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. el día viernes, 15 junio, 2018, en la ciudad de CHIHUAHUA CHIH, importe en mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuese cubierta a su vencimiento causará Intereses moratorios al 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.



SUB TOTAL	217,640.25
IVA Y TRASLADADO	34822.45
IVA RETENIDO	
TOTAL MXN	252,462.70

Cantidad Con Letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

Acepto (amos)

Archivos XML y PDF enviados a teporaca81@yahoo.com.mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado

ORIGINAL

CONDICIONES DE VENTA

- Revise sus facturas, solo se realizarán cambios dentro de las siguientes 24 horas de haberse emitido.
- No nos hacemos responsables por el daño que sufran materiales facturados no recogidos por el cliente, pudiendo generar cargos por almacenaje.
- Entregas a domicilio dentro de la ciudad menores a \$2,500 pesos tendrán un cargo por envío. Entregas fuera de la ciudad pueden ocasionar algún cargo por envío.
- Cambios de material únicamente dentro de los siguientes 5 días fecha factura.
- No se aceptarán cambios ni devoluciones de material dañado, cortado y/o pintado; ni cuando se trate de material especial o se haya comprado específicamente para el cliente.
- No se efectuarán devoluciones de pagos y/o anticipos, únicamente podrán aplicarse a la compra de otros materiales.
- Nuestras cotizaciones tendrán una vigencia máxima de 5 días, transcurrido este plazo se aplicarán los precios que rijan en ese momento.
- Surtir parcialmente un pedido NO nos obliga a surtir el resto como condición para el pago del material ya entregado.
- Si al momento de entregar el material NO se encuentra el cliente o alguno de sus representantes, éste acepta y reconoce la firma de la persona que se encuentre en el lugar de la entrega.
- La facturación y entrega de mercancía se basará en el peso de nuestras básculas.
- La firma en cualquier parte de esta factura, hace las veces de recibo de la mercancía y aceptación de estas condiciones de venta.
- Los pedidos que tengan que ser reenviados por error imputable al cliente, a cargo adicional.

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AAA71A0B-B245-4415-B794-D237CD085B43|2018-05-16T11:53:32|H363fzQxvKrvM7T9dJnDQIXwbXeXD6UpZfPyDw6Dm13pLV5/32n9S+2HFBtw/XUK+XBuuYkvTBLx5w422QYcxDJ3DxDpBq5NwuOxZPnIFXfH5bJHQxg63E/6zU/5PwPXElg4G3TU5p+lgG4HJvTfsszHNvjhcoaNmiaQIF1dRuVcMoCCRBz5Lws3eYLSOox8GV/Sx+H0wmQJ4tkT9dlpZg7ru9MJ+7X8aAlbHfZF0eXPomNcKC3eYdXYP3Z7ZHULE3PDS2oGXFTqaExVdmsSFEZM35CqK3Ca+chWD4i2fgK3MHdB/Cw5nwf/3cJSJ4/6kwYbh7TDRJls42AA==|00001000000407657133|]

Sello digital del CFDI

H363fzQxvKrvM7T9dJnDQIXwbXeXD6UpZfPyDw6Dm13pLV5/32n9S+2HFBtw/XUK+XBuuYkvTBLx5w422QYcxDJ3DxDpBq5NwuOxZPnIFXfH5bJHQxg63E/6zU/5PwPXElg4G3TU5p+lgG4HJvTfsszHNvjhcoaNmiaQIF1dRuVcMoCCRBz5Lws3eYLSOox8GV/Sx+H0wmQJ4tkT9dlpZg7ru9MJ+7X8aAlbHfZF0eXPomNcKC3eYdXYP3Z7ZHULE3PDS2oGXFTqaExVdmsSFEZM35CqK3Ca+chWD4i2fgK3MHdB/Cw5nwf/3cJSJ4/6kwYbh7TDRJls42AA==


Sello del SAT

QggJgXpHVF50o6cStwF+7i+KwmffJJfxfokdcloZkdDd26WOI97qScnMym444tZY4GeZNd4PaNLNAXwrvIQ8exqfKTCtyT7Q2XBA7aUv/kq2hwqrQEGdlqzOPhT/L8mrs2T86KWLcA5e0wvV+0QhLmAZtwsfRkDQNF5p3nkAV0zNOU4uFNasw47Rpwih8ZObZjQYvk9o9qQPQgnY5w/uO+WknFfo1eJvvpAu4kyB8e1zyBd94cdXQDnpV7GX3r1HOWBXrOKVw75a8LBBIGDLKGNj+GY533ZkRyTTRuzRbmH845VbJcJfJHP/TDs/529/PGBuzwq1n7cmVwA==

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108	
OBRAS PRELIMINALES			
CONCEPTO :	17		

REPORTE FOTOGRAFICO

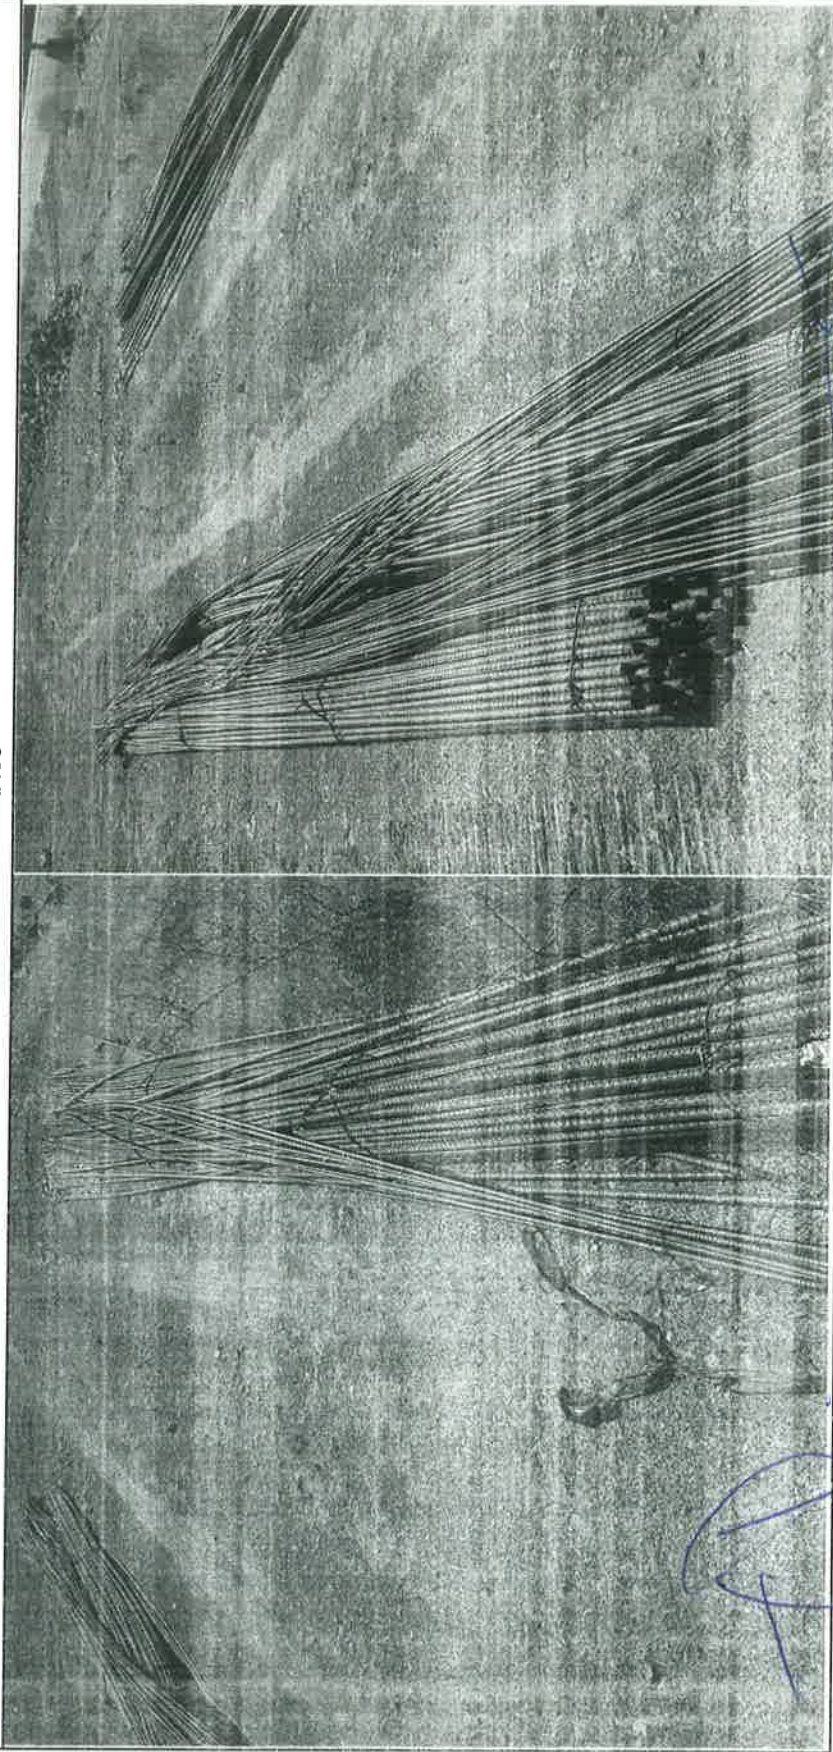

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

GENERADOR DE OBRA	
-------------------	--

CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA:	TEPORACA S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL	31 MAYO DEL 2108

CONCEPTO	21	RESUMEN	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocacion de tubería de 4" de diametro de PVC, utilizado en drenes			ANEXO	
		DRENES PTE. ACCESOS		
		10 PZAS DE 1.28 MT		
		VOL = (10.00) X (1.28) =		
		VOL = 12.80 MT ✓		
		DRENES PTE. ALBACETE		
		8 PZAS DE 1.28 MT		
		VOL = (8.00) X (1.28) =		
		VOL = 10.24 MT ✓		
		TOTAL	23.04 MT ✓	23.04 MT ✓

RESIDENTE


ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.

ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

ANEXO 1

CONTRATO :	034/2018	TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.		CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108
CONCEPTO :	21	

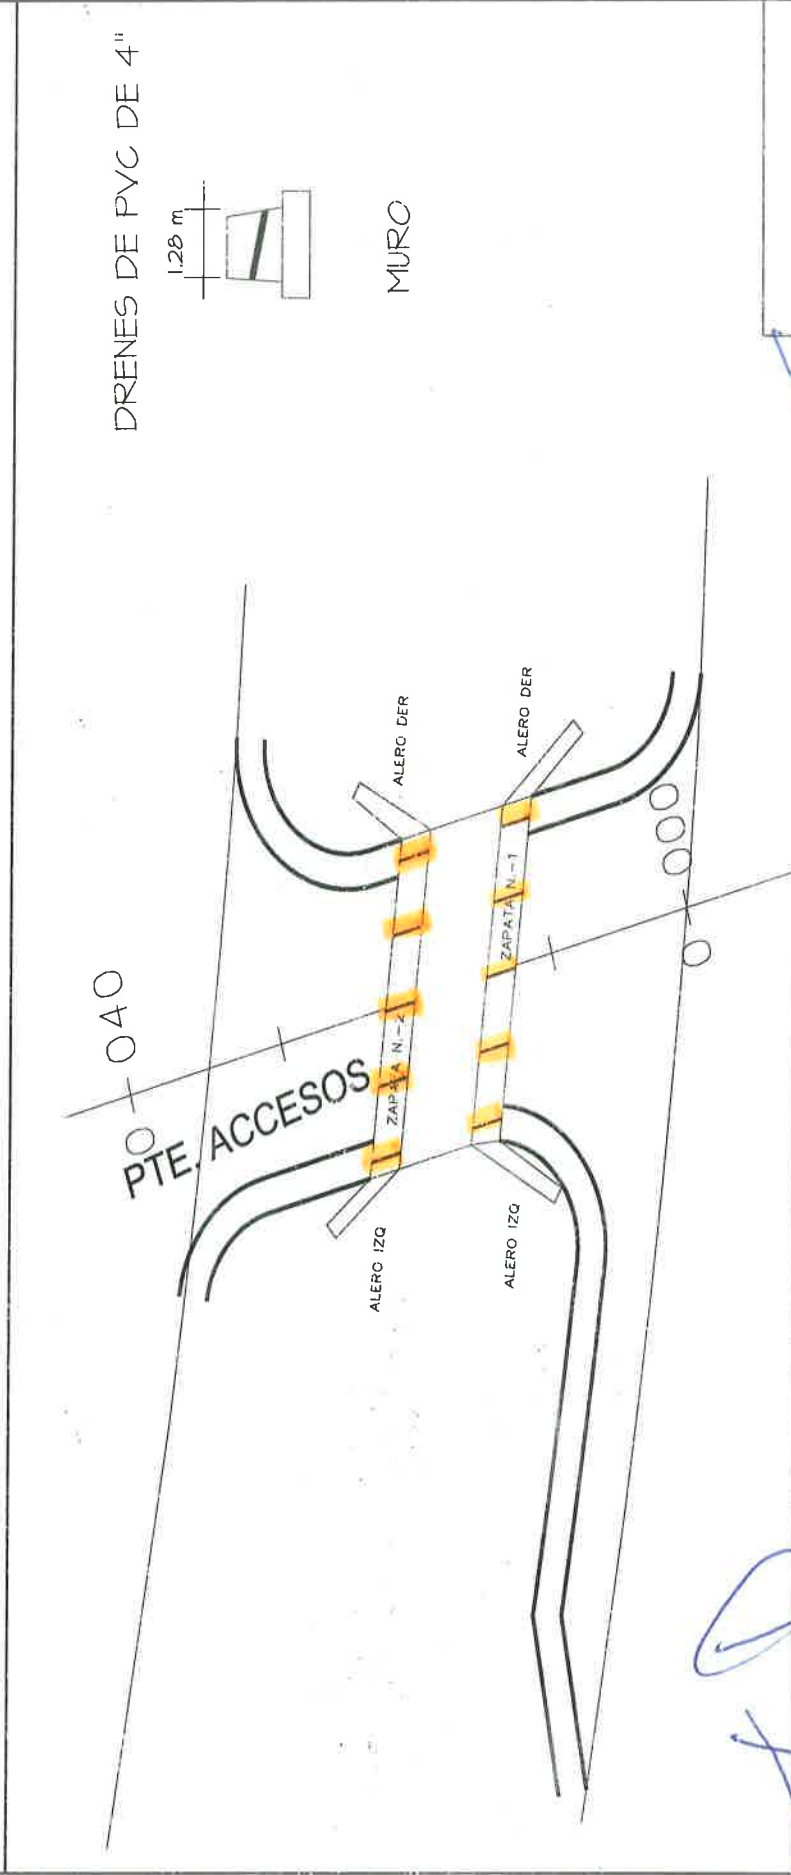

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.


CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

ANEXO 1	
CONTRATO : 034/2018	TRAMO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACION 2	PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2108
CONCEPTO : 21	
RESIDENTE ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.	CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V. ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO :	034/2018	TRAMO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	CONTRATISTA: TEPORACA S.A. DE C.V.		
Nº. DE ESTIMACION	2	PERIODO DEL 1 AL	31 MAYO DEL 2108
OBRAS PRELIMINALES	CONCEPTO : 21		

REPORTE FOTOGRAFICO

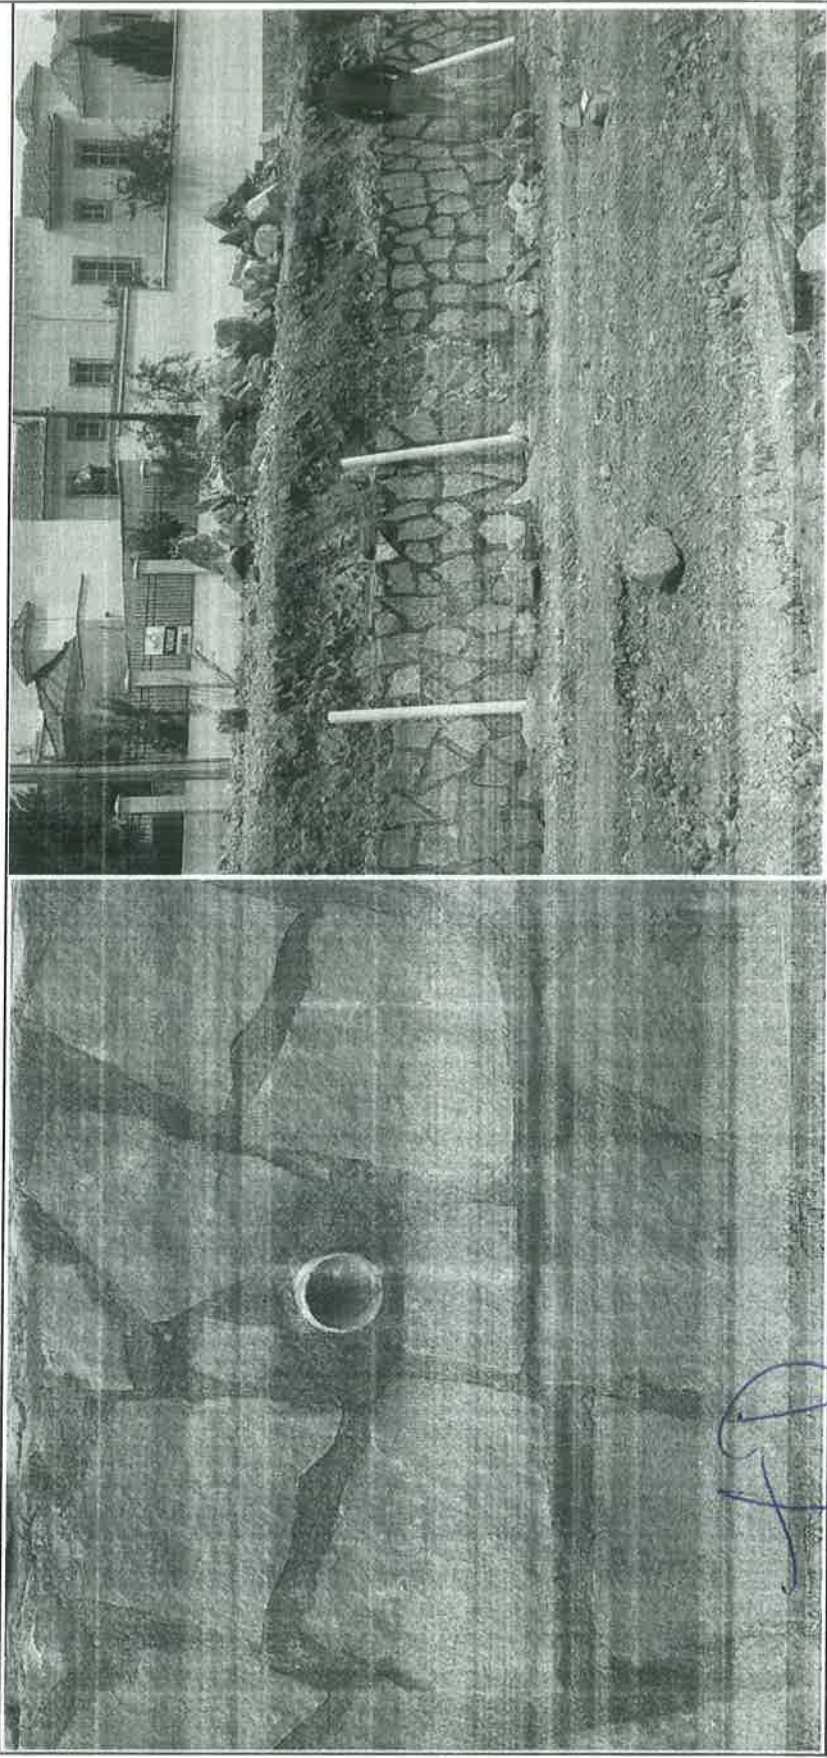

RESIDENTE
ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

CONTRATISTA: TEPORACA CONST. S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VEGA GARCIA
