



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE RUTA EXTREMA CORTINA CHUVISCAR**


CARACTERÍSTICAS: UBICADO EN EL ÁREA ANEXA A LA CORTINA DE LA PRESA CHUVISCAR Y ENTRADA DE PARQUE EL ENCINO. LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES CON OFICINA Y CASETA DE VIGILANCIA. CONSTRUCCIÓN DE UNA ENTRADA PRINCIPAL MONUMENTAL, SEÑALIZACIÓN ESPECIALIZADA A LO LARGO DE LA RUTA EXTREMA. TRABAJOS COMO LIMPIEZA, DESHIERBE, REMOCIÓN Y MOVIMIENTO DE ROCAS SUELTAS, CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR TIPO PLATAFORMA SOBRE ROCA, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN ALGUNOS PASOS DE LA RUTA. SE CONSTRUIRÁ UNA SENDA EN EL TERRENO TIPO MESETA PARALELA A LA CORTINA DE LA PRESA CHUVISCAR.

CONTRATO: 035/2018
MONTO DE CONTRATO: \$1,680,221.14
CONTRATISTA: SERGIO IVÁN LOYA TERUEL

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 16/04/2018
FECHA DE INICIO REAL: 16/04/2018
FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 29/06/2018
FECHA DE TERMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

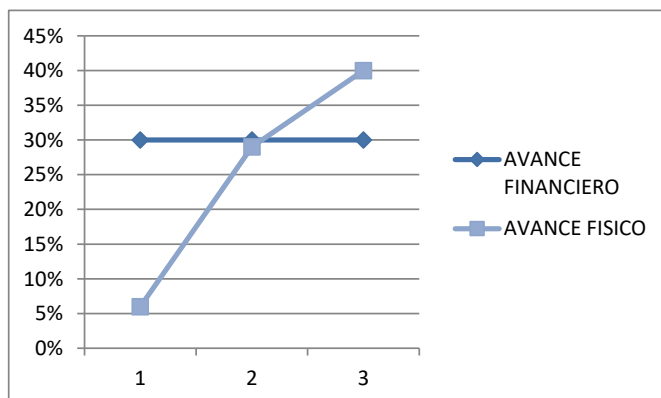

MES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
ABRIL:	6.00%	30%
MAYO:	29.00%	30%
JUNIO:	40.00%	30%
TOTAL:	40.00%	30%
