

**DATOS BÁSICOS**

**PROYECTO:** PAVIMENTACIÓN EN DERECHO DE VÍA DE PEMEX No CONTRATO 041/2018  
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-PEPD-OP-036  
**CARACTERÍSTICAS:** CORTE DE TERRENO NATURAL, COMPACTACIÓN DE TERRENO, COLOCACIÓN DE CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DE 2.0 CM DE ESPESOR

**MONTO DE CONTRATO:** \$983,126.38 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO** N/A

**CONTRATISTA:** BOWERA, S.A. DE C.V.  
**FECHA PROGRAMADA DE INICIO** 23 DE ABRIL DE 2018  
**FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:** 12 DE MAYO DE 2018  
**FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:** N/A  
**DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:** N/A

**AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN**


**ACUMULADO GENERAL IVA INCLUIDO**

**PROGRAMADO:** \$ 419,598.34  
**REAL:** \$ 338,074.40

**POR PARTIDA**

|                              | PROGR.  | REAL    |
|------------------------------|---------|---------|
| 1 TERRACERÍAS                | 100.00% | 100.00% |
| 2 RED HIDRÁULICA Y SANITARIA | 100.00% | 100.00% |
| 3 ENCOFRADO DE DUCTO         | 100.00% | 100.00% |
| 4 PAVIMENTACIÓN              | 100.00% | 100.00% |
| 5 REQUISITOS CENAGAS         | 100.00% | 100.00% |
| 6 EXTRAORDINARIOS            | 100.00% | 100.00% |

**AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %**

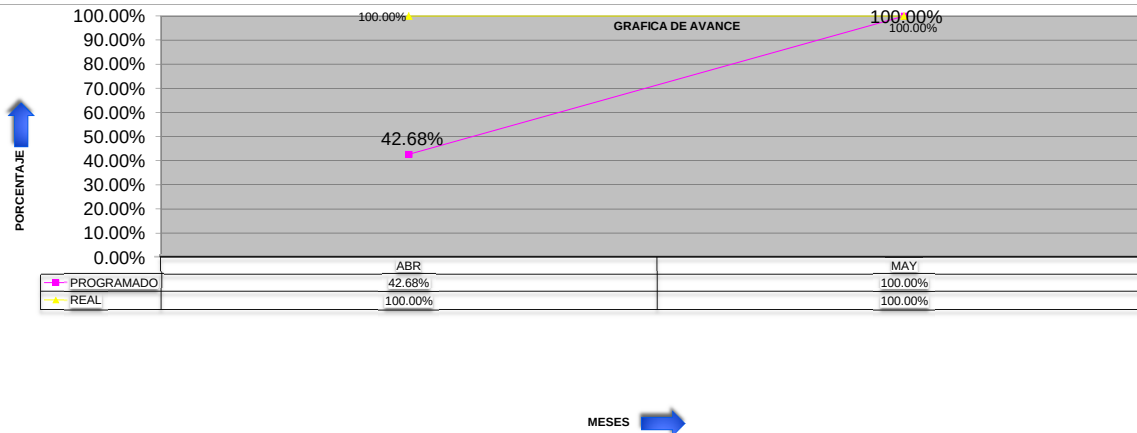

**ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES**

**TERRACERÍAS**  
SE REALIZÓ CORTE Y TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN LA CALLE INDUSTRIAL 1 FUERA DEL DERECHO DE VÍA EN COORDINACIÓN CON CENAGAS

**RED HIDRÁULICA Y SANITARIA**  
SE PROLONGA TUBERÍA EXISTENTE DE 3" DE DIAM. DE AGUA POTABLE A LO LARGO DE LA CALLE INDUSTRIAL 1 HASTA DONDE SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN

**ENCOFRADO DE DUCTO**  
SE REALIZARON SONDEOS PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA Y PROFUNDIDAD DE LÍNEA DE 8" DE GAS NATURAL

**PAVIMENTACIÓN**  
SE COLOCA BASE HIDRÁULICA EN CALLE INDUSTRIAL 1

SE CONFINA BASEHIDRÁULICA CON DENTELLONES Y GUARNICIÓN, SE COLOCA BANQUETA EN CALLE INDUSTRIAL 1  
**REQUISITOS CENAGAS**  
AL NO HABER PERMISO PARA TRABAJAR EN EL DERECHO DE VÍA NO SE PUEDE ESTABLECER UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA CONTRATAR LA POLIZA POR DAÑOS A A INFRAESTRUCTURA DE CENAGAS

**EXTRAORDINARIOS**

**COMENTARIOS**  
ESTIMACIÓN 1 EN FIRMAS PARA PAGO  
SE SOLICITA APOYO A JMÁS PARA RENIVELAR LOS POZOS DE VISITA A NIVEL DE RASANTE  
POZO DE VISITA DESBORDADO AFECTÓ PARCIALMENTE BASE HIDRÁULICA COLOCADA Y TERRACERÍAS CON GIARNICIONES, POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A COLOCAR MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO EN ESTAS ZONAS EN LUGAR DE PAVIMENTO.  
NO SE HAN LIBERADO LOS TRABAJOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA POR CAUSA DE LA TUBERÍA DE GAS NATURAL EXISTENTE, PERMISO DE CENAGAS EN PROCESO, **POR TAL MOTIVO SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.**



CALLE INDUSTRIAL 1, BASE HIDRÁULICA



CALLE INDUSTRIAL 1, COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN



CALLE INDUSTRIAL 1, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y DENTELLONES



VISTA DE CALLE INDUSTRIAL 1, COLOCACIÓN DE MICROCARPETA
