



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA : 05 DE JULIO DEL 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ-NUevo DELICIAS DEL KM 1+110 AL KM 1+360, 1,250M

No CONTRATO: 045/2018

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-FISM-OP-023

CARACTERISTICAS:

CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CALLE DE 1,250.00 M DE LARGO CON BASE DE 20 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO HIDRAULICO MR=40KG7CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR.

MONTO DE CONTRATO : \$6,228,296.65 CON IVA

MONTO MODIFICADO :

CONTRATISTA :

ING. JOEL ESPARZA GONZALEZ

FECHA PROGRAMADA DE INICIO :

07 DE MAYO DEL 2018

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN :

24 DE AGOSTO DEL 2018

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA :

24 DE AGOSTO DEL 2018

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

AUN NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN


ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$970,994.20 15.59%

REAL: \$790,000.00 12.68%

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

GRAFICA DE AVANCE

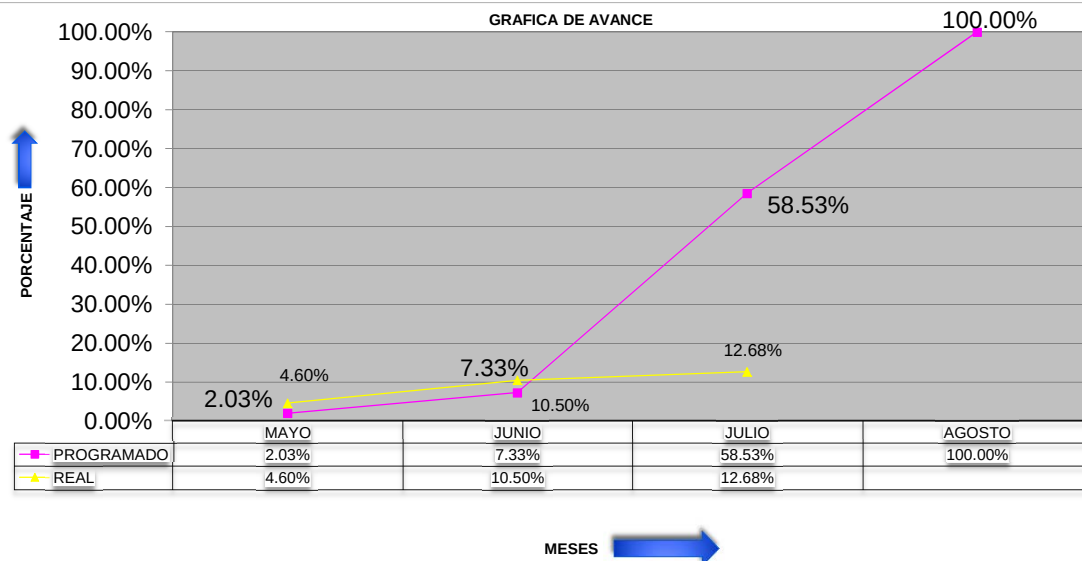

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

NOTAS:

SE LE INFORMA AL CONTRATISTA DE LA CALIDAD DE LA BASE QUE DEBERA SER TRITURADA (100%) TOTALY DEBERA DE TENER SU LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE COMPACTACIONES Y CONCRETOS.

SE PIDE AL CONTRATISTA QUE SUMINISTRE EL SEÑALAMIENTO ADECUADO PARA EVITAR ACCIDENTES DE AUTOMOVILISTAS.

SE REALIZAN TRABAJOS DE TRATADO Y TENDIDO DE BASE, COMPACTACION Y NIVELACION DE ESTA DEL KM 1+110 AL 1+500

SE PREPARA TRAMO PARA IMPREGNAR DEL KM 1+110 AL 1+150

RIEGO PARA BASE DEL KM 1+250 AL 1+350



TRATADO DE BASE DEL KM 1+110 AL 1+250



NIEVLACION DE BASE DEL KM 1+110 AL 1+500



BASE COMPACTADA DEL KM 1+110 AL 1+2500

