

DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

TRABAJOS DE PERFORACION DIRECCIONAL

No CONTRATO 059/2018

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-FISM-OP-033

CARACTERÍSTICAS:

TRABAJOS DE PERFORACION DIRECCIONAL

MONTO DE CONTRATO:

\$815,805.47

CON IVA

MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA:

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

04 DE JUNIO DEL 2018

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:

03 DE JULIO DEL 2018

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

03 DE JULIO DEL 2018

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:

\$

600,000.00 74%

REAL:

\$

815,805.47 100%

PROGR.

REAL


POR PARTIDA

PROGR.

REAL

1		9
2		10
3		11
4		12
5		13
6		14
7		15
8		

AVANCE DE CONSTRUCCION EN %

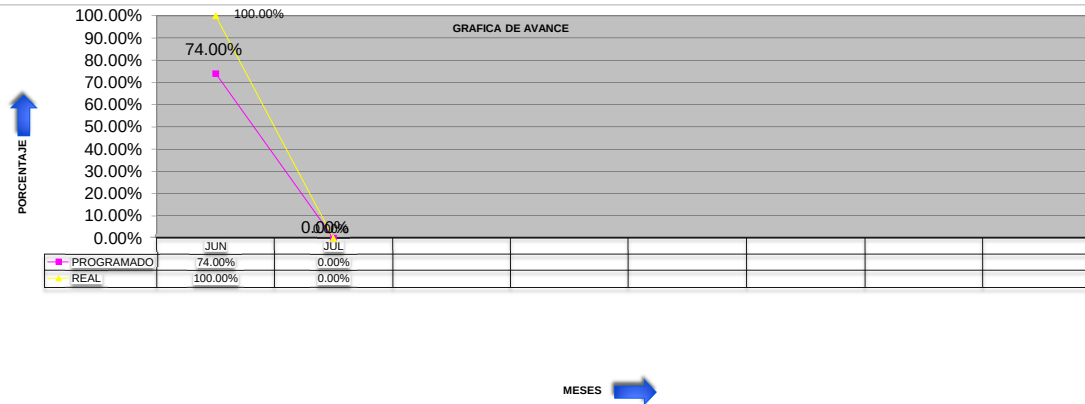

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

NOTAS:

SE ENCUENTRAN TERMINADOS LOS TRABAJOS AL 100 POR CIENTO

S E REALIZA EXCAVACION A CIELO ABIERTO Y SE SUMINISTRA Y COLOCA CAMA DE ARENA, PARA QUE EN COORDINACION CON LA J.M.A.S. SE COLOQUE TUBERIA DE PVC. Y RELLENO, ADEMAS DE HECHURA DE POZOS POR PARTE DE LA J.M.A.S.

S E REALIZA EXCAVACION EN ZANJA Y SE SUMINISTRA Y COLOCA CAMA DE ARENA, PARA QUE EN COORDINACION CON LA J.M.A.S. SE COLOQUE TUBERIA DE PVC. Y RELLENO, ADEMAS DE HECHURA DE POZOS POR PARTE DE LA J.M.A.S.

SE REALIZA N TRABAJOS DE PERFORACION DIRECCIONAL SUMINISTRANDO CAMISA DE ACERO.

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y EN OPERACIÓN.

SE REPONE TAPA DE CONCRETO AFECTADA CON LA MAQUINARIA.



PERFORACION DIRECCIONAL



EXCAVACION PARA POZOS DE VISITA Y ZANJA.



PERFORACION DIRECCIONAL



EXCAVACION PARA POZOS DE VISITA Y ZANJA.
