

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PROLONGACIÓN DE AV. PRIETO LUJÁN, HACIA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA PLANTEL 10 No CONTRATO 060/2018

CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No. PI-VIV-16-032
INSTALACION SUBTERRANEA, SUBESTACIÓN, POSTES, ARBOTANTES, LAMPARAS, CONEXIÓN

MONTO DE CONTRATO: \$1,202,214.95 CON IVA

CONTRATISTA: ELECRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 08/06/2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 22/07/2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: N/A
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	43.21%		
REAL:	40.01%		
POR PARTIDA			
1 INSTALACIÓN SUBTERRANEA	100.00%	87.36%	
2 SUBESTACIÓN	42.30%	0.00%	
3 POSTES Y ARBOTANTES	21.30%	56.28%	
4 CABLE	52.68%	73.58%	
5 LÁMPARAS Y LUMINARIAS	0.00%	0.00%	
6 CONEXIÓN	0.00%	0.00%	

INSTALACIÓN SUBTERRANEA

PENDIENTE PERFILAR ZANJAS DONDE SE CORTÓ LA CARPETA ASFÁLTICA PARA REPONERLA

SUBESTACIÓN

PENDIENTE QUE LA CONTRATISTA INDIQUE SI CFE, REQUIERE UN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL

POSTES Y ARBOTANTES

20 BASES DE ARBOTANTE COLOCADAS

CABLE

ALIMENTADORES PRINCIPALES DE LÁMPAS DE CAL. 2 COLOCADOS

LÁMPARAS Y LUMINARIAS

PENDIENTE QUE ALUMBRADO PÚBLICO OTORGUE VISTO BUENO A LAMPARAS PROPUESTAS POR LA CONTI


CONEXIÓN

EXTRAORDINARIOS

OBSERVACIONES:

ALUMBRADO PUBLICO SOLICITA NUEVA INFORMACIÓN PARA AUTORIZAR LAS LÁMPARAS PROPUESTAS
PENDIENTE QUE CONTRATISTA PRESENTE PRESUPUESTO, MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y PROGRAM

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

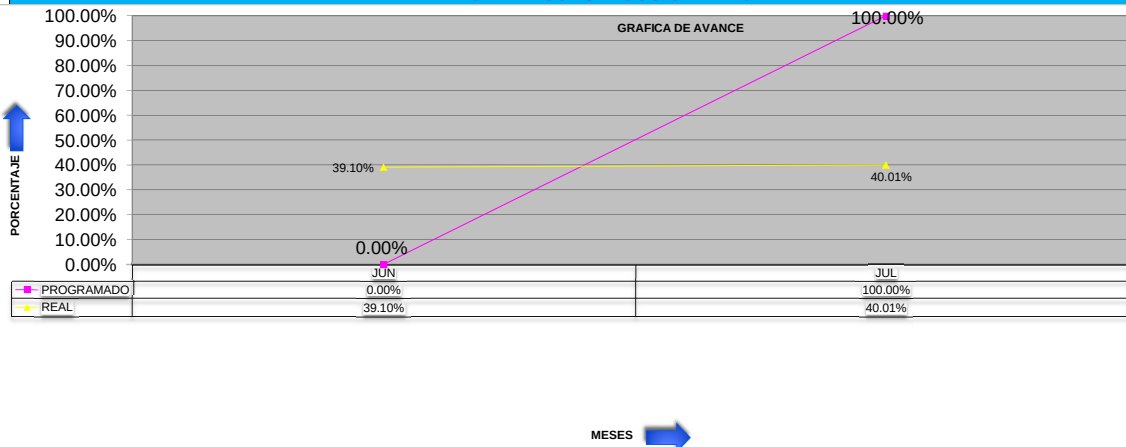

EXCAVACIONES PARA ALOJAR ALIMENTADORES ELECTRICOS



COLOCACIÓN DE E



COLOCACIÓN DE BASES DE ARBOTANTES



COLOCACIÓN DE CABLEADOS

3 de julio de 2018

IA DE OBRA
