

**JUCA**  
CONSTRUCCIONES  
CIVILES Y MECÁNICAS

CORTAR

I - Factura - VERSIÓN 3.3

826

No. de serie del CSD del emisor

00001000000305293055

Fecha y Hora de emisión

2018-08-08T08:45:39

Folio Fiscal

B7E07BE7-9B19-11E8-9330-00155D014007

Emisor

RFC: JCC000222K64

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31124

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-08-08T09:45:39

00001000000403557578

99 - Por definir

Receptor

RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitario | Importe       |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | PRIMERA ETAPA RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA<br>Clave Servicio - 72121405 - Servicios de construcción de edificios religiosos<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$87,820.960000 Tasa - 0.160000 Importe - \$14,051.353600 | 87,820.960000  | 87,820.960000 |

CFDI Relacion

UUID Relacionado: 0ECB6C66-91E9-11E8-A5BC-00155D014009

CFDI RELACIONADO

CFDI RELACIONADO: 0ECB6C66-91E9-11E8-A5BC-00155D014009

TIPO RELACIÓN: 07 APLICACIÓN DE ANTICIPO

ESTIMACION NUMERO 1 SEGUN CONTRATO NUMERO

073/2018 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 125,458.52

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 37,637.56

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

CMIC 0.2% \$ 250.92

DIF 0.2% \$ 250.92

SUMA \$ 501.84

NETO A RECIBIR \$ 101,370.47

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Subtotal      | 87,820.96 MXN     |
| IVAT 0.160000 | 14,051.353600 MXN |
| Total         | 101,872.31 MXN    |

TOTAL EN LETRA: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 31/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B7E07BE7-9B19-11E8-9330-00155D014007|2018-08-08T09:45:39|TBN040609RKA|B55UUjd8mrr4cyT3cptEv6z1sC3mN32auidOLEqWGuUMLF7ACp|gzeYFjmX3UqpZJdw1YCU0BwOSS9F6cFpaHcu/Z|JshdT9+lv9NIHCC5pUdG61Ya+K3Z/ge63|jdfm1DDfLkolqemVK4GZMnSdAAnTJB|2X0x0Tr|E/hpk=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

B55UUjd8mrr4cyT3cptEv6z1sC3mN32auidOLEqWGuUMLF7ACp|gzeYFjmX3UqpZJdw1YCU0BwOSS9F6cFpaHcu/Z|JshdT9+lv9NIHCC5pUdG61Ya+K3Z/ge63|jdfm1DDfLkolqemVK4GZMnSdAAnTJB|2X0x0Tr|E/hpk=

Sello digital del SAT

ULn7Z3L7Sihj9KDiCg1rw8OxbWb9odyKUOEjRyADOyAikO0qdBrLQh2ZKlrnH6vmC2k7S3/vMwfkSCOIPVgxUlvvMA59OyUmprSNR56p063a6B3fthYr+LJMnSpap/LFLid2WDVzpXmHA147wLG9bW9Wi6W8SO2OCyITxONBJG|j2fOXkg1ELaWfs98Npq0ZX/JWsa6e3Vh4KRyOfIX3v73nmnzpXlyGLK1wHecQMF0wTp|fwyysgUeZ2cw/N3|j6XZvZ7obdEg7UxdluneWMzAksik1OjuKnfXq7PoZym8/ZO/KoGlm0d9+fcRgqPHC67ZETxh59jh0q7rZ/oDA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:




Proporcione los dígitos de la imagen\*:



Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor                 | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| JCC000222K64                         | JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| B7E07BE7-9B19-11E8-9330-00155D014007 | 2018-08-08T08:45:39                              | 2018-08-08T09:45:39     | TBN040609RKA                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                           | Estado CFDI             |                                    |
| \$101,872.31                         | Ingreso                                          | Vigente                 |                                    |





## RESUMEN DE ESTIMACION



|              |                                                                                       |                              |                            |             |                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| PROGRAMA:    | PEPD2018                                                                              | CONTRATO No.                 | 073/2018                   | CONTRATADOS | \$ 1,168,584.65 CON IVA |
| OBRA:        | Primera Etapa Restauración de cubierta de Nave Central del Templo San Juan Bautista.; | ESTIMACIÓN No.               | ESTIMACION 1               |             |                         |
|              |                                                                                       | PERIODO EJEC.                | 16-JUL-2018 al 31-JUL-2018 |             |                         |
| UBICACIÓN:   | Juan de Dios Martin Barba #6112 Col.Nombre de Dios                                    | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)   | \$ 145,531.88              |             |                         |
| CONTRATISTA: | JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.                                 | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) | \$ 0.00                    |             |                         |
| RFC          | JCC000222K64                                                                          | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)  | \$ 145,531.88              |             |                         |

|                                      | TIPO DE OBRA      | IMPORTE       | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                      | <b>NORMALES</b>   | \$ 125,458.52 |               |
|                                      | <b>EXCEDENTES</b> | \$ 0.00       |               |
|                                      | <b>EXTRAS</b>     | \$ 0.00       |               |
|                                      | <b>DEVOLUCIÓN</b> | \$ 0.00       |               |
|                                      | <b>RETENCIÓN</b>  | \$ 0.00       |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA ) |                   | \$ 125,458.52 |               |

### DESCUENTOS

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 0.2 %           | CMIC | \$ 250.92 |
| 0.2 %           | DIF  | \$ 250.92 |
| SUMA DESCUENTOS |      | \$ 501.84 |

### RESUMEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SUMA ESTA ESTIMACION | \$ 125,458.52 |
| AMORT ANTICIPO       | \$ 37,637.56  |
| SUB-TOTAL            | \$ 87,820.96  |
| I.V.A.               | \$ 14,051.35  |
| TOTAL                | \$ 101,872.31 |

(CON LETRA)  
(CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
31/100 M.N.)

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DESCUENTOS           | \$ 501.84     |
| SALDO NETO A RECIBIR | \$ 101,370.47 |

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA  
REVISO

ARD. JORGE PALACIOS CEBALLOS

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M  
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 101,370.47

(CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 1 CONTRATO No. 073/2018 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 1,168,584.65

UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

Primera Etapa Restauración de cubierta de Nave Central del Templo San Juan Bautista.;

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 125,458.52

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 37,637.56

SUBTOTAL \$ 87,820.96

IVA \$ 14,051.35

TOTAL \$ 101,872.31

## RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20% 250.92

DIF DEL 0.20% 250.92

SUMA 501.84

## RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

## CONTRATO

|                                 |    |              |
|---------------------------------|----|--------------|
| IMPORTE CONTRATADO              | \$ | 1,168,584.65 |
| CONVENIO MODIFICATORIO          | \$ | 0.00         |
| ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR   | \$ | 0.00         |
| ESTA ESTIMACION                 | \$ | 145,531.88   |
| ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION | \$ | 145,531.88   |
| POR EJERCER                     | \$ | 1,023,052.77 |

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

## CONTRATO

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| IMPORTE DE ANTICIPO | \$ | 350,575.39 |
| ACUMULADO ANTERIOR  | \$ | 0.00       |
| ESTA ESTIMACION     | \$ | 43,659.57  |
| ACUMULADO ACTUAL    | \$ | 43,659.57  |
| POR AMORTIZAR       | \$ | 306,915.82 |

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

|                    | 0.20% CMIC | 0.20% DIF |
|--------------------|------------|-----------|
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 0.00    | \$ 0.00   |
| ESTA ESTIMACION    | \$ 250.92  | \$ 250.92 |
| ACUMULADO ACTUAL   | \$ 250.92  | \$ 250.92 |

RECIBIMOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

JCC000222K64

OBRA: Primera Etapa Restauración de cubierta de Nave Central del Templo San Juan Bautista;


UBICACIÓN: Juan de Dios Martín Barba #6112 Col. Nombre de Dios  
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACIÓN 1  
No. CONTRATO: 073/2018  
PERIODO: DEL 16/07/2018 AL 31/07/2018



CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

| CONCEPTOS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROYECTO |          | VOLUMENES  |                | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|--------------|
| No.                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD   | VOLUMEN  | ACUM.TOTAL | ACUM. ANTERIOR |                 |              |
| OBRA NORMAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                |                 |              |
| PRIMERA ETAPA DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                |                 |              |
| PRELIMINARES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                |                 |              |
| PR2                                                                                    | PROTECCIÓN Y REGISTRO DE OBRAS DE ARTE. SE ENVOLVERÁN ESCULTURAS Y CUADROS CON PELLÓN DELGADO, PELÍCULA DE AIRE SELLADO (POLIBURBUJA) Y CINTA CANELA, PARA LA PROTECCIÓN DE IMPACTOS Y POLVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                     | PZA      | 20.0000  | 18.0000    | 0.0000         | 18.0000         | \$ 1,582.20  |
| PR4                                                                                    | RETIRO DE BANCAS Y MOBILIARIO Y TRASLADO A CENTRO PASTORAL, DURANTE LA INTERVENCIÓN. INCLUYE: REUBICACIÓN DENTRO DEL TEMPLO DESPUES DE INTERVENCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                   | PIEZA    | 56.0000  | 47.0000    | 0.0000         | 47.0000         | \$ 1,800.10  |
| PR5                                                                                    | PROTECCION DE PISO EXISTENTE Y VENTANAS, POR UNA PELÍCULA DE HULE ESPUMA DE 5MM DE ESPESOR, Y TRIPLAY DE 5/8" EN ÁREAS DONDE SE ESTE TRABAJANDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA DESPUES DE LA INTERVENCIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                      | M2       | 200.0000 | 113.2400   | 0.0000         | 113.2400        | \$ 24,723.69 |
| CUBIERTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                |                 |              |
| CU1                                                                                    | RETIRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CUBIERTAS DEL TEMPLO SIN RECUPERACION HASTA UNA ALTURA DE 13.94 ML. SE REALIZARA DE MANERA MANUAL DESDE EL EXTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. INCLUYE: LIMPIEZA, USO DE ANDAMIOS, GRUAS O TODO LO NECESARIO PARA SU DESMONTAJE, ASIMISMO INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.    | M2       | 290.0000 | 73.7600    | 0.0000         | 73.7600         | \$ 8,888.82  |
| CU2                                                                                    | RETIRO DE TABLETAS DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 13.94 ML. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL DESDE EL EXTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. SE ESTIMA EL 100% DE LAS TABLETAS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2       | 290.0000 | 73.7600    | 0.0000         | 73.7600         | \$ 11,502.13 |

  
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE D.O.P.M.

UBICACIÓN: Juan de Dios Martin Barba #6112 Col. Nombre de Dios

ESTIMACIÓN No. 1 ESTIMACION 1

No. CONTRATO: 073/2018

CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

DEL 16/07/2018 AL 31/07/2018



| CONCEPTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROYECTO |          | VOLUMENES  |                |               | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| No.       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD   | VOLUMEN  | ACUM TOTAL | ACUM. ANTERIOR | VOL. ESTIMADO |                 |              |
| CU14      | SUMINISTRO E IMPREGNACIÓN DE TABLETA DE ACUERDO A PROYECTO PROPORCIONADO. INCLUYE: APLICACIÓN DE BIOCIDO (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR (ACEITE DE LINAZA) APLICANDO LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS HASTA QUE SE IMPREGNE LA TABLETA, LIMPIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRATAMIENTO Y LIMPIEZA A CALZAS DE APOYO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD COLOCADA. | M2       | 290.0000 | 92.9600    | 0.0000         | 92.9600       | \$ 827.90       | \$ 76,961.58 |
|           | OBRA EXCEDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |                |               |                 | \$ 0.00      |
|           | OBRA EXTRAORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |                |               |                 | \$ 0.00      |



CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

RESIDENTE D.O.P.M.

OBRA: Primera Etapa Restauración de cubierta de Nave Central del Templo San Juan Bautista.;

UBICACIÓN: Juan de Dios Martin Barba #6112 Col. Nombre de Dios  
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1  
No. CONTRATO: 073/2018  
PERIODO: DEL 16/07/2018 AL 31/07/2018

CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.



| RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS |                                                                                        |          |         |            |                |                 |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| CONCEPTOS                             |                                                                                        | PROYECTO |         | VOLUMENES  |                | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
| No.                                   | DESCRIPCION                                                                            | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM TOTAL | ACUM. ANTERIOR |                 |               |
|                                       | OBRA NORMAL                                                                            |          |         |            |                |                 |               |
|                                       | PRIMERA ETAPA DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA |          |         |            |                |                 | \$ 125,458.52 |
|                                       | PRELIMINARES                                                                           |          |         |            |                |                 | \$ 125,458.52 |
|                                       | CUBIERTA                                                                               |          |         |            |                |                 | \$ 28,105.99  |
|                                       | OBRA EXCEDENTE                                                                         |          |         |            |                |                 | \$ 97,352.53  |
|                                       | OBRA EXTRAORDINARIA                                                                    |          |         |            |                |                 | \$ 0.00       |
|                                       |                                                                                        |          |         |            |                |                 | \$ 0.00       |
| SUBTOTAL                              |                                                                                        |          |         |            |                |                 | \$ 125,458.52 |
| IVA                                   |                                                                                        |          |         |            |                |                 | \$ 20,073.36  |
| TOTAL                                 |                                                                                        |          |         |            |                |                 | \$ 145,531.88 |

  
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE D.O.P.M.



|          |                                                            |                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO | 073/2018                                                   | TRAMO:                                                            |
| OBRA:    | PRIMERA ETAPA RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL | CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V. |

**Nº DE ESTIMACION:** 1 PERIODO DE ESTIMACION 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

[illegible]

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

CROQUIS

VOLUMEN  
A PAGAR

18

## PR2

PROTECCIÓN Y REGISTRO DE OBRAS DE ARTE, SE ENVOLVERAN ESCULTURAS Y CUADROS CON PELLON DELGADO, PELÍCULA DE AIRE SELLADO (POLIBURBUJA) Y CINTA CANELA, PARA LA PROTECCIÓN DE IMPACTOS Y POLVO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM



JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.



## HOJA /

**JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.**

**JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO DE ESTIMACION: 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

[illegible]

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

47

The diagram is a floor plan of a building. It features a central rectangular hall with a smaller rectangular room at the top and a semi-circular room at the bottom. To the left of the central hall is a small rectangular room, and to the right is a larger rectangular room. A blue hatched area covers a large rectangular section of the central hall, indicating the volume to be paid for. A blue arrow points from the text 'VOLUMEN A PAGAR' to this hatched area.

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

PR4

RETIRO DE BANCAS Y MOBILIARIO Y TRASLADO A CENTRO PASTORAL, DURANTE LA INTERVENCIÓN. INCLUYE: REUBICACIÓN DENTRO DEL TEMPLO DESPUES DE INTERVENCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM



HOJA /

CONTRATO 073/2018

TRAMO:

OBRA: PRIMERA ETAPA RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO DE ESTIMACION: 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

[illegible]

113.24

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

PR5

PROTECCIÓN DE PISO EXISTENTE Y VENTANAS, POR UNA PELÍCULA DE HULE ESPUMA DE 5MM DE ESPESOR, Y TRIPLAY DE 5/8" EN ÁREAS DONDE SE ESTE TRABAJANDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA DESPUES DE LA INTERVENCIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.



HOJA /

|          |                                                            |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO | 073/2018                                                   | TRAMO:                                                           |
| OBRA :   | PRIMERA ETAPA RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL | CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V |

**Nº DE ESTIMACION:** 1 PERIODO DE ESTIMACION: 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018

[illegible]

CROQUIS

Architectural sketch of a building facade. The structure features a semi-circular apse on the left, a central rectangular section with a window, and a smaller rectangular section on the right. The central window is shaded with blue diagonal lines. The sketch includes construction lines and a dimension of 4.95.

VOLUMEN  
A PAGAR


73.76

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DORM

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

## CU1

RETIRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE CUBIERTAS DEL TEMPLO SIN RECUPERACION HASTA UNA ALTURA DE 13.94 ML. SE REALIZARA DE MANERA MANUAL DESDE EL EXTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. INCLUYE: LIMPIEZA, USO DE ANDAMIOS, GRUAS O TODO LO NECESARIO PARA SU DESMONTAJE, ASIMISMO INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.

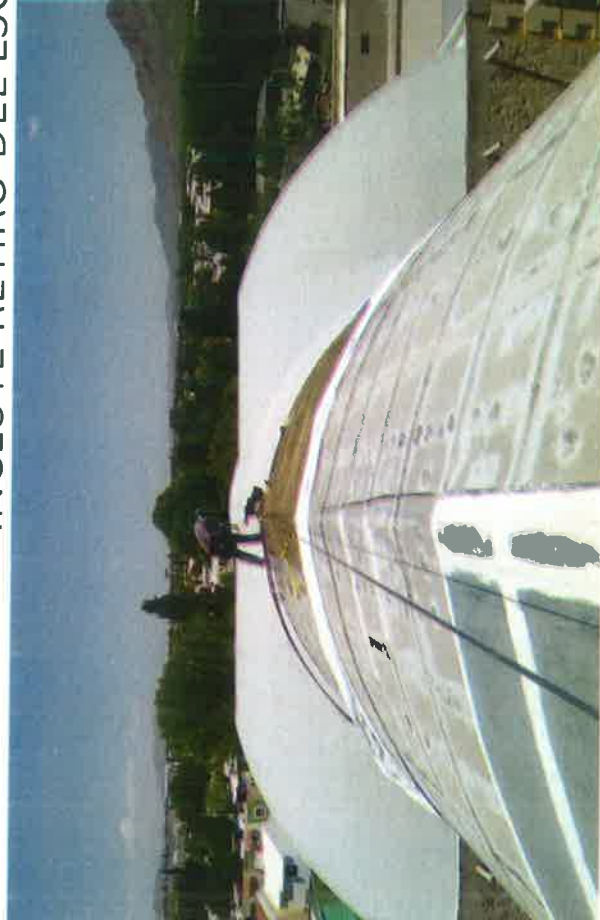

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

[illegible]

CROQUIS

VOLUMEN  
A PAGAR

73.76

The floor plan shows a central rectangular hall with a semi-circular room at the bottom. The hall has a blue hatched area in the center. The semi-circular room has a central square area. The plan includes various rooms, corridors, and structural elements like walls and doors. A dimension of 4.95 is indicated on the right side of the hall. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.



# GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA /

|          |                                                            |                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO | 073/2018                                                   | TRAMO:                                                            |
| OBRA :   | PRIMERA ETAPA RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL | CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V. |

|                   |   |                       |                            |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| No DE ESTIMACION: | 1 | PERIODO DE ESTIMACION | 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018 |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|

| CONCEPTO                 | OPERACIONES ARITMETICAS      |
|--------------------------|------------------------------|
| CU14                     |                              |
| SUMINISTRO E             |                              |
| IMPREGNACIÓN DE TABLETA  |                              |
| DE ACUERDO A PROYECTO    | area x tableta 6*0.0254*2.44 |
| PROPORCIONADO. INCLUYE:  | 0.372 m2                     |
| APLICACIÓN DE BIOCIDA    | piezas 250                   |
| (MADERCIDE) 2 MANOS, Y   | area total 92.96 m2          |
| PRESERVADOR (ACEITE DE   |                              |
| LINAZA) APLICANDO LAS    |                              |
| MANOS QUE SEAN           |                              |
| NECESARIAS HASTA QUE SE  |                              |
| IMPREGNE LA TABLETA,     |                              |
| LIMPIEZAS, MATERIALES,   |                              |
| MANO DE OBRA,            |                              |
| HERRAMIENTA,             |                              |
| TRATAMIENTO Y LIMPIEZA A |                              |
| CALZAS DE APOYO,         |                              |
| DESPERDICIOS Y TODO LO   |                              |
|                          | 92.96                        |


|         |                 |
|---------|-----------------|
| CROQUIS | VOLUMEN A PAGAR |
|         | 92.96           |

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

## CU14

SUMINISTRO E IMPREGNACIÓN DE TABLETA DE ACUERDO A PROYECTO PROPORCIONADO. INCLUYE: APLICACIÓN DE BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR (ACEITE DE LINAZA) APLICANDO LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS HASTA QUE SE IMPREGNE LA TABLETA, LIMPIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRATAMIENTO Y LIMPIEZA A CALZAS DE APOYO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD COLOCADA.



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS  
RESIDENTE DOPM
