

DATOS BÁSICOS

No CONTRATO 073/2018

PROYECTO: PRIMERA ETAPA RESTAURACIÓN DE CUBIERTA NAVE CENTRAL
DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No. PI-VIV-16-032
TRABAJOS PRELIMINARES, RESTAURACIÓN DE MUROS Y RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE NAVE

MONTO DE CONTRATO: \$1,168,584.65 CON IVA


CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 16/07/2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 16/07/2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31/08/2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: PENDIENTE
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	100.00%	PROGR.	REAL
REAL:	95.64%		
POR PARTIDA			
1 PRELIMINARES	100.00%	100.00%	
2 MUROS	100.00%	100.00%	
3 CUBIERTA	100.00%	100.00%	

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

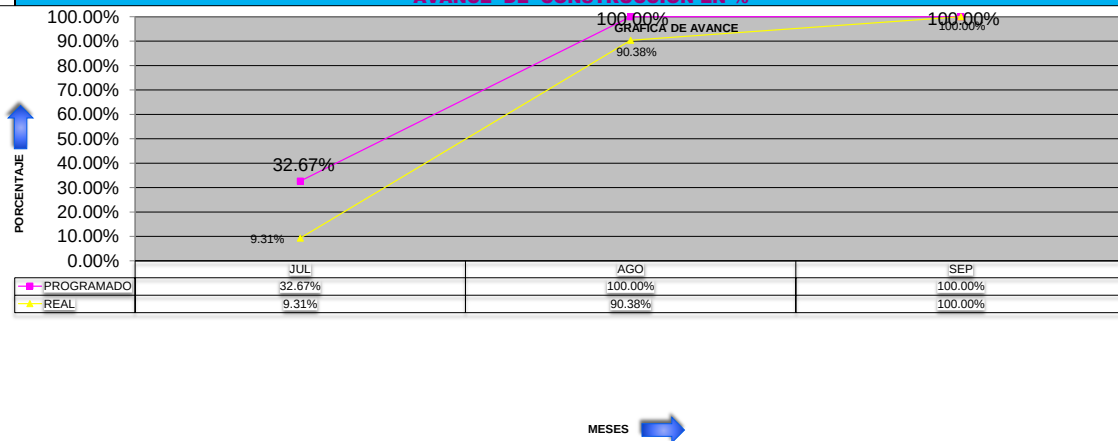

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PRELIMINARES

MUROS

INICIA PINTURA INTERIOR

CUBIERTA

PENDIENTE TERMINAR ULTIMO CLARO DE PRIMERA CAPA DE PREFABRICADO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y

EN PROCESO IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL PLUVIAL
EN PROCESO COLOCACIÓN DE GARGOLAS

EXTRAORDINARIOS

OBSERVACIONES:

EN TRÁMITE ESTIMACION 3
EL 31 DE AGOSTO TERMINÓ PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA




IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL PLUVIAL



APLICACIÓN DE PINTURA A



PERSPECTIVA DESDE EXTERIOR DE TEMPLO



RESANE DE GRIET.

6 de septiembre de 2018

TODA LA SEGUNDA CAPA



LA CAL EN EL INTERIOR DEL TEMPLO



AS EN INTERIOR DE TEMPLO
