



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

DATOS BÁSICOS

No CONTRATO 077/2018

PROYECTO: **PROGRAMA DE IMGEN VIAL, UBICADO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AVE. FRANCISCO VILLA.**

CARACTERÍSTICAS: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, COLOCACIÓN DE PIEDRA ORNAMENTAL, PINTURA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO.**

MONTO DE CONTRATO: **\$137,999.54** CON IVA


CONTRATISTA: **ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L. DE C. V.**
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **26/08/2018**
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: **26/08/2018**
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31/08/2018**
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: **PENDIENTE**
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	100.00%		
REAL:	99.93%		
	PROGR.	REAL	
POR PARTIDA			
1 PRELIMINARES	0.00%	0.00%	
2 GUARNICIONES	100.00%	100.00%	
3 CONCRETO	100.00%	100.00%	

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

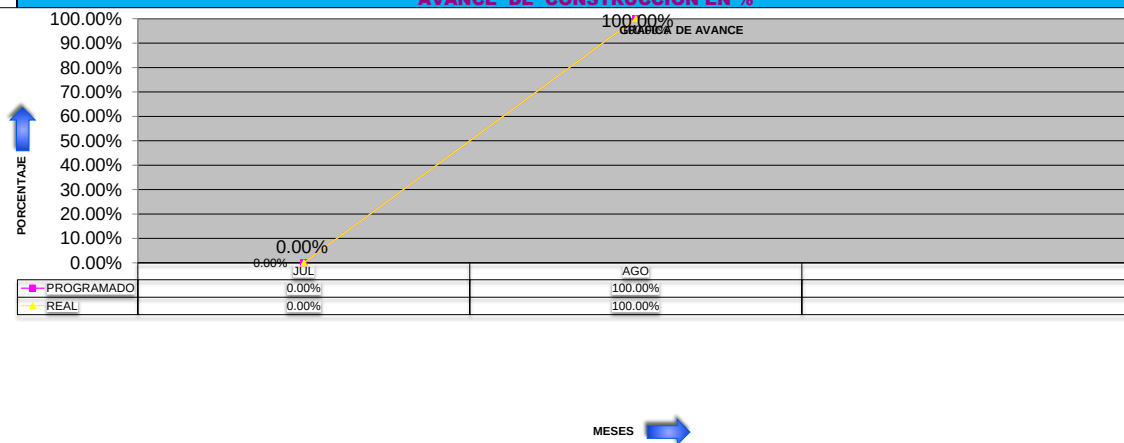

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

OBRA TERMINADA

OBSERVACIONES:

EN TRÁMITE ESTIMACION 1 (ÚNICA)
EL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO



CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES



CONCRE



GRAVA ORNAMENTAL



SEÑ

26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO



TO EN BANQUETAS



VALAMIENTO
