



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA : 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: TRABAJOS EN COMANDANCIA NORTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL No CONTRATO: 045/2018

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-OP-024


CARACTERÍSTICAS: CONSISTE EN LA REMODELACION DE LA COMANDANCIA NORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO : \$643,268.51 CON IVA MONTO MODIFICADO :
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES MARRRO S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO : 08 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN : 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA : 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO SE PROGRAMA ANTICIPO

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL
PROGRAMADO: \$643,268.51 100.00%
REAL: \$593,078.67 92.20%

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

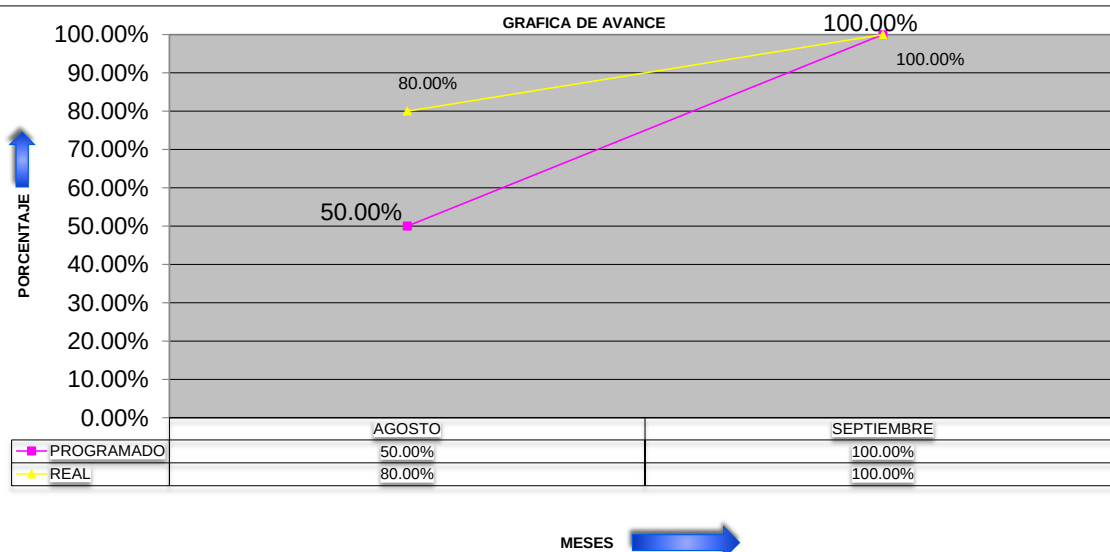

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

NOTAS:


SE TIENE TERMINADA EL RECUBRIMIENTOS DE DUCTOS DE CLIMAS

SE TIENEN TERMINADOS LOS CANCELES

SE TIENE TERMINADA TODA LA PINTURA EN MUROS Y PLAFONES

SE REALIZO LIMPIEZA Y SE PROCEDE A HACER LA ENTREGA DE LA OBRA

PINTURA EN MUROS



PINTURA EN PLAFONES



AISLAMIENTOS EN DUCTOS DE CLIMAS



CANCELERIA EN 911 Y SALA DE JUNTAS

