

CONFIDENTIAL

R.F.C. 100-810120-DNA REG-ONIC-22502 CHHUA-HUA CHH TEL: 410-46 46 Y 428-67-28 CARBONEL #3702

Documento
Válido

SERIE: CH
FOLIO: 560
FECHA: 7/10/2016 13:02:33

Factura

TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE
TC0810120DN4 CARBONEL No. 3702 SAN FELIPE

TC0810120DN4 CARBONEL NO. 3702 SAN FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MC1651010V22

Domicilio:

Ciudad: CHIHUAHUA

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

Lugar de Expedición: CARBONEL 3702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO


Concepto / Descripción	Unidad	Cantidad
ESTIMACION No. 9 (NUEVE)		
REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BVD DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AVE.		
JUAREZ, TRAMO: BVD DIAZ ORDAZ A CALLE 219 Y AVE. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A CALLE OCAIMPO		
CONTRATO No. 001/2016		
ALCANJE DE LA ESTIMACION \$1,266,159.20		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$1,202,851.24		
SUBTOTAL(1) \$63,307.96		
16 % I.V.A. \$10,129.27		
SUBTOTAL(2) \$73,437.23		
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO		
0.2 % C.M.T.C. \$2,532.32		
0.2 % I.C.T.C. \$2,532.32		
0.2 % D.I.F. \$2,532.32		
SUMA \$7,596.96		
NETO A RECIBIR		
65,840.27		
Valor Unitario		
Importe		

SUBTOTAL:	63,307.96
I.V.A.:	10,129.27
TOTAL:	73,437.23

Importe con letra

Metodo de Pago

No identificado, 02



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ
Sistema de facturación electrónica

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301206435
Folio fiscal:	76B4A9CD-4A04-4EBC-A485-560826B7C3B5
No de Serie del Certificado del SAT:	000010000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 7 2016 - 14:02:36



012NDAB9DROCVNLTmhwg1K3NtDxQYlMdgJ05avmH0Dve1P/7ldfgJmE9K0b0y01zq/Y4YLSnBgaYAYL1e0qD1J6/69w
0qblt6/6bawE2Xv7Zn1Qbm6C0XZ0Uc2Rhd4/w1SS/NBvZz6/Lxq4QcH7g0HmE9K0b0y01zq/Y4YLSnBgaYAYL1e0qD1J6/69w

B0T1KxA9URKsK/J4NE7VZNNH697pg8e1MwAg0EeMe1g7JNE1KvHRYLYYg6Puz2Wm7vXDK191DEAN
(J0U1+wmY1YXMA0URKX0+TV6NU5210PHNTPM0H1PBUEKN1V49e4gVWQMEKJ)0G01COMFOVMT7J0HNRKVA
31NDM047d3-

111.0176B4A9CD-4A04-4EBC-A485-560826B7C3B5:2016-10-07T14:02:361CM2NMA9PDROCVNLTm
hwg1K3NtDxQYlMdgJ05avmH0Dve1P/7ldfgJmE9K0b0y01zq/Y4YLSnBgaYAYL1e0qD1J6/69w
1000000020286488311

[Handwritten signatures and scribbles]




Secretaría de Administración y Finanzas

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal	X
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	TC0810120DN4	Folio Fiscal	76B4A9CD-4A04-4EBC-A485-560826B7C385	Total del CFDI	\$73,437.23
Nombre o Razón Social del Emisor	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV	Fecha de Expedición	2016-10-07T13:02:33	Efecto del Comprobante	Ingreso
RFC del Receptor	MC1651010V22	Fecha Certificación SAT	2016-10-07T14:02:36	Estado CFDI	Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAC que Certificó	MAS0810247C0		

Imprimir



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL		CONTRATO No. 001/2016	CONTRATADOS
OBRAS: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 218, Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 148 A AV. OCAMPO, COL. CENTRO		PERIODO EJEC. 13 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO DE 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA CHIH.		IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,468,744.67 CON IVA
CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 4,840,000.00 CON IVA
RFC TC0810120DN4		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 6,308,744.67 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES	\$ -	
EXCEDENTES	\$ -	
EXTRAS	\$ 1,266,159.20	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,266,159.20	

DESCUENTOS	0.2% C.M.I.C.	2,532.32	\$
	0.2% I.C.I.C.	2,532.32	\$
	0.2% D.I.F.	2,532.32	\$
SUMA DESCUENTOS		7,596.96	\$
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	1,266,159.20	
AMORT ANTICIPO	\$	1,202,851.24	
SUB-TOTAL	\$	63,307.96	
I.V.A.	\$	10,129.27	
TOTAL	\$	73,437.23	
(CON LETRA)			
(SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	7,596.96	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	65,840.27	

AUTORIZO	Vo. Bo.	RESIDENTE D.O.P.M.	ABO. JORGE PALACIOS REBULLOS
ELABORO	Vo. Bo.	CONTRATISTA	TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
REVISO			
Jefe del Depto de Construcción			ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
Subdirector de Obra Pública e Infraestructura			ING. XOCCHITL PÉREZ BLANCO
Director de Obras Públicas y Mantenimiento			ING. RAMÓN D. RAMOS ARMENTA



C O N S T R U C T O R A

R.F.C. TCO-810120-DN4
REG. CNIC-22902
CARBONEL # 3702
TELS. 413-45-45 Y 426-57-28
CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE AGOSTO DEL 2016.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 9 CON FACTURA CH-560 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA:
REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE
VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE 13 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO DE 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$73,437.23 CON IVA INCLUIDO.
ACOMPANADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

ATENTAMENTE

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V

RECIBE

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 65,840.27
ESTIMACION NUM. 9 CONTRATO NO. 001/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$45,863,130.80
(SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 27/100 M.N.)
POR TRABAJOS EN LA OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AVE. JUAREZ, TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A CALLE 21a Y AVE. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A CALLE OPAMPO, COL. CENTRO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,266,159.20
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 1,202,851.24

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL		TOTAL	
C.M.I.C 0.2%	2,532.32	\$	63,307.96	\$	73,437.23
I.C.I.C. DEL 0.2%	2,532.32	\$	10,129.27	\$	
D.I.F.O. 2 %	2,532.32	\$		\$	
SUMA		\$		\$	
		\$		\$	7,596.96

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	45,863,130.80	CON IVA
PRIMERA ASIGNACION	\$	4,840,000.00	CON IVA
SEGUNDA ASIGNACION	\$	21,043,130.80	CON IVA
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	4,840,000.00	CON IVA
ESTA ESTIMACION	\$	1,468,744.67	CON IVA
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	6,308,744.67	CON IVA
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$	-	CON IVA
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	\$	19,574,386.13	CON IVA
POR EJERCER	\$	39,574,386.13	CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	13,764,939.24	CON IVA
PRIMERA ASIGNACION	\$	1,452,000.00	CON IVA
SEGUNDA ASIGNACION	\$	12,312,939.24	CON IVA
ACUMULADO ANTERIOR	\$	1,452,000.00	CON IVA
ESTA ESTIMACION	\$	1,395,307.44	CON IVA
ACUMULADO ACTUAL	\$	2,847,307.44	CON IVA
POR AMORTIZAR PRIMERA ASIGNACION	\$	-	CON IVA
POR AMORTIZAR SEGUNDA ASIGNACION	\$	10,917,631.80	CON IVA
POR AMORTIZAR	\$	10,917,631.80	CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	\$	8,344.84	0.2 % C.M.I.C
ESTA ESTIMACION	\$	2,532.32	0.2 % I.C.I.C
ACUMULADO ACTUAL	\$	10,877.16	0.2 % D.I.F.

RECIBIMOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
TC0810120DN4

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

UBICACIÓNCHIHUAHUA CHIH.


No. CONTRATO: 001/2016

ESTIMACIÓN No.9

CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V

PERÍODO: 13 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO DE 2016


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
		0.00
<u>EXCEDENTES</u>		
		0.00
<u>EXTRAS</u>		
1	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA	1,266,159.20
2	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA JUAREZ	344,904.51
		921,254.69
SUBTOTAL		1,266,159.20
I.V.A.		202,585.47
TOTAL		1,468,744.67



POR EL CONTRATISTA

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL0.00

OBRA EXCEDENTE0.00

OBRA EXTRA1,266,159.20

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE ALDAMA								
EXT-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP MONOPOLAR DE ALUMINIO CAL. 6, INCLUYE: SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIÓN, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO.	MIL	0.00	276.00	227.97	48.03	\$12.99	344,904.51
EXT-10	Apertura de zanja para tubería de agua de hasta 60 cm de ancho por 100 cm de profundidad incluye planilla y protección de 30 cm sobre todo del tubo con arena, relleno hasta nivel de base y compactación y retiro del material sobrante	m3	0.00	213.10	152.93	60.17	\$268.00	\$16,125.56
EXT-11	Construcción de guarnición trapezoidal de concreto premezclado de f'c= 200 Kg/cm2, colada en tramos no mayores a 3.00 m, de 20 cm de base x 30 cm de altura y 15 cm de cresta, incluye: cimbría metálica, materiales, membrana de curado, equipo, herramienta, mano de obra	m	0.00	238.58	179.38	59.20	\$139.94	\$8,284.45
EXT-40	Colocación de toma a futuro con tubo plus de 1/2" de diametro con tapon en ambos extremos hasta 3.50 mts de longitud incluye: material, mano de obra, desperdicios, excavación en cualquier tipo de material, retiro del material producto de la misma, relleno compactado al 90%	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$555.11	\$1,110.22
EXT-41	Suministro e instalación de registro ELÉCTRICO de 40 x 40 x 40 cm prefabricado de concreto incluye: nivelación, pruebas, puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$1,896.28	\$1,896.28
EXT-46	Construcción de pavimento con concreto premezclado MR=42.50 KG/CM2 con fibra con un espesor de 15 cms incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, curado, colado, riego de impregnación de la superficie, regleteo, vibrado, cimbría y descimbría,	m2	0.00	27.66	0.00	27.66	\$360.47	\$9,970.60
EXT-49	Sondeos a mano para la localización de tuberías existentes de instalaciones varias incluye: mano de obra, herramientas, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	27.00	0.00	27.00	\$88.79	\$2,397.33
EXT-52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-25 DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	0.00	484.80	0.00	484.80	\$37.91	\$18,378.77
EXT-58	BASE DE CAJA DE DISTRIBUCION DE TELMEX FABRICADA POR CONTRATISTA DE ELLOS MISMOS	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$2,758.13	\$2,758.13
EXT-59	SELLADO DE BOQUILLA EN ADOQUIN CON SIKAFLEX 1A, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE BOQUILLA DE ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MIL	0.00	154.76	0.00	154.76	\$23.50	\$3,636.86

TEPORACA CONSTRUCTORA, S A DE C.V.

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

Pag 1 de 2

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
EXT-60	REMEDIACION DE SALIDA METALICA DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$2,528.28	\$2,528.28	
EXT-61	REMEDIACION DE REGISTRO DE CABLE DE 60 X 60, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	12.00	0.00	12.00	\$603.89	\$7,246.68	
EXT-62	CONEXION DE TUBERIA DE 1" A TUBERIA DE 2" DE PVC RD-26 PARA RIEGO CON TEE, VALVULA Y CAJA DE VALVULAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$512.87	\$1,025.74	
EXT-64	Pago de presupuesto de Telmex para reubicacion de infraestructura existente en calle Aldama.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$231,829.04	\$231,829.04	
EXT-70	Pago Complementario de la reubicacion de lineas de Telmex.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$37,092.65	\$37,092.65	

2	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA JUAREZ								
EXT-67	SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO JR-60HA 60 LEDS IRIDIUM DE ALTA POTENCIA DE 127 WATS DE ACUERDO A FICHA TECNICA ANEXA INCLUYE: TRASLADO DE INSUMOS A DONDE LO INDIQUE LA DEPENDENCIA	PZA	0.00	35.00	0.00	35.00	\$22,662.55		\$793,189.25
EXT-68	RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN BANQUETAS PROPIEDAD DE TELEFONOS DE MEXICO EN EL TRAMO DE BLVD. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO BANQUETA SUR (AVE. JUAREZ)	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$128,065.44		\$128,065.44
							921,254.69		

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

G E N E R A D O R
TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP MONOPOLAR DE ALUMINIO CAL. 6, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIÓN, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	276.00 M

EXTRAS


LOCALIZACION	LONGITUD POSTE	NUM. CABLES	CANT. TOTAL	LOCALIZACION	LONGITUD POSTE	NUM. CABLES	CANT. TOTAL
1	6.00	2.00	12.00	19	6.00	2.00	12.00
2	6.00	2.00	12.00	20	8.00	2.00	12.00
3	6.00	2.00	12.00	21	6.00	2.00	12.00
4	6.00	2.00	12.00	22	6.00	2.00	12.00
5	6.00	2.00	12.00	23	6.00	2.00	12.00
6	6.00	2.00	12.00				
7	6.00	2.00	12.00				
8	6.00	2.00	12.00				
9	6.00	2.00	12.00				
10	6.00	2.00	12.00				
11	6.00	2.00	12.00				
12	6.00	2.00	12.00				
13	6.00	2.00	12.00				
14	6.00	2.00	12.00				
15	6.00	2.00	12.00				
16	6.00	2.00	12.00				
17	6.00	2.00	12.00				
18	6.00	2.00	12.00				

TOTAL 276.00

ESTIM. 48.03

GENERA DOR-CROQUIS
TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO.CALLE ALDAMA TRAMO BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ TRAMO : BLV DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a Y AV. NINOS HEROES.TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO. COL CENTRO				FECHA
CALLE:	AVE. ALDAMA				PERIODO.
TRAMO	ENTRE BLV DIAZ ORDAZ A CALLE OCAMPO		HOJA 1-1	No. CONTRATO: 001/2016	
			PARTIDA EXT-02	No. ESTIMACION: 8	

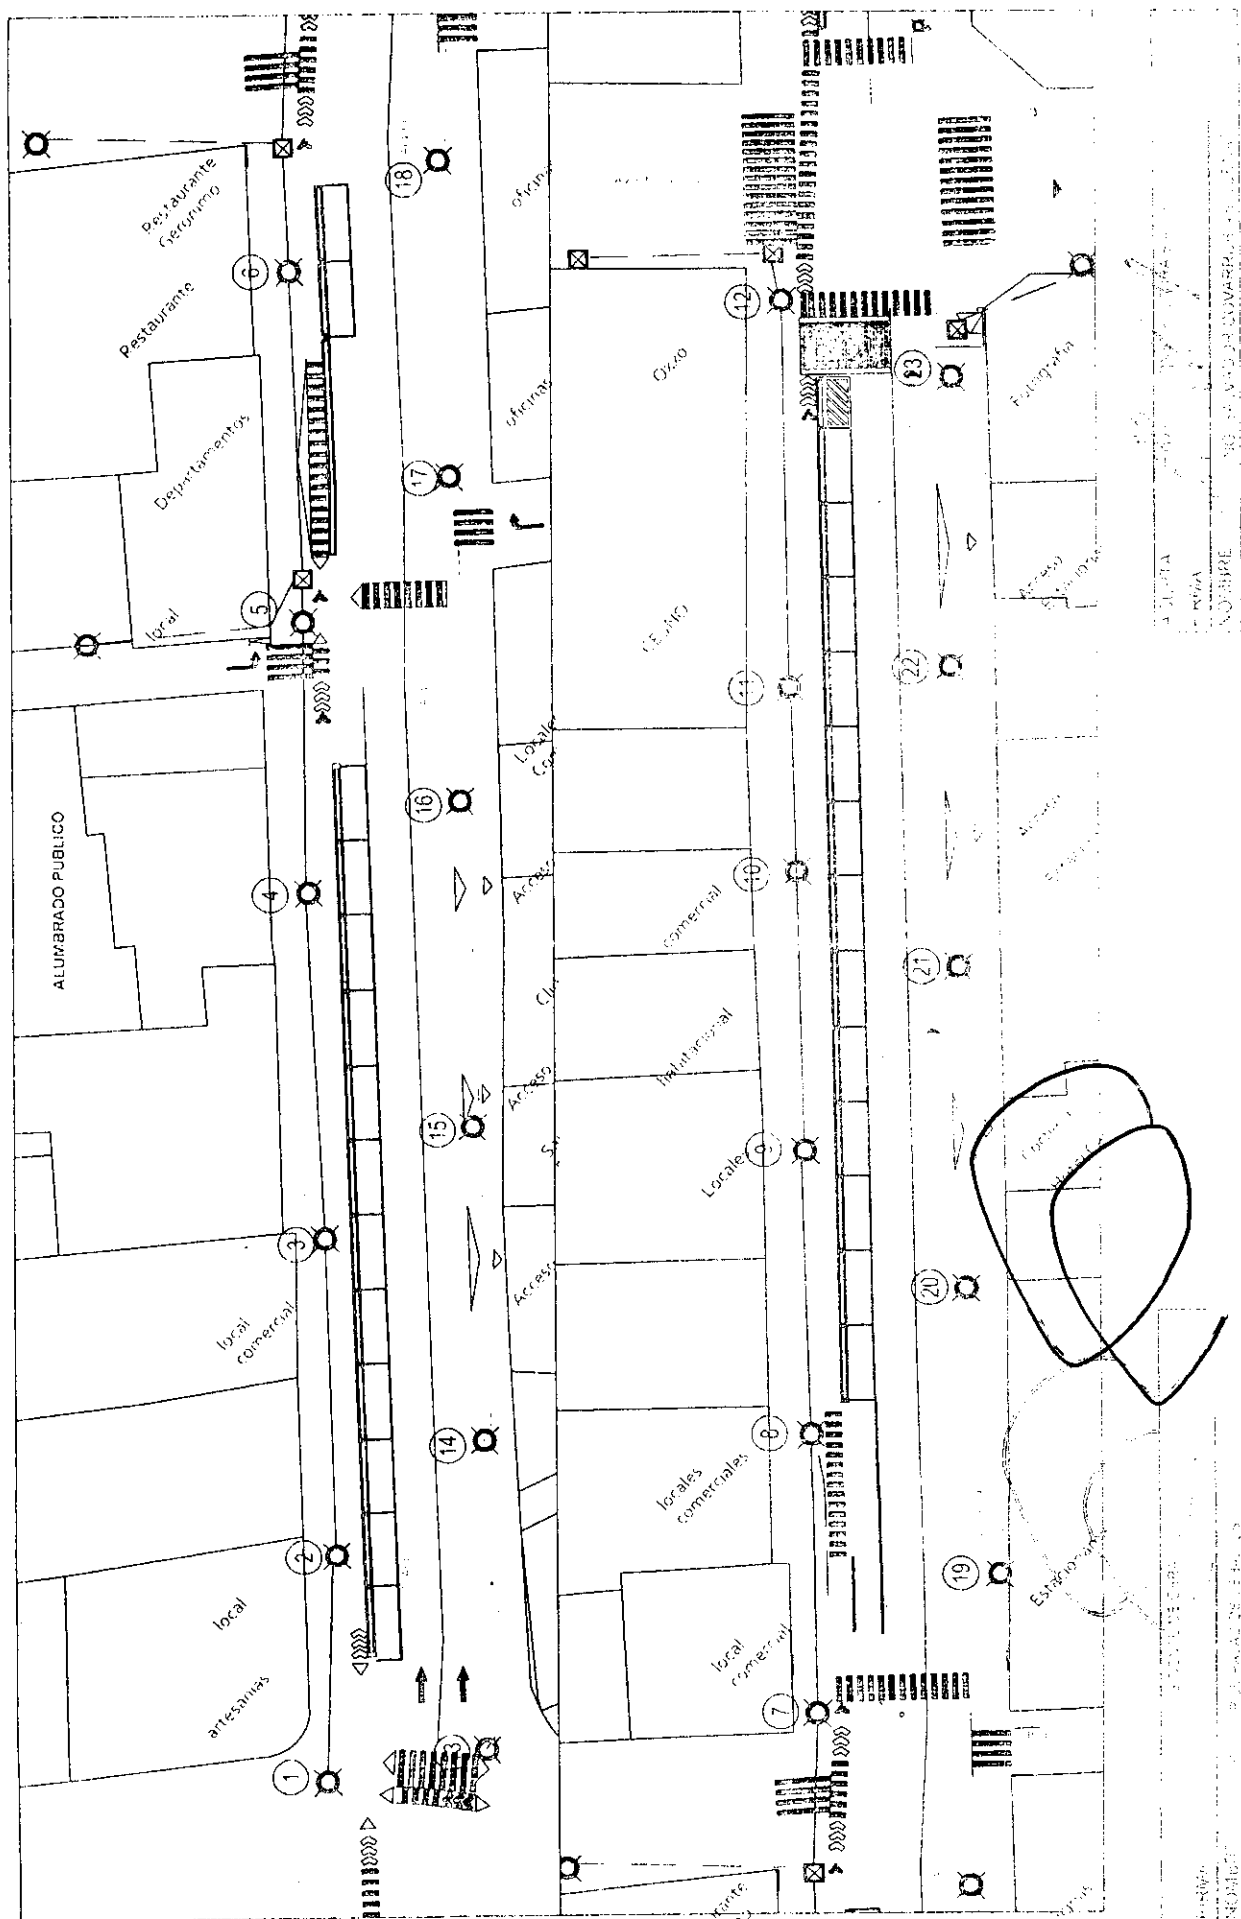

TESTIGO FOTOGRAFICO

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BIVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

CALLE ALDAMA

CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP MONOPOLAR DE ALUMINIO CAL. 6, INCLUYE: SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIÓN, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO	276.00 M

EXTRAS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAμπο, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 18/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE ALDAMA

ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAμπο (LADO DERECHO)

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
60.17 M3

CONCEPTO :

Apertura de zanja para tubería de agua de hasta 60 cm de ancho por 100 cm de profundidad incluye plantilla y protección de 30 cm sobre lomo del tubo con arena, relleno hasta nivel de base y compactación y retiro del material sobrante


CLAVE

EXT-10

EXTRA

LOCALIZACION	LONGITUD	ANCHO	PROF.	VOLUMEN
A	248.10	0.30	0.40	29.77
B	17.70	0.30	0.40	2.12
C	235.60	0.30	0.40	28.27

60.17

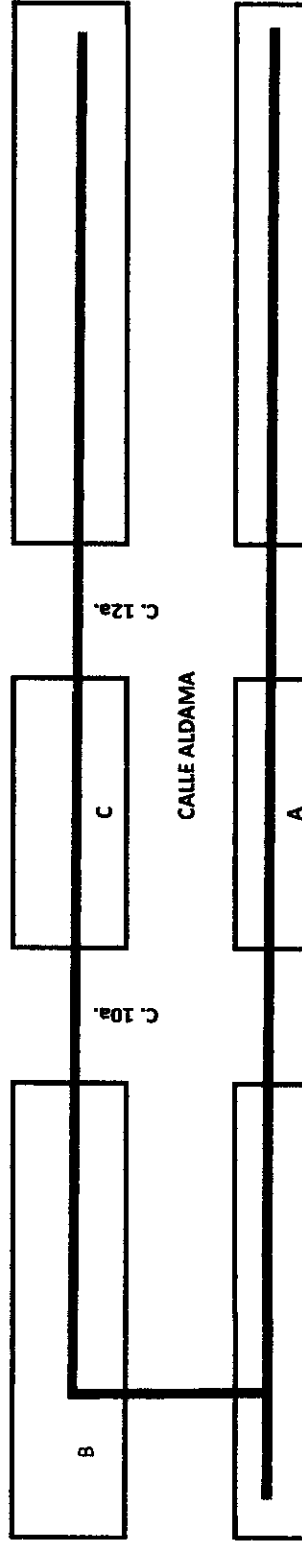

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS


TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. Y AV. NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL CENTRO
 COLONIA: CALLE ALDAMA
 CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAMPO (LADO DERECHO)
 No. CONTRATO: 001/2016
 No. ESTIMACION: 8
 31 DE AGOSTO DE 2016
 16/08/2016 AL 31/08/2016

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-10	Apertura de zanja para tubería de agua de hasta 60 cm de ancho por 100 cm de profundidad incluye plantilla y protección de 30 cm sobre lomo del tubo con arena, relleno hasta nivel de base y compactación y retiro del material sobrante	60.17 M3

DETALLE

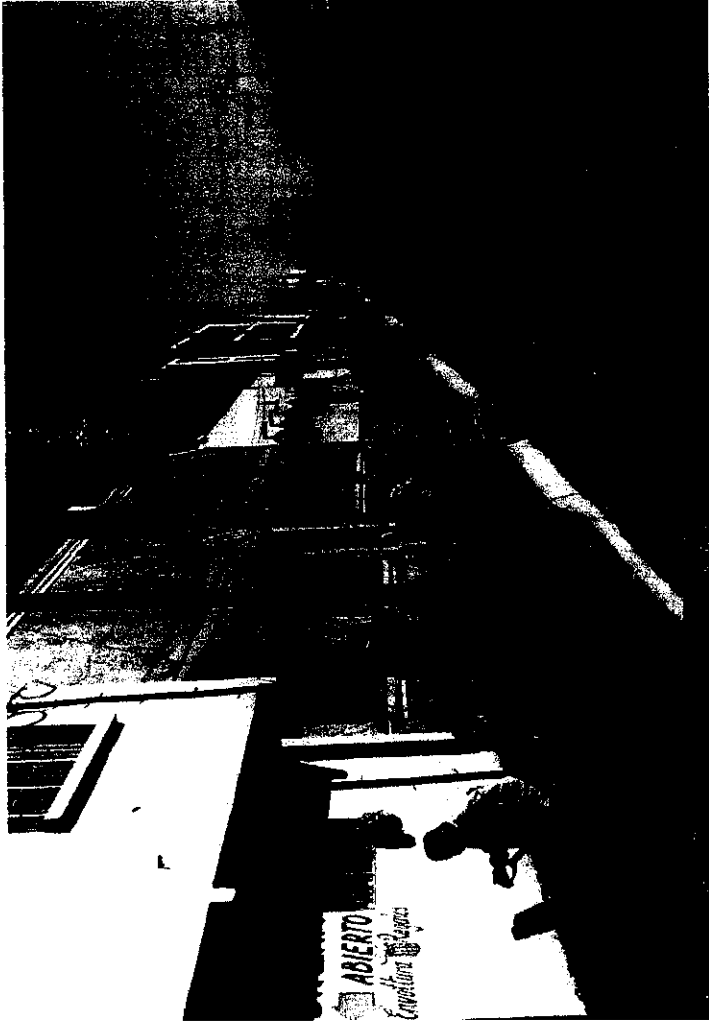

RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO.CALLE ALDAMA,TRAMO:BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ,TRAMO : BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 º y AV. NIÑOS HEROES,TRAMO: CALLE 14º A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA:

31 DE AGOSTO DE 2016

CALLE:

CALLE ALDAMA

PERIODO:

16/08/2016 AL 31/08/2016

TRAMO:

ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

No. CONTRATO:

001/2016

CLAVE

EXT-11

No. ESTIMACION:

8

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-11	Construcción de guarnición trapezoidal de concreto premezclado de f'c= 200 Kg/cm2 colada en tramos no mayores a 3.00 m. de 20 cm de base x 30 cm de altura y 15 cm de cresta, incluye cimbra metálica, materiales membrana de curado, equipo, herramienta, mano de obra y limpieza P.U.O.T	59.20 M

EXTRAS

LOCALIZACION	LONGITUD
A	22.10
B	2.30
C	24.20
C	10.60
59.20	

AVE. OCAMPO

22.10 COCHERA

A

2.30

B

24.20

C

10.60

BLVD. DIAZ ORDAZ

CALLE ALDAMA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
COLONIA: CALLE ALDAMA
CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAMPO (LADO DERECHO)
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-11	Construcción de guarnición trapezoidal de concreto premezclado de $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$, colada en tramos no mayores a 3.00 m, de 20 cm de base x 30 cm de altura y 15 cm de cresta, incluye: cimbra metálica, materiales, membrana de curado, equipo, herramienta, mano de obra y limpieza. P.U.O.T.	59.20 M

ENTRAS



Handwritten signature of Arq. Jorge Palacios Ceballos.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

Handwritten signature of Ing. Salvador Covarrubias Dueñas.

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/06/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-40	Colocacion de toma a furo con tubo plus de 1/2" de diametro con tapon en ambos extremos hasta 3.50 mts de longitud incluye material mano de obra. desperdicios. excavacion en cualquier tipo de material retiro del material producto de la misma relleno compactado al 90% proctor. instalacion desde el paramento hasta fuera de la guarinicion por unidad de obra terminada	2.00 PZA

EXTRAS

C. ALDAMA NUM	CALLE INICIAL	CALLE FINAL	CANT. TOMAS NIVELACION
210	BLVD DIAZ ORDAZ	C. 12a	1.00
806	C. 10a	AVE. OCAMPO	1.00
TOTAL			2.00

OK

AVE. OCAMPO	C. 10a.	C. 12a.	BLVD. DIAZ ORDAZ
CALLE ALDAMA			

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
 COLONIA: CALLE ALDAMA
 CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)
 No. CONTRATO: 001/2016
 No. ESTIMACION: 8
 FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
 PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-40	Colocacion de toma a fururo con tubo plus de 1/2" de diametro con tapon en ambos extremos hasta 3.50 mts de longitud incluye: material, mano de obra, desperdicios, excavacion en cualquier tipo de material, retiro del material producto de la misma, relleno compactado al 90% proctor, instalacion desde el paramento hasta fuera	2.00 PZA



RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-41	Suministro e instalación de registro ELÉCTRICO de 40 x 40 x 40 cm prefabricado de concreto incluye: nivelación, pruebas, puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	1.00 PZA


EXTRAS

CANT. TOTAL

PZA

LOCALIZACIÓN

ALUMBRADO




RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERA DOR - CROQUIS
TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA	REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO.CALLE ALDAMA,TRAMO:BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO: AV. JUAREZ,TRAMO : BLV DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. ; Y AV. NIÑOS HEROES,TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL CENTRO				FECHA:
CALLE:	AVE. ALDAMA				PERIODO:
TRAMO	ENTRE BLV DIAZ ORDAZ A CALLE OCAMPO		HOJA 1	PARTIDA EXT-41	No. CONTRATO. 001/2016
					No. ESTIMACION. 7

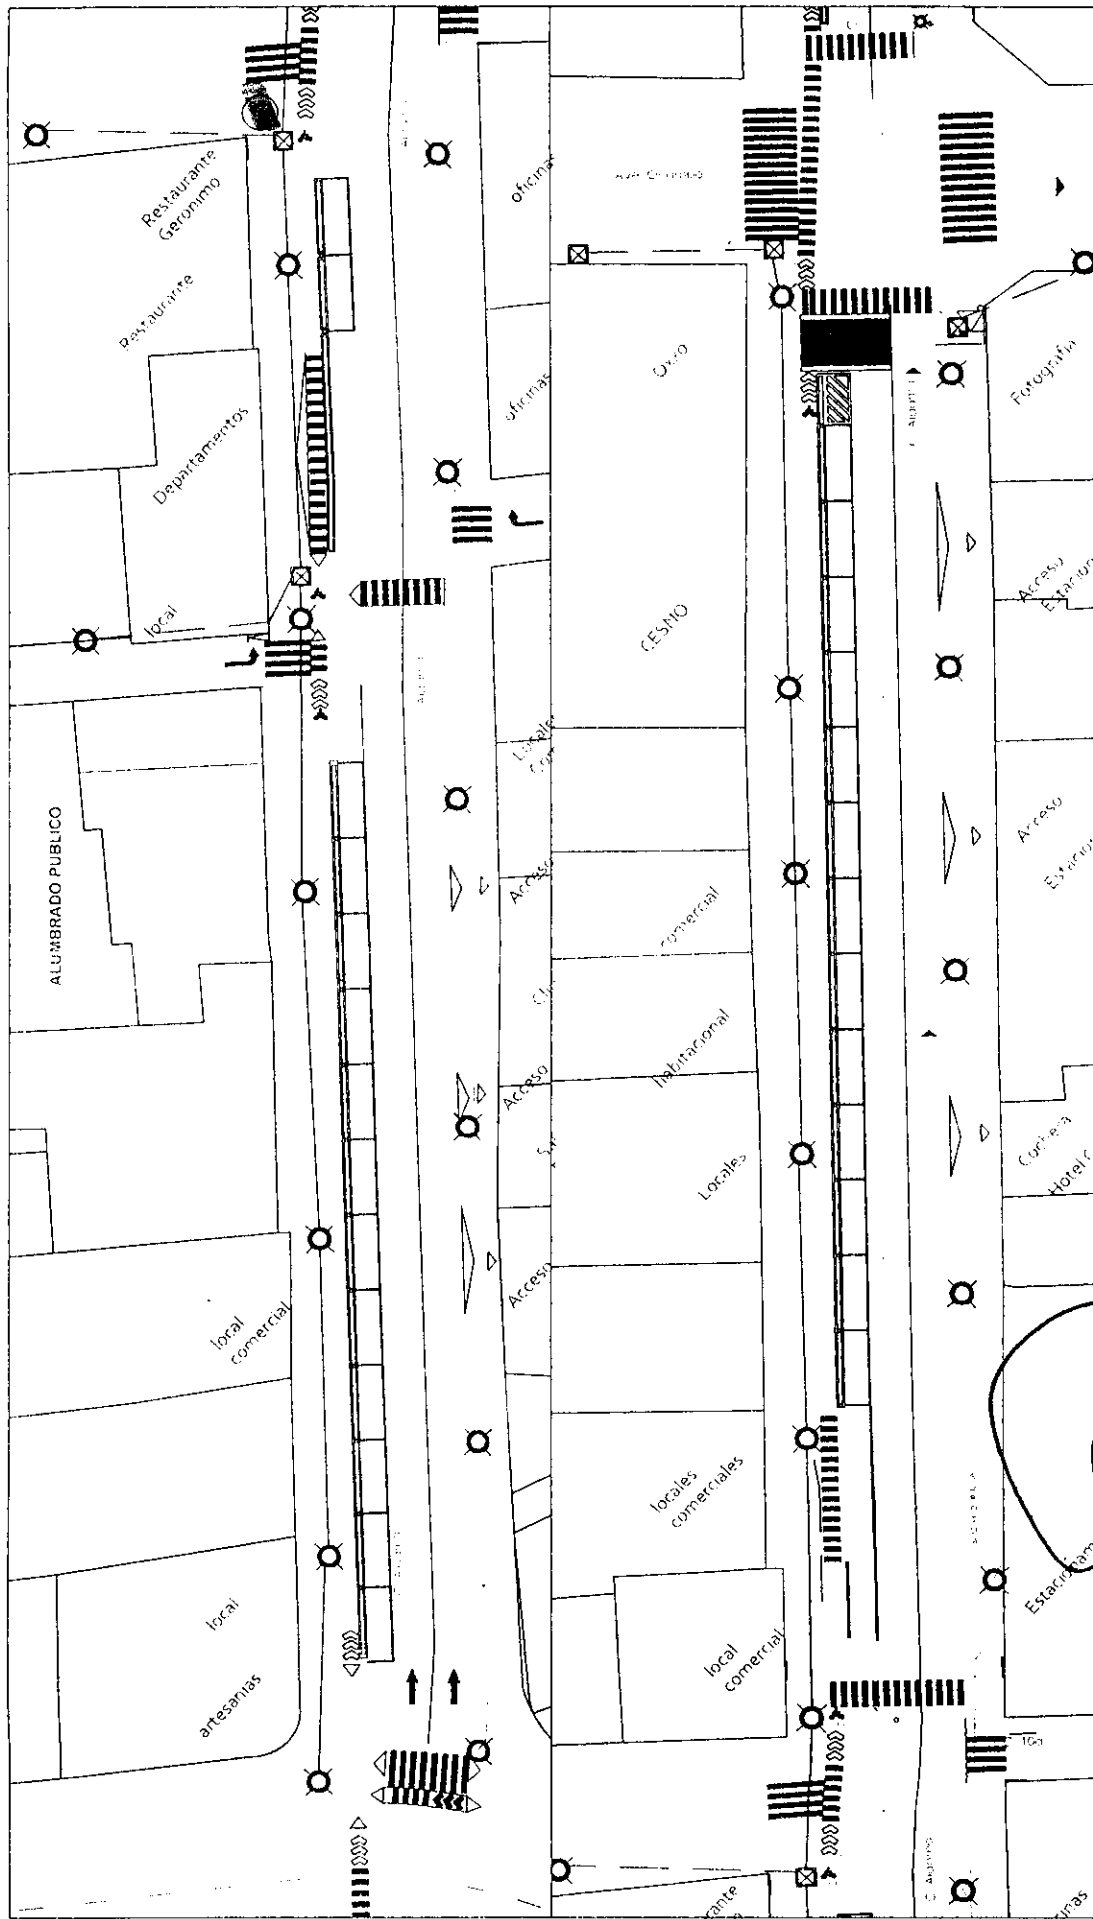

FIRMA	RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE	APO JORGE PALACIOS CEBALLOS

ACCEPTA
FIRMA

NOMBRE

~~COPIES OF THE REPORTS ARE~~

ING SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO: AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL CENTRO
 COLOMIA: CALLE ALDAMA
 CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
 PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016
 No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-41	Suministro e instalación de registro ELECTRICO de 40 x 40 x 40 cm prefabricado de concreto incluye: nivelación, pruebas, puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	1.00 PZA

EXT-41



RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-46	Construccion de pavimento con concreto premezclado MR-42.50 KG/CM2 con fibra con un espesor de 15 cms incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, curado, colado, riego de impregnacion de la superficie, regleado, vibrado, cimbra y descimbra, acabado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Por unidad de obra terminada.	27.66 M2

EXTRAS				
LOCALIZACION	a	b	LONGITUD	ANCHO
1			3.84	3.40
2			15.31	0.515
3			1.40	1.40
4			15.40	0.58
5			4.17	1.60
				27.66

AVE OCAMPO

CALLE ALDAMA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAÑO, COL. CENTRO
 COLONIA: CALLE ALDAMA
 CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAÑO (LADO DERECHO)
 No. CONTRATO: 001/2016
 No. ESTIMACION: 8
 31 DE AGOSTO DE 2016
 16/08/2016 AL 31/08/2016

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-46	Construcción de pavimento con concreto premezclado MR=42.50 KG/CM2 con fibra con un espesor de 15 cms Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, curado, colado, riego de impregnación de la superficie, regleado, vibrado, cimbra y descimbra, acabado de la superficie y todo lo necesario para su correcta	27.66 M2

EXTRAS



RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8


CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-49	Sondeos a mano para la localización de tuberías existentes de instalaciones varias incluye: mano de obra, herramientas, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución	27.00 PZA

EXTRAS				
C. ALDAMA NUM.	CALLE INICIAL	CALLE FINAL	CANT. REGISTROS	
1212	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	2.00	
1210	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1208	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1206	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1204	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1202	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1002	C. 12a.	C. 10a.	1.00	
814	C. 10a.	AVE. OCAMPO	2.00	
812	C. 10a.	AVE. OCAMPO	1.00	
806	C. 10a.	AVE. OCAMPO	2.00	
804	C. 10a.	AVE. OCAMPO	1.00	
TOTAL			14.00	

C. ALDAMA NUM.	CALLE INICIAL	CALLE FINAL	CANT. TOMAS	
1212	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1210	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1210	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1206	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1204	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1202	BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 12a.	1.00	
1002	C. 12a.	C. 10a.	1.00	
1000	C. 12a.	C. 10a.	1.00	
810	C. 10a.	AVE. OCAMPO	1.00	
808	C. 10a.	AVE. OCAMPO	1.00	
806	C. 10a.	AVE. OCAMPO	1.00	
804	C. 10a.	AVE. OCAMPO	1.00	
802	C. 10a.	AVE. OCAMPO	1.00	
TOTAL			13.00	



RESIDENTE DE OBRA
ARG. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS

TESTIGO FOTOGRAFICO


MAJOR CALLE CONSTRUIDA EN LA AV.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
COLOANIA: CALLE ALDAMA
CALLE: ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

31 DE AGOSTO DE 2016
16/08/2016 AL 31/08/2016
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-49	Sondeos a mano para la localizacion de tuberias existentes de instalaciones varias incluye: mano de obra, herramientas, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	27.00 PZA

EXTRAS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO CALLE ALDAMA TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO: AV. JUAREZ TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

Nº. CONTRATO: 001/2016

Nº. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE

EXT-52

CONCEPTO :


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-25 DE 1" DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES
IMANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

484.80 ML

EXTRAS

TRAMO	LONGITUD
A	248.10
B	1.10
C	235.60
	484.80



BLVD. DIAZ ORDAZ

C. 10a.

C. 12a.

CALLE ALDAMA

AVE. OCAMPO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

TRAMO: ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ A
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 g.; Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14g A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
COLONIA: CALLE ALDAMA
CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

31 DE AGOSTO DE 2016


PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-25 DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	484.80 ML

EXTRAS

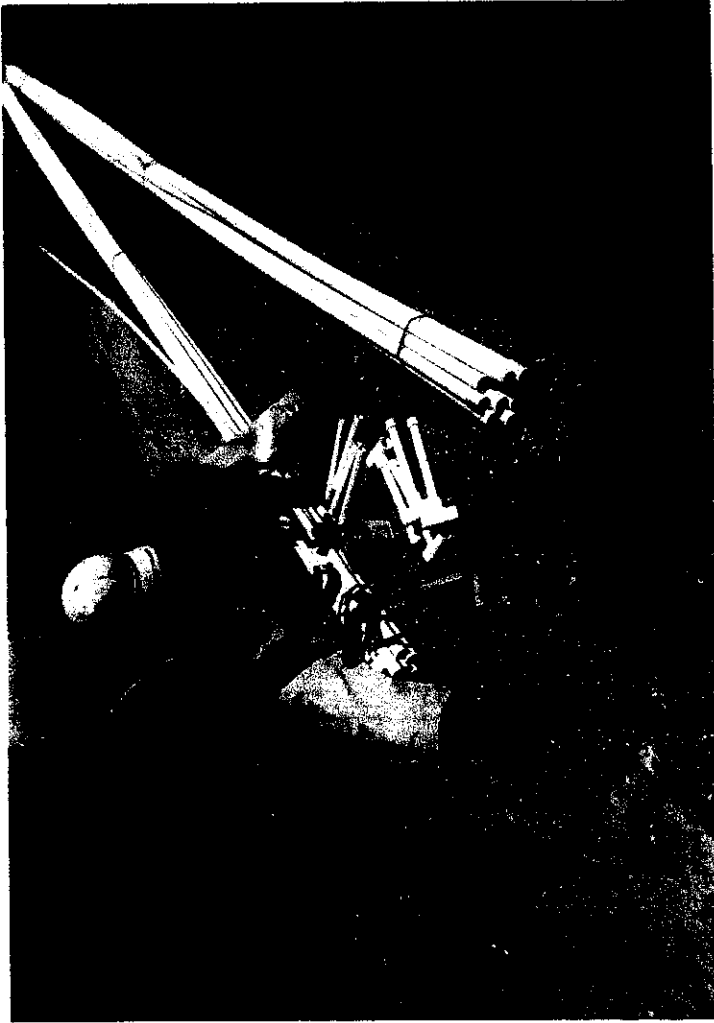

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO CALLE ALDAMA TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO: AV. JUAREZ TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 de JULIO Y AV. NIÑOS
HEROES TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAμπο, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAμπο (LADO DERECHO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-58	BASE DE CAJA DE DISTRIBUCION DE TELMEX FABRICADA POR CONTRATISTA DE ELLOS MISMOS	1.00 PZA

EXTRAS

BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 10a.	CALLE ALDAMA	C. 12a.	AVE. OCAμπο

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL CENTRO
COLOANIA: CALLE ALDAMA
CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAMPO (LADO DERECHO)
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT-58	BASE DE CAJA DE DISTRIBUCION DE TELMEX FABRICADA POR CONTRATISTA DE ELLOS MISMOS	1.00	PZA

ENTRADA



RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE ALDAMA

ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE

EXT-59

CONCEPTO :

SELLADO DE BOQUILLA EN ADOQUIN CON SIKAFLEX 1A, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA LIMPIEZA DE BOQUILLA
DE ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

154.76 ML

ENTRAS

LONGITUD A RESTAR		
LONGITUD	CANTIDAD	LARGO
11.67	7	81.69
2.81	30	84.30
		165.99
		4.83
		5.60
		0.80
		11.23

BLVD. DIAZ ORDAZ

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO CALLE ALDAMA, TRAMO: 81VD, DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

COLONIA:

CALLE:

CALLE ALDAMA

ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAMPO (LADO DERECHO)

FECHA:

PERIODO:

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CLAVE

EXT-59

CONCEPTO:

SELLADO DE BOQUILLA EN ADOQUIN CON SIKAFLEX 1A, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA
 LIMPIEZA DE BOQUILLA DE ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

154.76

ML

EXTAL



[Handwritten signature]

RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016
CALLE: CALLE ALDAMA
TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-60	RENIVELACION DE SALIDA METALICA DE AGUA PLUVIAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00 PZA

EXTRAS

BLVD. DIAZ ORDAZ	C. 10a.	CALLE ALDAMA	C. 12a.	AVE. OCAMPO

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS


TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
COLONIA: HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
CALLE: CALLE ALDAMA
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 18/08/2016 AL 31/08/2016
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-60	RENIVELACION DE SALIDA METALICA DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00 PZA





RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS
 PERIODO: 18/08/2016 AL 31/08/2016
 No. CONTRATO: 001/2016
 No. ESTIMACION: 8

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

CALLE:
 TRAMO:

CALLE ALDAMA

ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE

EXT-61

CONCEPTO :


RENIVELACION DE REGISTRO DE CABLE DE 60 X 60, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

12.00 PZA


EXTRAS

6.00 L LUZ (CFE) 1.00 T TELMEX
 5.00 C CABLE





BLVD. DIAZ ORDAZ

C. 10a.




CALLE ALDAMA

C. 12a.



AVE. OCAMPO



RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGRNERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO,CALLE ALDAMA,TRAMO:BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ,TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
 HERODES,TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL CENTRO
COLONIA: CALLE ALDAMA
CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPITO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPITO
EXT-61	RENIVELACION DE REGISTRO DE CABLE DE 60 X 60, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	12.00 PZA

ENTRA



RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. ; Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8


CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-62	CONEXIÓN DE TUBERÍA DE 1" A TUBERÍA DE 2" DE PVC RD-26 PARA RIEGO CON TEE VALVULA Y CAJA DE VALVULAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	2.00 — PZA

EXTRAS

	CANTIDAD
1	1.00
2	1.00
	2.00



BLVD. DIAZ ORDAZ

C. 10a.




CALLE ALDAMA

C. 12a.



AVE. OCAMPO



[Handwritten signature]

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUENAS


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
 COLOMIA: CALLE ALDAMA
 CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAMPO (LADO DERECHO)
 No. CONTRATO: 001/2016
 No. ESTIMACION: 8
 31 DE AGOSTO DE 2016
 16/08/2016 AL 31/08/2016

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-62	CONEXIÓN DE TUBERIA DE 1" A TUBERIA DE 2" DE PVC RD-26 PARA RIEGO CON TEE, VALVULA Y CAJA DE VALVULAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	2.00 PZA

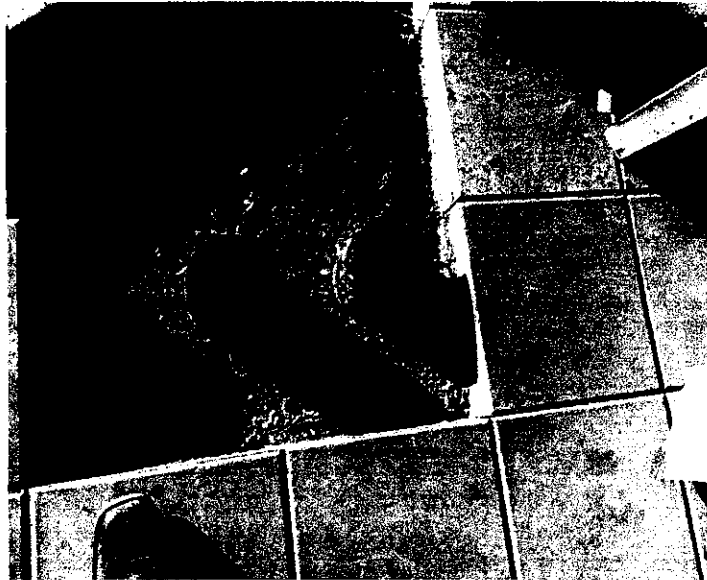

[Handwritten signature]

RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

[Handwritten signature]

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE CV

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14 a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA

TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CLAVE

EXT-64

CONCEPTO :


Pago de presupuesto de Telmex para reubicacion de infraestructura existente en calle Aldama.

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

1.00

PZA

EXTRAS



RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS


TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO: AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. Y AV., NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO
 COLOMIA: CALLE ALDAMA
 CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)
 No. CONTRATO: 001/2016
 No. ESTIMACION: 8

31 DE AGOSTO DE 2016
 18/08/2016 AL 31/08/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-64	Pago de presupuesto de Telmex para reubicacion de infraestructura existente en calle Aldama.	1.00 PZA



[Handwritten signature]

RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

[Handwritten signature]

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS
HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO: 16/08/2016 AL 31/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CALLE: CALLE ALDAMA


TRAMO: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO (LADO DERECHO)

CONCEPTO :

Pago Complementario de la reubicacion de lineas de Telmex.

CLAVE	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-70	1.00 PZA

EXTRAS

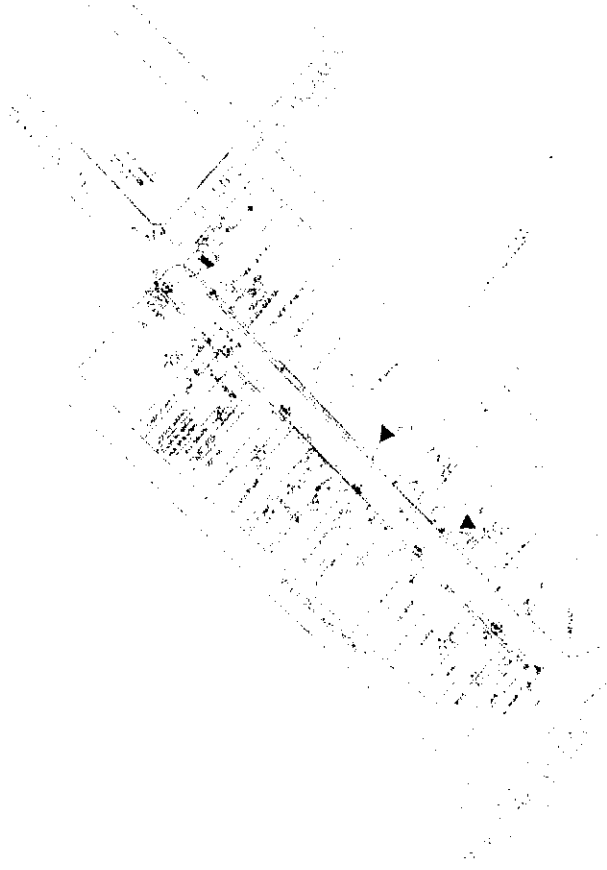

[Signature]

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

[Signature]


TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS


TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A
 CALLE VICENTE GUERRERO: AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV., NIÑOS
 HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL CENTRO
COLONIA: CALLE ALDAMA
CALLE: ENTRE BLV. DIAZ ORDAZ A AV. OCAMPO (LADO DERECHO)
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 18/08/2016 AL 31/08/2016
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE EXT-70	CONCEPTO: Pago Complementario de la reubicacion de lineas de Telmex.	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 1.00	PZA
------------------------	---	--	------------




 RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


 TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 ING. SALVADOR COVARRUBIAS DUEÑAS

GENERADOR

TEPOTZACA CONSTRUCTORA S. A. DE CV

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a. Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

12 DE AGOSTO DE 2016

FECHA:

PERIODO: 8/08/2016 AL 12/08/2016

No. CONTRATO: 001/2016

CALLE: AVENIDA JUAREZ

TRAMO: DE BLVD. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO

No. ESTIMACION: 8

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

CONCEPTO:

Suministro de luminaria tipo IR-60HA 60 LEDS IRIDUM de alta potencia de 127 watt de acuerdo a ficha tecnica anexa, incluye: traslado de insumos a donde lo indique la dependencia

CLAVE
EXT-67

35.00 PZA

FIRMES Y RAMPAS
CALLE JUAREZ

BANQUETA SUR
UBICACIÓN

TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE OCAMPO

NO.

PIEZAS

35.00

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPOTZACA CONSTRUCTORA S. A. DE CV
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

TESTIGO FOTOGRAFICO


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BIV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BIV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO. FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 8/08/2016 AL 12/08/2016

CALLE AVENIDA JUAREZ
TRAMO: DE BLVD. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO

No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-67	Suministro de luminaria tipo IR-60HA 60 LEDS IRIDUM de alta potencia de 127 watt de acuerdo a ficha tecnica anexa, incluye: traslado de insumos a donde lo indique la dependencia	35.00 PZA



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 2ta., Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

12 DE AGOSTO DE 2016

FECHA:

PERIODO: 8/08/2016 AL 12/08/2016

CALLE: AVENIDA JUAREZ

TRAMO: DE BLVD. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT-68	Retiro de instalaciones existentes en banquetas propiedad de Telefonos de Mexico, en el tramo de Blvd. Diaz Ordaz a Ave. Ocampo banqueta sur	1.00	PZA

FIRMES Y RAMPAS

CALLE JUAREZ

BANQUETA SUR

UBICACIÓN

TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE OCAMPO

NO.

PIEZAS

1 PIEZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

TESTIGO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BIV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUAREZ, TRAMO: BIV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a. Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO. FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO: 8/08/2016 AL 12/08/2018

CALLE: AVENIDA JUAREZ
TRAMO: DE BLVD. DIAZ ORDAZ A AVE. OCAMPO

No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 8

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-68	Retiro de instalaciones existentes en banquetas propiedad de Telefonos de Mexico, en el tramo de Blvd. Diaz Ordaz a Ave. Ocampo banqueta sur	1.00 PZA

PHOTOTEST



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

TEMPERACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTENT.

Con relación a su escrito S/N de fecha 23 de agosto de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE 21A; Y AV. NIÑOS MENDES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO", que al amparo del contrato No. 001/2016, ejecuta su representación; al respecto me permito comunicar que los trabajos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
ITEM 80: Muro de Telmex para reubicación de infraestructura Muelle, en calle Aldama. ITEM 80: Muestro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm2 con - Chisame fraguamex en pavimento y encofrado de tuberías en cruces de calle. Incluye: colocación de cinta de precaución, colado, vibrado, alibora, cortes, calafateo, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 231,829.04
	2	M3	\$ 3,515.33

IMPORTE MAXIMO AUTORIZADO \$ 238,859.70 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

00-178 Antonio Pérez Blanco - Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
00-179 Efraim Villarreal Alemán - Jefe del Departamento de Construcción
00-180 Raúl Arturo López Ríos - Residente de Obra

02/07/2008

Computador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(514) 209-48-00

[illegible]

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-3783/2016

30 de agosto de 2016

ING. JOSÉ CARRASCO GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 23 de agosto de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE 21A; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO", que al amparo del contrato No. 001/2016, ejecuta su representación; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.66	Suministro de poste cónico circular de 6.00 m de altura de acuerdo a proyecto, incluye: traslado de insumos a donde lo indique la Dependencia.	90	pza	\$ 2,263.59
EXT.67	Suministro de luminaria tipo IR-60HA 60 LEDS IRIDUM de alta potencia de 127 watt de acuerdo a ficha técnica anexa, incluye: traslado de insumos a donde lo indique la Dependencia.	90	pza	\$ 22,662.55
EXT.68	Retiro de instalaciones existentes en banquetas propiedad de Teléfonos de México, en el tramo de Blvd. Díaz Ordaz a Ave. Ocampo banqueta Sur (Ave. Juárez)	1	pza	\$ 128,065.44
EXT.69	Retiro de instalaciones existentes en banquetas propiedad de Teléfonos de México, en el tramo de Blvd. Díaz Ordaz a Ave. Ocampo banqueta Norte (Ave. Aldama)	2	pza	NO PROCEDE

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 2'371,418.04 SIN IVA

A T E N T A M E N T E

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C. p. - Ing. Xóchitl Pérez Blanco - Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
C. p. - Ing. Enrique Villarreal Alaman - Jefe del Departamento de Construcción
C. p. - Arq. Jorge Palacios Ceballos/ Ing. Glorina Martínez Rodríguez - Residentes de Obra
RDRA/XPB/EV/A/gcn

Comunidades 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Compañía Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUYENDO
EL FUTURO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-3763/2016

29 de agosto de 2016

ING. JOSÉ CARRASCO GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 23 de agosto de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A.; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO", que al amparo del contrato No. 007/2016, ejecuta su representación; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT 64	Pago de presupuesto de Telmex para reubicación de infraestructura existente, en calle Aldama.	1	pza	\$ 231,829.04
EXT 65	Suministro y colocación de concreto hidráulico $f_c = 300 \text{ kg/cm}^2$ con acelerante fraguamax en pavimento y encofrado de tuberías en cruces de calle. Incluye: colocación de cinta de precaución, colado, vibrado, cimbra, cortes, calafateo, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	M3	\$ 3,515.33

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 238,859.70 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Cop.- Ing. Rocío Pérez Blanco -Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
Cop.- Ing. Enrique Villareal Aleman -Jefe del Departamento de Construcción
Cop.- Ing. Luis Arturo López Ríos -Residente de Obra
C.C.P. -Arq. -

ROBA/XP/BB/EA/Arq.

Computador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

Centro de
Asesoría y
Asesoría No. 1108
Calle Compuera Nueva
C.P. 61410
Chihuahua, Chih. Mex.

www.teporacaconstructora.com.mx



"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-3783/2016

30 de agosto de 2016

ING. JOSÉ CARRASCO GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 23 de agosto de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDÁZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDÁZ A CALLE 21A.; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO", que al amparo del contrato No. 001/2016, ejecuta su representación; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
-----	----------	------	-----	-------------------

EXT.66	Suministro de poste cónico circular de 6.00 m de altura de acuerdo a proyecto, incluye: traslado de insumos a donde lo indique la Dependencia.	90	pza	\$ 2,263.59
EXT.67	Suministro de luminaria tipo IR-60HA 60 LEDS IRIDUM de alta potencia de 127 watt de acuerdo a ficha técnica anexa, incluye: traslado de insumos a donde lo indique la Dependencia.	90	pza	\$ 22,662.55
EXT.68	Retiro de instalaciones existentes en banquetas propiedad de Telefonos de México, en el tramo de Blvd. Diaz Ordaz a Ave. Ocampo banqueta Sur (Ave. Juárez)	1	pza	\$ 128,065.44
EXT.69	Retiro de instalaciones existentes en banquetas propiedad de Telefonos de México, en el tramo de Blvd. Diaz Ordaz a Ave. Ocampo banqueta Norte (Ave. Aldama)	2	pza	NO PROCEDE

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 2'371,418.04 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.P.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
C.P.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.P.-Arq. Jorge Palacios Ceballos/ Ing. Gloria Martínez Rodríguez.- Residentes de Obra
C.P.- Archivo
RDRA/XPB/EV/A/gcn"

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Campesino Nueva
Chihuahua, Chih. Mex.
C.P. 31410
www.mpiochihuahua.gob.mx

Computador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00



"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-3851/2016
05 de septiembre de 2016

ING. JOSÉ CARRASCO GOMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 01 de septiembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: "REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDÁZ A CALLE 21A; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO", que al amparo del contrato No. 001/2016, ejecuta su representación; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT. 70	Pago Complementario de la reubicación de líneas de Telmex.	1	pza	\$ 37,092.65

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 37,092.65 SIN IVA

A T E N T A M E N T E

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco -Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura
C.c.p.- Ing. Enrique Villareal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.- Arq. Jorge Palacios Ceballos/ Ing. Gloria Martínez Rodríguez -Residentes de Obra
C.c.p.- Archivo

RDR/AXP/2:EV/Agon

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Campestre Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.
Comunidades 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Largo Distancia
(614) 200 48 00
www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO

TELEFONOS DE
MEXICO SAB DE CV

COMPROBANTE DE PAGO

FACTURA : GRA / 000053019

CORREO : TEPORACAB81@YAHD.COM.MX

FECHA: 01/09/2016 HORA: 01:50:09

CAJA : CATA037 SECUENCIA: 53

No.Empleado

Cajero

1008043 FRIAS BRITO EUNICE

Oficina: GRA

Saldo...: 37,440.70

Pago...: 37,440.70

Sal. Pte: 0.00

Pesos

CHD-M.N.

37440.70

BBV

0061898

Cambio:

\$0.00

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

PESOS 70/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago

Ud cuenta con 7 dias para descargar su
factura de telmex.com/facturatienda

Formato de Ingresos y Devoluciones

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



FECHA DE EMISIÓN

01 09 16
DÍA MES AÑO

TIPO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

RECUPERACION TRAB PTA EXTER

TIPO :

CANTIDAD A PAGAR

CANTIDAD A PAGAR (incluye IVA) : \$ 37,440.70

IMPORTE CON LETRA : (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS , 70 / 100 M.N.)

DATOS DEL PERSONAL QUE REALIZA LA FORMA

NOMBRE : GUADALUPE DELGADO ANCHONDO

TELÉFONO : 61442-18000

DATOS DE FACTURA

R.F.C. :

TCO810120DN4

NOMBRE :

TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV

DIRECCIÓN :

CARBONEL 3702

COLONIA :

SAN FELIPE IV ETAPA

CIUDAD :

CHIHUAHUA

C.P. :

31203

TELÉFONO :

61441-34545

C.U.R.P. :

59919210

POBLACIÓN / ESTADO :

CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN :

REHABILITACION Y REMODELACION DE BLVD DIAZ ORDAZ
Y AV VICENTE GUERRERO DE ESTA CD DE CHIHUAHUA
CHIH

Formato de Ingresos y Devoluciones

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FECHA DE EMISIÓN 12 08 16
DÍA MES AÑO

TIPO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

TIPO : RECUPERACION TRAB PTA EXTER

CANTIDAD A PAGAR

CANTIDAD A PAGAR (incluye IVA) : \$ 129,267.11

IMPORTE CON LETRA :

(CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS)
11 / 100 M.N.)

DATOS DEL PERSONAL QUE REALIZA LA FORMA

NOMBRE : GUADALUPE DELGADO ANCHONDO

TELÉFONO : 61442-18000

DATOS DE FACTURA

R.F.C. : TCO810120DN4

NOMBRE : TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV

DIRECCIÓN : CARBONEL 3702

COLONIA : SAN FELIPE IV ETAPA

CIUDAD : CHIHUAHUA

C.P. : 31203

TELÉFONO : 61441-34545

C.U.R.P. : 59919210

POBLACIÓN / ESTADO : CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN :

REHABILITACION Y REMODELACION DE CALLE ALDAMA Y
AV JUAREZ DE ESTA CD DE CHIHUAHUA, CHIH.

TELEFONOS DE
MEXICO SAB DE CV

COMPROBANTE DE PAGO

FACTURA : GRA / 000052790

CORREO : TEPORACAB1@YAHOO.COM.MX

FECHA: 12/08/2016 HORA: 01:17:41

CAJA : CAJA031 SECUENCIA: 30

No.Empleado

1008043 FRIAS BRITO EUNICE

Oficina: GRA

Saldo...: 129,267.11

Pago...: 129,267.11

Sal. Pte: 0.00

Pesos

CHD-M.N. 129267.11

BBV 0061749

Cambio: \$0.00

CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA

Y SIETE PESOS 11/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago

Ud cuenta con 7 dias para descargar su
factura de telmex.com/facturatienda

Formato de Ingresos y Devoluciones



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

FECHA DE EMISIÓN 22 08 16
DÍA MES AÑO

TIPO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

TIPO : RECUPERACION TRAB PTA EXTER

CANTIDAD A PAGAR

CANTIDAD A PAGAR (incluye IVA) : \$ 234,004.35

IMPORTE CON LETRA : (M.N.) DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS . 35 / 100

DATOS DEL PERSONAL QUE REALIZA LA FORMA

NOMBRE : GUADALUPE DELGADO ANCHONDO
TELÉFONO : 61442-18000

DATOS DE FACTURA

R.F.C. : TC0810120DN4
NOMBRE : TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV
DIRECCIÓN : CARBONEL 3702
COLONIA : SAN FELIPE IV ETAPA
CIUDAD : CHIHUAHUA
C.P. : 31203
TELÉFONO : 61441-34545
C.U.R.P. : 59919210
POBLACIÓN / ESTADO : CHIHUAHUA
DESCRIPCIÓN : REHABILITACION Y REMODELACION DE BLVD DIAZ ORDAZ
A VICENTE GUERRERO DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
CHIH

TELEFONOS DE
MEXICO SAB DE CV

COMPROBANTE DE PAGO

FACTURA : GRA / 000052890

CORREO : TEFORACAB1@YAHOO.COM.MX

FECHA: 22/08/2016 HORA: 01:09:14

CAT: CAT031 SECUENCIA: 33

No.Empleado Calero

1008043 FRIAS BRITO EUNICE

Oficina: GRA

Saldo...: 234,004.35

Pago...: 234,004.35

Sal. Pte: 0.00

Pesos Dolar

CHD-M.N. 234004.35

BBV 0061814

Cambio: \$0.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO PES
OS 35/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago

Ud cuenta con 7 días para descargar su
factura de telmex.com/facturatienda
