

TEPORACA CONSTRUCTORA

R.F.C. TCO-810120-DN4 REG. CNIC-22902
CARBONEL #3702 TELS. 413-45-45 Y 426-57-28 CHIHUAHUA, CHIH.

Factura

SERIE: CH
FOLIO: 575
FECHA: 27/10/2016
12:35:52

**Documento
Válido**

TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV

TCO810120DN4 CARBONEL No. 3702 SAN FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MEXICO

**Lugar de
Expedición:** CARBONEL 3702 , SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO


Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No. 14 (CATORCE) REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO, AVE. JUAREZ, TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A CALLE 21a; Y AVE. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A CALLE OCAMPO. CONTRATO No. 001/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$31,742.14 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$30,155.03 ===== SUBTOTAL(1) \$1,587.11 16 % I.V.A. \$253.94 ===== SUBTOTAL(2) \$1,841.05 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2 % C.M.I.C. \$63.48 0.2 % I.C.I.C. \$63.48 0.2 % D.I.F. \$63.48 ===== SUMA \$190.44 NETO A RECIBIR \$1,650.61	1,587.11	1,587.11

Importe con letra

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.

Método de Pago: Cheque nominativo 02
Cuenta de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	1,587.11
I.V.A.:	253.94
TOTAL:	1,841.05



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301206435
Folio fiscal:	61EFE9F6-1A08-4FBB-88BE-FAA7BA7AFB66
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 27 2016 - 13:35:55

UwY4i4Bsezoo5X6ecmdSoueTwigiiJzoGWrIs3BGkk7bmTTJUK/44CA+x7kjXlMsQ44aKf1LIVuee9+OzkmiUH
Kz9CjRuzdJp5pW2iOsoTdBo2g6Dt8niPU5wmhgTltvXr1EF01KTj+TKURTQcbrDEzaCXvnhTucauhGoyvBtsE=

RaigKjnHiallY5skv+LsX8lguVYEeBjbISigj7peOKYXtCPRvk+gVMVdMZ6P1+UAysN4oN15qWLMVnGs
+14nyNa1bL3G+b7+zE6p4iWXPBAp/ei/Z1jeG3K+pjHx+Kvkd//cXHtcgvplKDD9SsJENZ3re/abwnN5
/KGRPp1qXVE=

||1.0|61EFE9F6-1A08-4FBB-88BE-FAA7BA7AFB66|2016-10-27T13:35:55|UwY4i4Bsezoo5X6ec
mdSoueTwigiiJzoGWrIs3BGkk7bmTTJUK/44CA+x7kjXlMsQ44aKf1LIVuee9+OzkmiUHKz9CjRuzdJp
5pW2iOsoTdBo2g6Dt8niPU5wmhgTltvXr1EF01KTj+TKURTQcbrDEzaCXvnhTucauhGoyvBtsE=|0000
1000000202864883||

Handwritten signature and a large circular stamp or mark.



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen


Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
TC0810120DN4	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
61EFE9F6-1A08-4FBB-88BE-FAA7BA7AFB66	2016-10-27T12:35:52	2016-10-27T13:35:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,841.05	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No.	001/2016	CONTRATADOS
OBRA:	REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO	ESTIMACIÓN No.	14	\$ 45,883,130.80 CON IVA
UBICACIÓN	CHIHUAHUA CHIH.	PERÍODO EJEC.	01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2016	
CONTRATISTA:	TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	36,820.88 CON IVA
RFC	TCO810120DN4	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	12,254,562.40 CON IVA
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	12,291,383.28 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 1,744.60	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 1,221.22	
<u>EXTRAS</u>	\$ 28,776.32	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 31,742.14	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.		63.48
0.2% I.C.I.C.	\$	63.48
0.2% D.I.F.	\$	63.48
SUMA DESCUENTOS	\$	190.44
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	31,742.14
AMORT ANTICIPO	\$	30,155.03
SUB-TOTAL	\$	1,587.11
I.V.A.	\$	253.94
TOTAL	\$	1,841.05
(CON LETRA)		
(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 5/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	190.44
SALDO NETO A RECIBIR	\$	1,650.61

AUTORIZO ABO. JORGE PALACIOS CEBALLOS RESIDENTE D.O.P.M Vo. Bo. ING. KOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Vo. Bo. ING. RAMON B. RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	ELABORO TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. CONTRATISTA REVISO ING. ENRIQUE GUERRERO ALEMÁN JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
--	---

CHIHUAHUA, CHIH.,

02 DE OCTUBRE DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE:
(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100 M.N.)

\$ 1,650.61
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 14 CONTRATO No. 001/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$45,883,130.80
(CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 80/100 M.N.)
REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AVE. JUAREZ, TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A CALLE 21a; Y AVE. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A CALLE OPAMPO. COL. CENTRO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 31,742.14

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 30,155.03

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

SUBTOTAL \$ 1,587.11
IVA \$ 253.94
TOTAL \$ 1,841.05

C.M.I.C 0.2% 63.48
I.C.I.C. DEL 0.2% 63.48
D.I.F. 0.2% 63.48
SUMA 190.44

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

		CONTRATO	
IMPORTE CONTRATADO	\$	45,883,130.80	CON IVA
PRIMERA ASIGNACION	\$	4,840,000.00	CON IVA
SEGUNDA ASIGNACION	\$	21,043,130.80	CON IVA
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	12,254,562.40	CON IVA
ESTA ESTIMACION	\$	36,820.88	CON IVA
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	12,291,383.28	CON IVA
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$	-	CON IVA
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	\$	13,591,747.52	CON IVA
POR EJERCER	\$	33,591,747.52	CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

		CONTRATO	
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	13,764,939.24	CON IVA
PRIMERA ASIGNACION	\$	1,452,000.00	CON IVA
SEGUNDA ASIGNACION	\$	12,312,939.24	CON IVA
ACUMULADO ANTERIOR	\$	8,495,834.28	CON IVA
ESTA ESTIMACION	\$	34,979.83	CON IVA
ACUMULADO ACTUAL	\$	8,530,814.11	CON IVA
POR AMORTIZAR PRIMERA ASIGNACION	\$	-	CON IVA
POR AMORTIZAR SEGUNDA ASIGNACION	\$	5,234,125.13	CON IVA
POR AMORTIZAR	\$	5,234,125.13	CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2 % C.M.I.C	0.2 % I.C.I.C	0.2 % D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 21,128.57	\$ 21,128.57	\$ 21,128.57
ESTA ESTIMACION	\$ 63.48	\$ 63.48	\$ 63.48
ACUMULADO ACTUAL	\$ 21,192.05	\$ 21,192.05	\$ 21,192.05

R E C I B I M O S

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
TCOB 0120DN4

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21 a. ; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a A AV. OCAMPO, COL. CENTRO

UBICACIÓN CHIHUAHUA CHIH.

No. CONTRATO: 001/2016

ESTIMACIÓN No.

14

CONTRATISTA: TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V

PERÍODO: 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS

IMPORTE

NORMALES

1,744.60

- 3 REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA NIÑOS HEROES
3.7 SEÑALAMIENTO VIAL

1,744.60

1,744.60

EXCEDENTES

1,221.22

- 3 REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA NIÑOS HEROES
3.7 SEÑALAMIENTO VIAL

1,221.22

1,221.22

EXTRAS

28,776.32

- 3 REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA NIÑOS HEROES

28,776.32

SUBTOTAL

31,742.14

I.V.A.

5,078.74

TOTAL

36,820.88

POR EL CONTRATISTA

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA:

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V

ESTIMACIÓN No. 14
PERIODO: 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

1,744.60

3	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA NIÑOS HEROES							1,744.60
3.7	SEÑALAMIENTO VIAL							\$ 1,744.60
3.7.22	Suministro y aplicación de pintura tráfico para flecha de frente sobre pavimento (Blanco), de acuerdo a normas de la SCT.	pza	10.00	10.00	0.00	10.00	\$174.46	\$1,744.60

OBRA EXCEDENTE

1,221.22

3	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA NIÑOS HEROES							1,221.22
3.7	SEÑALAMIENTO VIAL							\$ 1,221.22
3.7.22	Suministro y aplicación de pintura tráfico para flecha de frente sobre pavimento (Blanco), de acuerdo a normas de la SCT.	pza	10.00	17.00	10.00	7.00	\$174.46	\$1,221.22

OBRA EXTRA

28,776.32

3	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA NIÑOS HEROES							28,776.32
EXT-87	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOGOTIPO DE BICICLETA DE 1.4X1.20 M. Y LA LEYENDA "SOLO" DE 1.80 X 1.20 M. A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO DE BICICLETAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	0.00	8.00	0.00	8.00	\$666.54	\$5,332.32
EXT-89	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA CON LA LEYENDA DE "PRIORIDAD" A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	PZA	0.00	5.00	0.00	5.00	\$4,688.80	\$23,444.00

POR EL CONTRATISTA

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARG. JORGE PALACIOS CEBALLOS

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CALLE: NIÑOS HEROES
TRAMO: ENTRE 14a Y AV OCAMPO

PERIODO:
No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
3.7.22	Suministro y aplicación de pintura tráfico para flecha de frente sobre pavimento (Blanco), de acuerdo a normas de la SCT.	17.00 PZA

SEÑALAMIENTO VIAL RESUMEN NIÑOS HEROES No.

UBICACIÓN	PIEZAS	TOTAL
AV OCAMPO A 10a	5.00	5.00
10a A MONTERDE	4.00	4.00
MONTERDE A 12 1/2	4.00	4.00
12 1/2 A 14a	4.00	4.00

TOTAL

17.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ.

JORGE PONDRO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

G E N E R A D O R

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016


PERIODO:

CALLE: NIÑOS HEROES
TRAMO: ENTRE 14a Y AV OCAMPO

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
3.7.22	Suministro y aplicación de pintura tráfico para flecha de frente sobre pavimento (Blanco), de acuerdo a normas de la SCT.	17.00 PZA

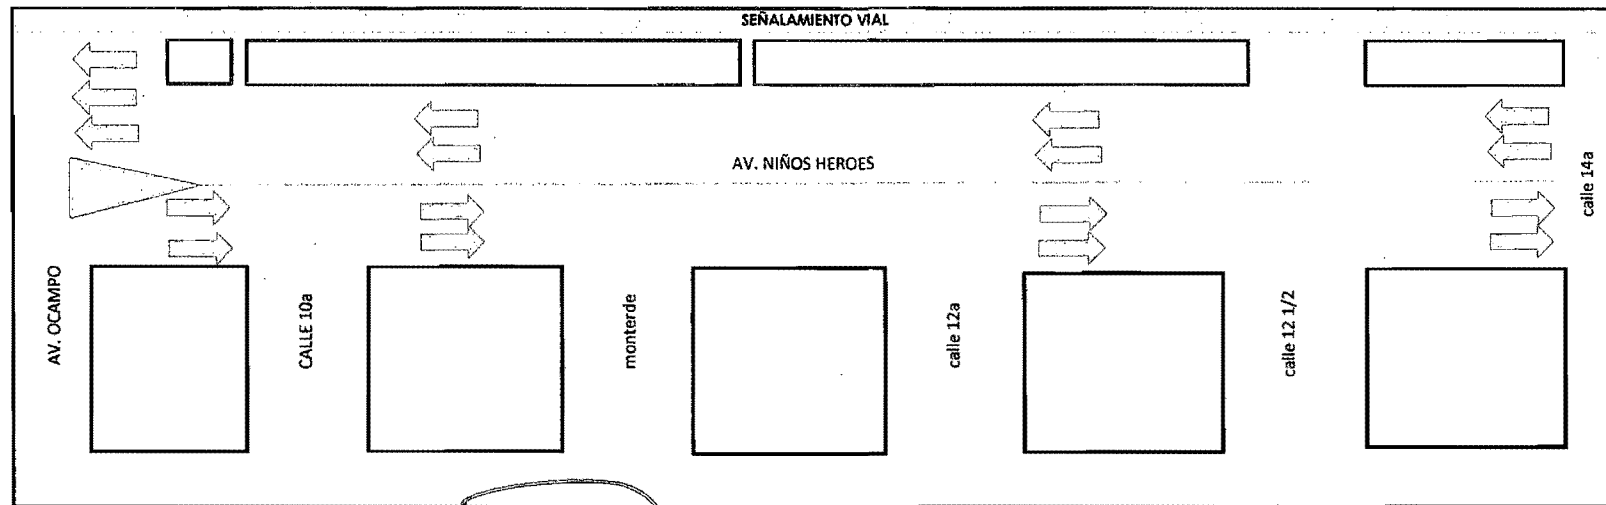

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

TESTIGO FOTOGRAFICO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PERIODO: 10/09/2016 AL 17/09/2016

CALLE: NIÑOS HEROES


No. CONTRATO: 001/2016

TRAMO: TRAMO DE CALLE 13 A CALLE 21 BANQUETA SUR

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
3.7.22	Suministro y aplicación de pintura tráfico para flecha de frente sobre pavimento (Blanco), de acuerdo a normas de la SCT.	17.00 PZA

SEÑALAMIENTO VIAL

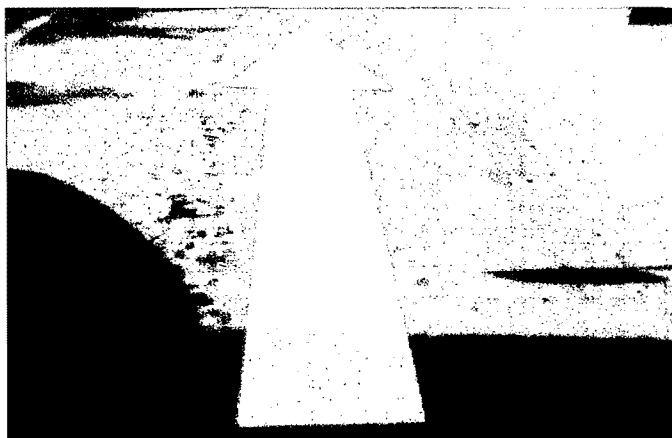

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V

ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

G E N E R A D O R

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CALLE: NIÑOS HEROES
TRAMO: ENTRE 14a Y AV OCAMPO

PERIODO:
No. CONTRATO: 001/2016
No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-87	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO DE BICICLETA DE 1.4X1.20 M. Y LA LEYENDA "SOLO" DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO DE BICICLETAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8.00 PZA

SEÑALAMIENTO VIAL RESUMEN NIÑOS HEROES		
UBICACIÓN	No. PIEZAS	TOTAL
LADO DEL PODER JUDICIAL DE JUSTICIA ENTRE OCAMPO Y 14a	8.00	8.00
TOTAL		8.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA

ARG. JORGE RODRIGOS

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

GENERADOR

TEFORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO: AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016


PERIODO:

CALLE: NIÑOS HEROES
TRAMO: ENTRE 14a Y AV OCAMPO

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-87	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO DE BICICLETA DE 1.4X1.20 M. Y LA LEYENDA "SOLO" DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO DE BICICLETAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8.00 PZA

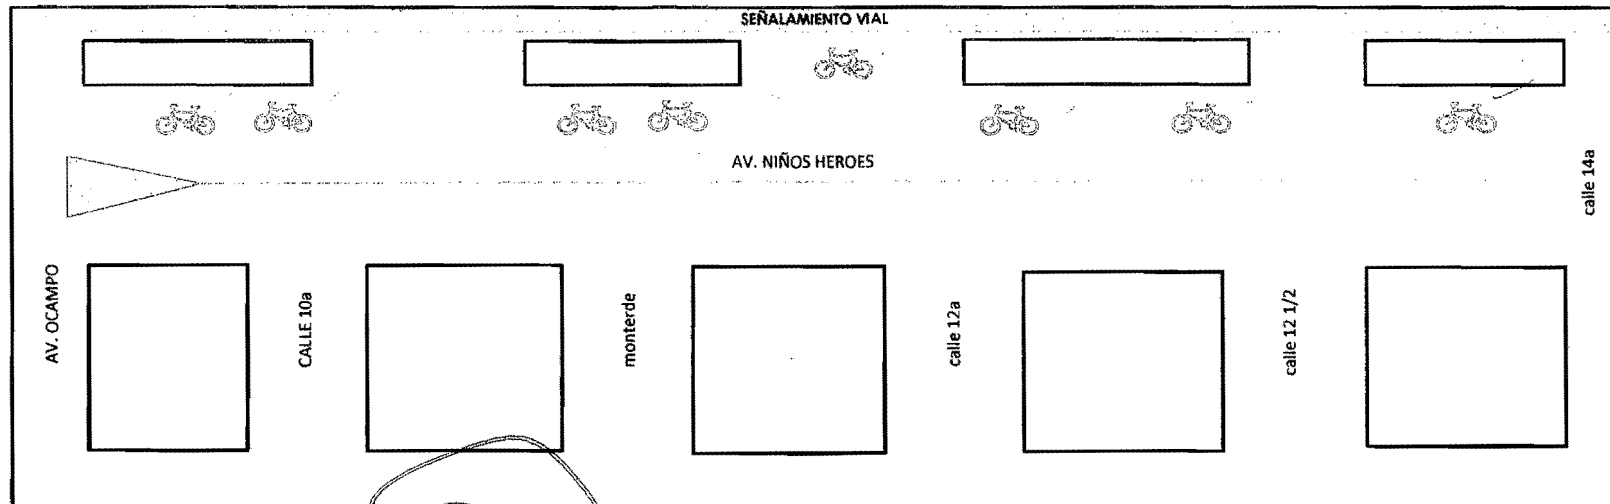

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEFORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

TESTIGO FOTOGRAFICO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PERIODO: 10/09/2016 AL 17/09/2016

CALLE: NIÑOS HEROES

No. CONTRATO: 001/2016

TRAMO: TRAMO DE CALLE 13 A CALLE 21 BANQUETA SUR

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-87	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO DE BICICLETA DE 1.4X1.20 M. Y LA LEYENDA "SOLO" DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO DE BICICLETAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8.00 PZA

SEÑALAMIENTO VIAL



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA/CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CALLE: NIÑOS HEROES
TRAMO: ENTRE 14a Y AV OCAMPO

PERIODO:
No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-89	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA CON LA LEYENDA DE "PRIORIDAD" A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	5.00 PZA

SEÑALAMIENTO VIAL RESUMEN NIÑOS HEROES No.

UBICACIÓN	PIEZAS	TOTAL
AV OCAMPO A 10a	1.00	1.00
10a A MONTERDE	1.00	1.00
MONTERDE A 12a	1.00	1.00
12a A 12 1/2	1.00	1.00
12 1/2 A 14a	1.00	1.00

TOTAL 5.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA

ARG. JOSE PEDROS

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A DE C.V
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

GENERADOR

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016


PERIODO:

CALLE: NIÑOS HEROES
TRAMO: ENTRE 14a Y AV OCAMPO

No. CONTRATO: 001/2016

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-89	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA CON LA LEYENDA DE "PRIORIDAD" A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	5.00 PZA

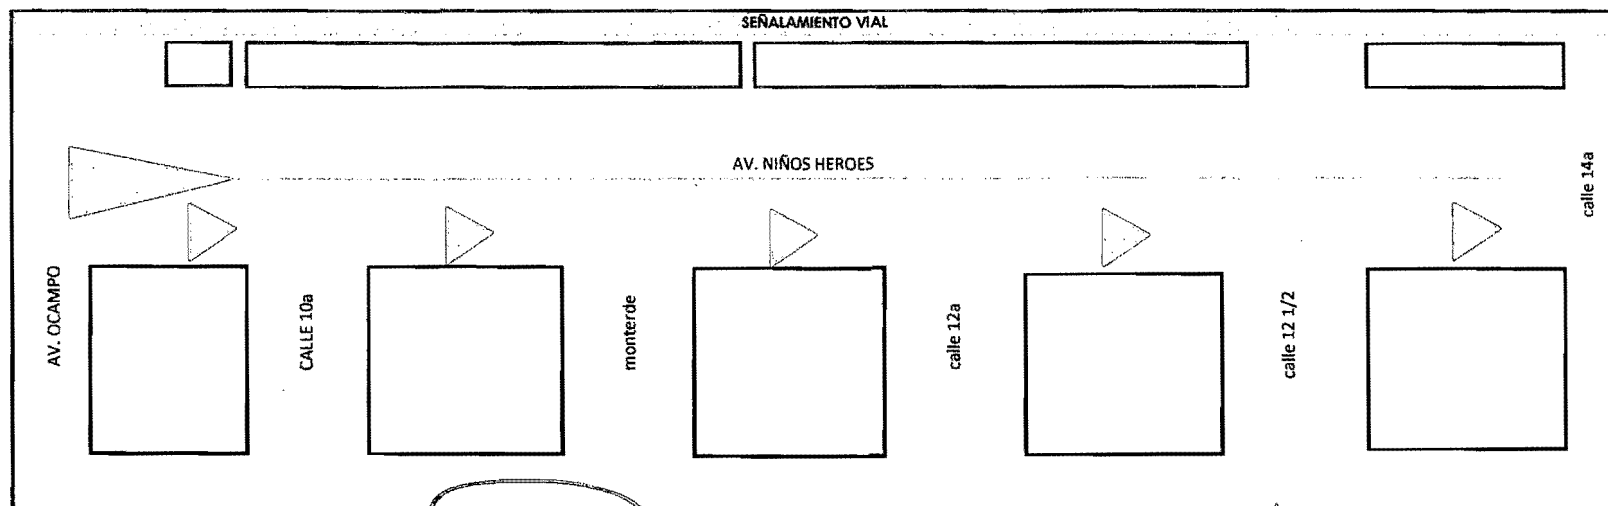

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.
ING. JESUS MANUEL CHAVEZ

TESTIGO FOTOGRAFICO

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUAREZ, TRAMO: BLV. DIAZ ORDAZ A CALLE 21a.; Y AV. NIÑOS HEROES, TRAMO: CALLE 14a. A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PERIODO: 10/09/2016 AL 17/09/2016

CALLE: NIÑOS HEROES


No. CONTRATO: 001/2016

TRAMO: TRAMO DE CALLE 13 A CALLE 21 BANQUETA SUR

No. ESTIMACION: 13

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-89	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOGOTIPO TRIANGULAR DE BICICLETA CON LA LEYENDA DE "PRIORIDAD" A BASE DE PINTURA TRAFICO SOBRE AREA DE RODAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	5.00 PZA

SEÑALAMIENTO VIAL

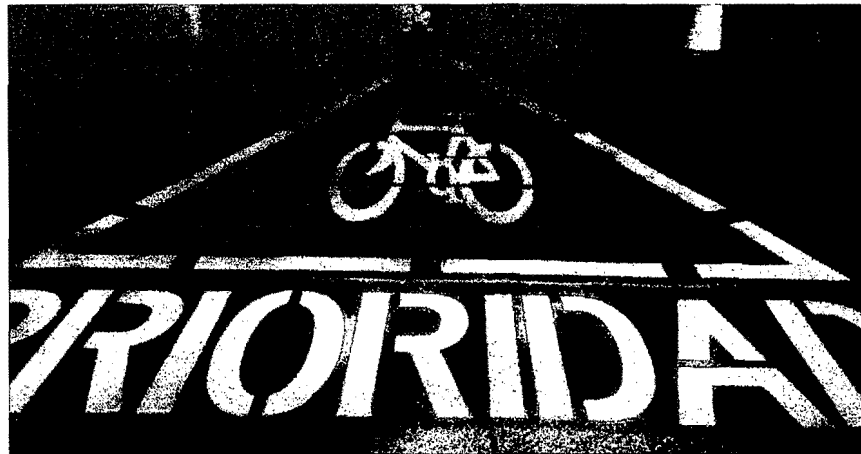

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TEPORACA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.

ING. JESUS MANUEL CHAVEZ



ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 001/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. INGENIEROS XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, PARA HACER CONSTAR LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001/2016, CONSISTENTE EN: REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A.; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO, POR CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR.

En Chihuahua, Chih., siendo las 14:00 horas del día 30 de septiembre del 2016, el suscrito Director de Obras Públicas y Mantenimiento, asistido por la Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura y el Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Obra Pública e Infraestructura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 ultimo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza la reprogramación del plazo de ejecución por motivo de caso fortuito o causa de fuerza mayor, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 08 de febrero de 2016, se celebró con la empresa: **TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 001/2016, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: **REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A.; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO**, por un monto de \$ **45'883,130.80** (cuarenta y cinco millones ochocientos ochenta y tres mil ciento treinta pesos 80/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor - - - -

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales





**ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 001/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR**

Agregado, con una primera asignación de \$4'840,000.00 (cuatro millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), estableciéndose un plazo de ejecución de 180 días naturales, en el periodo comprendido del 15 de febrero al 12 de agosto del 2016, pactándose un anticipo del 30%, para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

II.- Con fecha 12 de agosto de 2016, se emite acuerdo de diferimiento del plazo de ejecución por entrega tardía del monto anticipo, quedando como plazo de ejecución de la obra el comprendido del 14 de marzo de 2016 y 09 de septiembre de 2016.

III.- Con fecha 09 de septiembre de 2016, se emite acuerdo de reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor, quedando como plazo de ejecución de la obra el comprendido del 14 de marzo al 30 de septiembre de 2016

IV.- Mediante escrito S/N de fecha 27 de septiembre del año en curso, el contratista solicita una prórroga para la conclusión de los trabajos, en virtud de que se le han presentado lluvias extraordinarias que han impedido la ejecución de los trabajos, situación que se plasma en la Nota de Bitácora No. 101 de fecha 27 de septiembre de 2016. Por lo que se consideran 5 días naturales no imputables al contratista.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se reprograma el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 001/2016, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 14 de marzo de 2016 y 05 de octubre de 2016, respectivamente.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

www.mpiochihuahua.gob.mx






ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 001/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

SEGUNDO.- Notifíquese a: **TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

LA SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001/2016, RELATIVO A: REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DÍAZ ORDAZ A CALLE 21A.; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

www.mpiochihuahua.gob.mx
