

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA
RESIDENTE CONTRATISTA.

CONTRATISTAS

TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LIBRO 2.

REMODELACIÓN DE
CALLE SUAREZ.

TRAMO1: BND. DIAZ ORDAZ A C. OCAÑO.

TRAMO2: C. 13 a C. 21 Ambos lados.

Nota No 79, 21 Mayo 2016 Viernes.

Se le indica al contratista que los adoquines que se colocaron en la cafetería de banqueta sur del Tramo C. 10 a C. Ocampo se deberá colocar al Mortero Cemento-arena un impermeabilizante para evitar las filtraciones al sótano, así como se deberán de retirar las tapas metálicas existentes y colocar tapas nuevas de acuerdo a la Orden de campo entregada.

En el sótano existente. Ubicado También en este Tramo a la altura del Negocio de Soberos se colocará una losa de concreto armado a solicitud del arrendatario y en común acuerdo con el dueño del local. Esta se realizará de acuerdo a lo indicado en la Orden de campo entregada.

017

017

Nota No. 80 23 mayo 2016 Lunes

Hasta el día de hoy se reinició la colocación de adoquín y se surtió el adoquín Negro.

Se le indica la Reinstalación de un registro de CFE ubicado entre C. 14 y Calle 19

017

017

Nota. No. 81 24 mayo 2016 Martes.

Se asienta en esta Nota que en el Tramo de C. 10 a C. Ocampo se dejaron Tomas a Freno en las Tomas existentes con tubo Plus de 1/2" de diámetro.

017

017

Nota No. 82 25 mayo 2016

Se entregaron ordones de campo para se presenten los precios unitarios correspondientes a:


- 1.- concreto $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ acabado Granzón Lavado a Entradas a Cocheras Este sin colorante, debido a que se le dio la indicación que se colocara sin colorante y sin fibra.
- 2.- Tapones Foto 4" para Registros sanitarios
- 3.- Sondeos para localizar instalaciones existentes de Junta de aguas, Comisión Federal de Electricidad, Telmex, Fibra Optica, instalaciones de cables mas.
- 4.- Tomas a Totero con Tubo plus 1/2" con tapones a extremos
- 5.- Impermeabilizante en losa de sótano de cafetería.
- 6.- Colocación de adoquin color gris claro y gris oscuro con Impermeabilizante integrado en el Mortero.

117

[Signature]

Nota No. 83 26 mayo Jueves.

Se le indica al Residente que la Zanja localizada al costado de Guarnición la cual se hizo para cubrir Guarnición se rellenara con Mortero Fluidizante y carpeta asfáltica respectiva. Se rellenaran 7 cms con mortero fluidizante y 5 cms. con Carpeta asfáltica.



se solicita Presentar Precios Unitarios de acuerdo a lo indicado a lo orden de Campo.

117

[Signature]

Nota. No 84 27 mayo 2016 27,

Se coloca Mortero Fluidizante en Zanja de Blvd. Diaz Ordaz AC 14, de 0.14 a 12 Se hizo una caja de valvulas para tuberías de Junta de aguas en esquina con calle 12 con tapa metálica

En este cruce se colocó también en Tuberías de agua Potable. 1 Tapa Junta de 2" de diametro.

- 1 reducción de 3" a 2" Bridadura.

2 Juntas yugol de 2" Para Pad.

deberá presentar los precios extras correa pendiente de acuerdo a las ordenes de campo.

17

[Signature]

Nota. NO 86 30 mayo 2016 Lunes.

Se demolicion banquetas existentes de la C. 13 a C. 15 Banqueta Norte.

* se Entregó con fecha del día 26 de mayo de 2016 el Proyecto Arquitectónico u de señalamiento Vertical y en Pavimento, así como de ubicación de mobiliario urbano de C. 13 a C. 19 y de C. 19 a C. 21 Tanto de Banquetas Norte como banquetas sur.

18

[Signature]

Nota No. 87 31. mayo 2016 Martes

al día de hoy se tienen Trabajos Pendientes por ejecutar y Rezagados del Tramo del Blvd. Diaz Ordaz a Calle Ocampo debido tanto a Faltas de Trabajo como a Suministro de materiales; No se han colocado postes,

Continúa Nota No. 87 31 mayo 2016.
y lamparas de alumbrado, mobiliario urbano,
se tienen banquetas acabadas granito lavado
Por color de Calle 10 a C. Ocampo.




Nota No. 88 31 mayo 2016.

Se tubo reunión con el Jefe de Mantenimiento
de Gobierno del Estado para ver el detalle
del colado de la banqueta al acuso de co-
chera del Registro Civil.

Se llego al siguiente acuerdo el cual se
le indicó al Residente:

la rampa se demolerá el mismo día que
se vaya a colar dejando el mismo nivel
existente.

También se le indicó que a Proridad
el colado de la Guarnición a la mayor brevedad
posible, para el colado de la plantilla
en area a un costado del Registro Civil
Para evitar filtraciones con agua de lluvia
hacia el sotano.

* se le solicita colocar a la mayor
brevedad posible el señalamiento preven-
tivo de obra que consiste en colocación
de malla naranja delimitando el area
de construcción, se le indica También
colocar 2 Señalamientos de Disculpe las
Molestas uno en la calle 15 y el otro
en la calle 13, se le solicita También
contar en el Tramo con cinta amarilla de
Protección y Tambos amarillos para
donde se requiera.





Nota No. 89 1º JUNIO 2016

Se traza para colado de Guarnición de Calle 13 a C. 15. de molliendose este día la Carpa asfáltica existente correspondiente con sus respectivos cortes.

Y se hacen sondeos para localización de tubería de agua potable existente.

Al día de hoy no se ha colocado por parte del residente el señalamiento preventivo de obra que se le solicita





Nota No. 90 2 JUNIO 2016 Jueves.

Al hacer los sondeos para la Localización de la Tubería de agua Potable se vio que quedaría alojada abajo de la Guarnición Nueva, por lo que se llegó el acuerdo con El Ing. Puerta de Santa de Aguas que se colocará una tubería de PVC RD-26 de 2" de diámetro suministrada por esta de Pendencia Muma que se colocará en la calle afuera de la Guarnición y banqueta Nueva. la cual se colocará y conectará a la tubería PAB existente en esq. con calle 13 y EN esq. con C. 15.

* En este mismo día se corta carpa asfáltica y se demuele la muma para hacer zanja para alojar la Tubería de 2".





Nota. NO. 91 3 JUNIO Viernes.

Se le indicó al contratista la construcción de las Tomas Existentes de calle 13 a C. 15 banqueta sur con tubo plus de 1/2" de diametro y estas deberán ser conectadas con Valvula de inversión a la Tubería de 2" de diametro, Rb-26 que se colocará y además se colocará una Tapa TIPO Casa Pvc. en cada Toma.

* En Cuanto a los Trabajos correspondiente a Junta de aguas estos vienen a atrasar los trabajos que se tenían programados en este Tramo debido a la zanja que se va a ejecutar ya esperar que Junta de aguas suministre la Tubería.

Se Encontro Materia de muy mala calidad. En el área de desplante de la Guarnición Nueva. Por lo que se le indica al contratista colocar una capa de 15 cms de c/c de material calidad base la cual será compactada al 100% de su P.V.G.M.

* Previo al acuerdo con Junta de aguas ya se habrán colocado Tomas a Futuro. En dicho Tramo.

Hasta el día de hoy el Residente aún no ha colocado el señalamiento preventivo de obra. Solicitado.

-se dio la indicación de hacer la Zanja a mano para la colocación de Tubería de Pvc. de 2" hidraulica debido a que hay Tuberías de Telmex en el lugar.




Nota No. 92 4 Junio 2016.

Con estas fechas se hace colado de las cabezas de manzana con concreto acabado granito lavado de la calle decima.

Se coloca adoquin Fattante de C. 10 a calle Ocampo.

A solicitud del Sr. que vive al Fondo de la calle 14 se le indica al Residente demolicion 1 metro Linea de la banqueta y se coloca en ese lugar debido que argumenta que no puede salir con Ta Traipa.

Se cuenta En la obra solo con

4 Personas mas 1 colocador de Adoquin. Por lo que se le solicita que a la mayor brevedad posible Termine con los Trabajos Fattantes y detalles de C. Ocampo a Blvd.

Diaz O. da. como son:

- 1.- colocación de postes de Alumbrado y Lamparas
- 2.- colocación de Mobiliario Urbano
- 3.- colado de bases C. 10, C. 12, C. 14
- 4.- bacheo en zanja de 10 cm. en algunos Tramos.

5.- colado de Tramos de banqueta de Granito Lavado y colocación de Adoquin Ocampo a C. 10.

Los Cuatro Trabajadores estan Trabajando de C. 13 a C. 15.

Continuan suspendidos los Trabajos en banqueta Norte de C. 10 a C. Ocampo debido que no han Terminado con los demoliciones.

OM

Julian

Nota No. 93 6 Junio (Lun)

Se avienta en esta Nota que No hay Gente Trabajando en el Tramo de la C. 13 a la Calle 15 Sur.

Por

Julian

Nota No 94 6 Junio Cune,

Se impermeabiliza losa de sótano de cafetería a 2 manos Entre Tramo de C. 109 y C. 110 Ocampo No. Calle-Juarez No. 816.

Se hacen detalles de adosquin de C. 109 a C. 110 Ocampo y de C. 112 a C. 115 banquetas.

Secimbra para colado de Guarnición de C. 112

Se coloca y en la Tarde adosquin y guarnición en sótano de cafetería con impermeabilizante integrado al mortero a base de sílex latex.

— 4 Personas entre Maestros y Ayudante, y 1 topógrafo cuadrilla existente en la obra, lo cual no permite un avance considerable en los trabajos.

(11)

(11)

Nota No 95 7 Junio Matos.

Se llega el día de hoy al Tramo de la C. 13 a C. 15 banquetas Norte y no se localizan Cuadrillas Trabajando, se le solicita nuevamente al residente se programen los trabajos correspondientes en este Tramo.

Solo se trabaja el día de hoy con 4 albañiles de obra, llevándose a Medir día 2 personas para el Tramo de C. 13 a C. 15 y 2 personas se quedan en el Tramo de Blvd. Diaz Ordaz a C. Ocampo.

— se colocó el día de hoy tubería de 2" de diámetro proporcionada por Junta de aguas.

— se colocó carpeta asfáltica en zona de 10 cms ancho en Tramo de Blvd. Diaz Ordaz a C. Ocampo.

(11)

(11)

NOTA. NO. 468 JUNIO 2016 MIÉRCOLES

Se le indica que para el bacheo de zanjas en cruces de calle y zanjas para agua potable, alumbrado y sistema de riego se colocará una capa de 15 a 20 cms. de Manta calidad Base compactada al 100% de su P_{15m} y se colocarán 5 cms. de espesor de carpeta asfáltica.

En Tramo de Blvd. DIAZ Ordaz a Ave. Ocampo solo andan Trabajando 2 Personas con la limpieza de las banquetas Gran zona Lavado de C. 149C.12.

* se le indicó al Residente Sacar el material producto de la excavación y demolición que está localizado Entre C. 13 y C. 15 Fuera de la obra.

A MEDIA MANANA se llevaron 2 Gentes al Tramo de C. 13 a C. 15 para continuar con la instalación de tubería.

* se hacen sondeos en C. 13 y C. 15 para localización de tubo, PAD de agua potable y sondeos para localizar las conexiones de las tomas existentes al tubo de PAD.

* se hizo la Programación Conjunta de agua con la cuadrilla para hacer las conexiones de las puntas del PVC al PAD de calle 13 y C. 15.

Banqueta Sur.

-aun No se ha Terminado de colocar adoquín de C. 10 a Calle Ocampo.

CH

[Signature]

Nota No. 97 9 JUNIO 2016 Jueves
Personal de Junta de Aguas hizo la conexión
Entre calle 13 y calles. En este Tramo
Solo andan Trabajando 2 Personas:

1 Plomero

1 operador de retroexcavadora.

El día de hoy se cito en el Tramo de C. 13
alacris al Ing. Eloy de Parques y Jardines el
cual nos indico el punto de conexión de las
Tuberías del sistema de riego en Plaza

Ubicada Entre C. 15 a C. 17 se conectarán a la
Tubería ya existente con una TEE de 2"
y una válvula de control.

Se le indico al Residente la colocación de
Tubería RP-26 de 2" y 1" de diametro para el
riego de los arboles Entre C. 13 y C. 15.

El Ing. Eloy de Parques y Jardines Argumento
que no era Necesario colocar bombeo para los
arboles que se van a colocar de la C. 13 a C.
21 lado Norte y lado Sur. También indico co-
locar una salida de 2" a 1" en cada arbol
con una válvula de esfera en cada uno.

El Plomero solo hizo 2 tomas el día de hoy
- se coloca botella de arena de C. 14 a C. 12
de C. 12 a C. 10 y de C. 10 a C. Ocampo en
Areas de adoquin

CM

Plomero

Nota No. 98 10 JUNIO 2016 Viernes

Solo hay 2 plomeros Trabajando en Tramo de
C. 13 a C. 15 y el operador de retroexcavadora.

Se continua con sondos debido a que no se ha
localizado tubo que alimentan las Tomas (2 Pzall)

No hay adoquines en la obra.

CM

Plomero

NOTA 99 10 JUNIO 2016

Se hace cruce de la Ave. Ocampo a Registro existente de Telmex con 3 Tubos Para local se le solicita Flecha de desviación electrónica para poder cerrar el canal así como Señalamiento Vertical Prevencivo.
- se demolió Carpetas, asfalto, se encontraron los 3 tubos con concreto, se rellenó la zanja con material calidad Base compactada.

[Signature]

[Signature]

Nota. No. 100 14 JUNIO 2016 Mates

- * Se hace entrega de Poste existente de Alumbrado Público Entre C. 13 y C. 15 (un costado del registro Civil al Sr. Alfonso Diego Guardia de Seguridad del Lugar).
- * En el Tramo de banquetas C. 13 y C. 15 sv. solo trabaja 1 operadora de VETRESCAVADORA, y 1 Person con la compactadora
1 Person con la cortadora.
- * se coloca, refina, compacta base para desplante de Guarnición de esp. 15 cm. C. 13 y C. 15
- * se compacta Mat. Base en Zanja donde se colocaron las tuberías del Riego y de Junta Aguas C. 13 y C. 15
- se le Encargan al Residente las siguientes Piezas especiales para las conexiones de C. 13 y C. 15. 3 Juntas Universales, 1 extremidad en P.A.D 2" (C. 13) y (C. 15) 3 Juntas Universales 2" y codo 90° Foto 2", 1 Junta Yugo 2"
- Presentar el Precio Unitario correspondiente de acuerdo a la Orden de campo.

[Signature]

[Signature]

Nota No. 107. 15 Junio 2016

Se le solicita al Residente se programe re-
por Laboratorio de calidad Para Todas las
Trabajos por ejecutar en el Tramo de C.13
ACIS Banqueta Sur y Norte. en lo que
corresponde A:

- 1.- colado de bases de Alumbrado
- 2.- colado de Guarniciones
- 3.- colado de plantillas
- 4.- colado de banquetas granzon lavado
- 5.- compactación de Terreno Natural
- 6.- compactación de Mortero calidad base
- 7.- compactación de Caliche en relleno.

del Tramo de Blvd. a C. Ocampo solo se
tendrá una persona trabajando en la coloca-
ción de Topones FOTO en tubos de Panga.

* se solicita nuevamente al Residente se
Terminen a la mayor brevedad posible
los Trabajos Pendientes por ejecutar en el
Tramo de Blvd Diaz Ordaz al C. Ocampo.

- 1.- colocación de postes de Alumbrado y
Lámparas
- 2.- colocación de mobiliario Urbano
- 3.- colocación de Señalamientos Verticales
- 4.- colocación de gabinetes eléctricos en poste
de concreto en calle 10

- 5.- Pintura en Guarniciones
- 6.- Pintura Separadora de Concretos
- 7.- Pintura en Curbos, Reotonales

8.- detalles de colado de banquetas de
Granitron lavado de C. 10 a C. Ocampo.

9.- colocación de Fachaleta en C. Juárez pro

10.- Curbos de Blvd. Diaz Ordaz Para instala-
ción de tubería de Telmex y cable.

11.- detalles, Guarniciones en esquinas de

* Faltan colocar 2 postes Tramo C.10 a C.11
Ocampo.

* 2 poste calle 10, 1 poste C.12 1 poste C.14

* Faltan colocar carpeta asfáltica de 20m x 12m a guarnición de C.10 a C.12.

* No se han renovado 2 Registros Tramo C.14 a C.12 1 de CFE, 1 de cables mas


* Faltan colocar 1 Registro C.3 de Telmex y 1 Reg. 60x60 para instalaciones cable en cabeza de manzana de BN Diaz Ordaz.

* Banqueta de Bachilleres 1 Registro C.3 y un Registro 60x60.

* se hizo llamado El día de hoy con Ingenieros de Telmex para revisar las instalaciones construidas solicitando que la tubería al interior del Registro deberá quedar a ras de lomo y de bida/o aplanado y tapar los hoyos y esta instrucción se le dio al Residente de obra.

* En el Tramo de la C.15 a C.13 se colocó guarnición.

PREVIO AL OCLADO, SE LE DIO LA INDICACIÓN QUE LA GUARNICIÓN DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE 13 A C.F. TANTO SUR COMO NORTE SE DEBERAN COLAR TRAPEZOIDALES CON LA SIGUIENTE SECCIÓN:



(117)

[Signature]

[Signature]

Nota. No. 102 17 Junio 2016

Se le indica al Nuevoal Residente que deberá quedar libre de escombros y material producto de excavaciones a diario el Tiemo en construcción, También se le solicita que después de la jornada laboral deberá de quedar debidamente colocado el Señalamiento correspondiente.

* se cimbra para colado de 4 bases de alumbrado de C. BACIS Sur.

(17)

(17)

Nota. No. 102 20 Junio 2016

Se compacta T.M. de C. BACIS Sur, se colocó caliche compactado para alcanzar el nivel de Proyecto, ya por la T.M. se tiró plantilla de 2cm de curvar con concreto F/c=100kg/cm

(17)

(17)

Nota. No 103 21 Junio 2016

Se de mueb Banqueta y adoquín de C. 159 C. 17 Sur area Parque con un espesor Promedio de 20cms.

* se hace registro sanitario de drenaje de C. BACIS registro Civil

El día de hoy no se colocó Adoquín de C. BACIS debido a falta de Albañil Colocador.

* se hizo entrega de 4 parquímetros al sr Victor Daniel Anchordo del Ichisat 2 del Tiemo entre C. BACIS 42 par entre C. 159 C. 17 sobre la calle Sur.

(17)

(17)

Nota No. 104 24 JUNIO 2016

* Se demuele carpeta asfáltica para cimbrio
guarnición de C. 15 a C. 17 SR.

En esta área se hace la excavación para
cimbrio de guarnición encontrando el mate-
rial muy sueto por lo que se le indica al
residente compactar el terreno natural.

* 17




Nota No. 105 25 JUNIO 2016

Se le indicó al Residente demoler la
banqueta de granzón lavado de Zochora de
Registre C. 1021 y Banqueta de esquina con
Calle 13 debido a que no cumplen con el
acabado.

El día de hoy se inicia la colocación del
adorn color gris claro de C. 13 a C. 15 SR.


* 17



Nota No. 106 27 JUNIO 2016

Se le solicita al Residente color todas
las Cuadros de banquetas de granzón la-
vado a la mayor brevedad posible del
Tramo de la C. Ocampo a C. 10 ya que
se tiene así este Tramo 2 semanas. Esto
está ocasionando molestias a los locatarios
y transeúntes.

* 17



Nota. No. 107 28 Junio 2016

C. 13 a C. 15 SUR.

- * se demolió banqueta mal acabada de entubado cochera del vecindario
- * Faltan color todos los detalles de concreto acabado granzon lavado.
- * colado de Guarnición C. 15 para rampa de discapacitados
- * Faltan veintitrés 2 registros existentes.
- *.

Tramo Blvd. Díaz Ordaz A Ocampo

- De Diada hoy están pintados la guarnición.
- * Faltan colocación de Postes y Lámparas
- * Pintura Guarnición C. 14, C. 10 y C. 12
- * colocación de Mobiliario Urbano

17

[Signature]

Nota. No. 108 29 Junio

Se continúa con la demolición de banqueta y guarnición de Calle Juárez entre Tramo C. 17 a C. 19 SUR. se le indicó que las demoliciones se hagan de Noche. se le solicita colocar el señalamiento preventivo de Obra del tramo C. 15 a C. 17 y de C. 17 a C. 19 delimitando la zona con cinta Amarilla.

Empleados de Ichibal se llevaron 2 Perquisímetros ubicados en banqueta de 17 a C. 19 SUR.

* se solicita que se haga el colado del concreto en acero ac. 14 el cual se hará con concreto M242.5

Se Tienen 6 Personas Trabajando de C. 13 a C. 14 Banqueta

NOTA NO 107 20 JULIO 2016

- Se cancelo el concreto Para colado de banquetas acabado Lavado por la lluvia.
- * Se reniveló registro existente Tramo de C. 10 a Ocampo
- * Se afinó y compacta Terreno Natural de C. 15 a C. 17 banquetas sur.

CM

CM

Nota No 110 1^{er} Julio 2016

- Se recibe concreto F/C- 200K/Lm Para colado de los de sotano Negros soliberos de calle Suarez Tramo C. 10 a C. Ocampo
- * Se instalan lamparas del BNO. Diaz Odras uC. 14 Sur y Norte

CM

CM

Nota. No 111 4 Julio 2016

- Se continua con la instalacion de lamparas Tramo C. 14 a C. 12 y de C. 12 a C. 12 banquetas sur.
- se hace excavacion Para instalacion de Tubo PVC 2" y 1" Para Sistema de riego C. 17 a C. 15 banquetas sur.

- * Del Tramo de la C. 17 a la C. 19 y Desu q. 4a se demolió banquetas y suavización no se trabaja Porque no tienen gente para esa cuadra y de la misma manera y situacion no se trabaja del BNO. Diaz Odras a C. Odras

CM

CM

NOTA: NOTIC 5 JULIO 2016

de la C. ISALACIT se hacen sondeos para localizar tubos de Telmex para hacer excavaciones para base de alumbrado, se vio que donde indica el Proyecto no es factible su ubicación por lo que se le indica al Residente la reubicación de misma Física.

* se cito al Ing Ruben Gaxia del Departamento de alumbrado publico para solicitar la autorización para el retiro de infraestructura existente Propiedad de ese departamento, entre C. ISALACIT a banqueta sur.

- 1.- retiro de 2 registros existente,
- 2.- retiro de 2 postes existentes con sus respectivas cámaras
- 3.- Retiro de Poliducto cable.

dando su autorización para ejecutar estos trabajos.

* tambien se le solicito la colocación de reflectores para alumbrar banqueta Norte. Para retirar 2 Postes ubicados entre C. 13 y 15 banqueta Norte. para empezar con la de moiciones.

* No se Trabajo el día de hoy de Nuevo en C. 17 a C. 19 Por Falta de disponibilidad de Trabajo.





El día de hoy solo se anda Trabajando
En banquetas de la C. 15 y la C. 17 Sur.
Se retiraron 2 postes con lamparas se demolicion
2 hacs.
* se hacen excavaciones para embudo y colado
de bacs.
* se le indicó al Residente retirar el Poliduto
electrico existente adentro de un vaguete
de telmex.
* se le solicita al Residente que a la
mayor brevedad posible se trabaje
de C. 17 a C. 19 Sur. debido a que se
tienen ya unas semanas sin ejecutar
ningun trabajo, a pesar que ya esta efectuando
la demolucion.

En el Tramo de Blvd Diaz Ordaz y C. Ocampo
Se Trabajo en Pintura separadores de
campos y Pintado de flechas en Pavimento,
Se coló banquetas acabados lavados de C. 10
a Calle Ocampo, se colocaron las Teras
Metlicas del sotano de cafetería No. 816
C. Suarez.

11

11

Nota. No. 114 7 Julio 2016

Se instala Poliduto electrico y cable de 10.5/1
Para alumbrado de C. 15 a C. 17 banquetas Sur.
* se hace corte y demolucion de Carpeta asfalta
ca existente de C. 17 a C. 19 banquetas Sur.
Se hacen sondeos para localizacion de tuberias
de C. 17 a C. 19 Sur.

11


11

No se anda Trabajando el día de hoy de C. 17 a C. 15 a C. 13 a C. 11 a C. 9 a C. 7 a C. 5 a C. 3 a C. 1 a C. 0. Ya que en esta ultima no se colo platillo. Solo Trabajan los eléctricos andan colocando registro electrico en esa con C. 15. y se le indico al Residente color la Guernica que quedo sin color en esa de Sur con campo.

Del Tramo de Blvd Diaz Vial AC, 15 se colo banqueta acabada granzon lavado en esa con cable campo.

El día de hoy se dejo de colocar lamparas debido a que ya no tienen en existencia solo estan colocadas 6 Pras.

(16)




Nota No. 116 9/07/2016

El día de hoy No se Trabaja en la Cuadra de la C. 17 a la calle 19 No tienen Cuadrilla para la ejecución de los Trabajos.

No se Esta Trabajando en C. 15 a C. 13 estan ambrados los bates para su colado y no se colaron el día de hoy.

y se demolio en la Noche la banqueta de C. 13 a C. 15 Norte.

(17)



Nota No. 117 11 Julio 2016

A este día ya están coladas las bases para alumbrado público de la C. 159 la C. 17 sur, estando el Tramo 4to para color plantilla y no se ejecuta este Tramo.

* Se compacta T.V para desplantar de iluminación de C. 17 a C. 19 SUR, No se han Trabajado las Bases hidráulicas y sanitarias de este Tramo debido a que no ha venido el plomero.

* Este día se Entrega el Trazo Modificado de la banqueta Tramo C. 13 a C. 15 Norte.

* Cuadrilleros día de hoy

Tramo C. 13 a C. 15 SUR 2 Trabajadores a Finando T.N.
C. Tramo C. 17 a C. 19 5 Trabajadores, 3 electricos y UN TOPÓGRAFO.

117




Nota No. 118

13 Julio 2016.

El día de hoy se convoca a reunión en Calle Juárez Tramo: de C. 13 a C. 21 Asistieron el Oficial de Viabilidad Israel Rodríguez, El Ing. Sergio Garza, Obras públicas El Ing. Edgar Arce, Obras Públicas Teferacca construtora la Ing. Obras Públicas Gloria Martínez, derivado de la Reunión Viabilidad solicito lo siguiente de lo cual esta enterado el Ing. Edgar Arce por parte de la constructora:

Se solicita se acordone un canal solo para tránsito seguro de los Prafones, debidamente con Tachos cinerizados y cinta amarilla, este canal se podría utilizar como canal momentáneo de carga y descarga de Material.

También se llegó al acuerdo de Cerrar la C. 17 SUR para almacenar Material de Materiales y de Huelos de Trabajo, se firmo el Acta presentada por Comandante de Viabilidad.




Nota No 119 18 Julio 2016

Se le indica al contratista Mediante Orden de Campo el colado del acceso a la calle C ATUCC SUR con concreto MK-H2.S. Es la Instrucción solicitada por medio de una Orden de Campo, el cual deberá tener 15cm de espesor y acabado rallado, este con acelerante.





Nota No 120 19 Julio 2016

Se hacen sondeos para localización de Tubería General de agua potable de la C. 17 a la C. 19 SUR. Para ver en que condiciones se encuentran, haciendo un sondeo en cada Toma, así como sondeo en una línea de cobre que salió en toda la longitud del Tramo.





Nota No 121 20 Julio 2016 Miércoles

Se le indica al Contratista que debido a que la Línea general del agua potable queda donde va a instalarse la Tubería eléctrica Por lo que se le solicita sacar hacia afuera de la Guarnición, la Junta de agua suministrara la Tubería de PVC y obra Públicas Por Medio del Contratista a Poyaná con la zanja y las Piezas especiales para las conexiones en esq. C. 17 y esq 19 al tubo existente de P.A.D.





Nota No. 122 21 Julio 2016

Se le indica al contratista dejar Tomas y Futuro con tubo plus de 1/2" un tubo ubicado de afuera de la guarnición hacia adentro del registro hidraulico con tapones en los extremos. Esto en las Tramos de C. 17 a C. 19 y C. 19 a C. 21 Banquetas sur y Banquetas Norte de C. 13 a C. 15, C. 15 a C. 17 de C. 17 a C. 19.

IM



Nota No. 123 22 Julio 2016 Viernes.

Se coloca tubería proporcionada por Junta de Aguas en Tramo C. 17 a C. 19 sur. Tapando este día la zanja con Base Tirturada Compactada.

Se afina y compacta T.N para colado de Plantilla Tramo C. 17 a C. 19 sur.


IM



Nota No. 124 23 Julio 2016

Se le autoriza al contratista demoler las Banquetas existentes de C. 19 a C. 21 Banqueta sur.


IM



Nota No. 125 25 Julio 2016


Se inicia con el colado de Adoquín de C. 17 a C. 19 Banqueta sur.






Nota. No. 126 26 Julio de 2016

A la Fecha No se ha Trabajado En los detalles que se van a ejecutar del Tramo de la C. Orampo a la calle Once. dentro de los cuales se contempla cambiar 10 postes y 10 lamparas existente, Por los que se cotizaron en este contrato.





Nota. No. 127 27 Julio 2016 Se demuele Banqueta Sur Tramo C. 19 a C. 21

El dia de hoy se Trabaja en colado de bases de C. 17 a C. 19 sur.





Nota. No. 128 4 agosto 2016

Se coló la entrada a la calle 14 a la calle Sur. con concreto f/c = MR-42.5 Ks/m² con acabado lavado.

Se colocan Postes Faltantes. 1 calle R/ 4 calle Jcares Tramo C. 13 a C. 15 2. C. 17 a C. 19 sur.

- Se continúa con la colocación de adoquín en Tramo C. 17 a C. 19 Banqueta sur.

Se le indica al residente colocar Base en desplante de Guarnición de C. 19 a C. 21

sur. Tal como se le solicitó en el Tramo de C. 13 a C. 15 y de Tramo 19 a C. 17 sur





Nota. No. 129. 5 agosto 2016

Trabajos Pendientes Por ejecutar.

Tramo de Ocampo a C. 11

No se ha ejecutado ningún Trabajo.

Tramo Blvd. Diaz Ordaz a C. Ocampo.

- 1.- Cruce sobre el Blvd. Diaz Ordaz
Para instalaciones de tuberías de Telcel
y cable, así como la colocación de registros.
- 2.- colado con hangeta acabado granito
Kaucho en cabeza manzana de Blvd.
Diaz Ordaz.
- 3.- Pintura en Cruces Peatonales
- 4.- instalación de Mobiliario Urbano
- 5.- Pintura en Guarnición, Bocacalles.
- 6.- Colocación de Fachabeta en vivienda
de C. Suarez No. 1400.
- 7.- suministro y colocación de lámparas
- 8.- " suministro y colocación de gabinete
eléctrico en C. 10 Para Alumbrado Público
de ese Tramo.
- 9.- colocación de árbol.

Tramo de C. 13 a C. 19.

Colocación de Lámparas y Mobiliario
Urbano además de árboles.

[Signature]

[Signature]

Nota. NO. 130 8 Agosto 2016.

Se asienta en esta Nota que debido a que Junta de aguas no ha suministrado la Tuberia para el agua potable de la calle 19 a la calle 21 no se han podido avanzar con los trabajos que se tienen programados en esa cuadra.

CM

Nota No. 131 9 Agosto 2016.

Se asienta en esta Nota que la obra tiene un atraso de un mes aproximadamente esto debido a la falta de Proyecto en primera instancia, Indefiniciones en el mismo, ademas de los cambios y adecuaciones que se han estado haciendo del Tramo de la C. 13 a la calle 21

Tanto en Banquetas sur como en las banquetas Norte.

— Otra de las situaciones por las que ha habido atraso es debido a las lluvias intensas que se han presentado mismas que han provocado la cancelación de los cobados, en algunas cuadras se presento aguachinamiento de C. 13 a C. 15 y de C. 15 a C. 17 banquetas sur. Esto en el area de desplante de guarniciones lo que genero trabajos adicionales como sacar el material aguachinado y colocar base compactada, la misma situacion se ha presentado en el veleno para banquetas el cual se ha tenido que sacar el material aguachinado y colocar material seco. Originado atraso en los trabajos programados.

Continúa Nota No 131 9 agosto 2013

- otra situación que ha provocado el atraso en los Trabajos Programados ha sido las instalaciones existentes de Líneas de PAB Propiedad de Junta de Aguas las cuales al hacer el Trazo nuevo quedaban abajo de la guarnición y/o en el área donde van los poliductos eléctricos, debido a esto se llegó al acuerdo de sacarlas Fuera de la banqueta de Proyecto en el área de la calle suministrando la tubería, la Junta de aguas y haciendo las conexiones en c/u de los extremos de la cuadra. Personal de esta dependencia, apoyando obras Públicas con la zanja, cama de arena y Reilonos, así como colocación de tuberías en zanja.

AUbo atrasos considerables debido a esta causa ya que Junta de Aguas estuvo tardando más de una Semana en los suministros y 3 Semanas para las conexiones de las puntas en los extremos.

Debido a estas Situaciones descritas la obra se considera que tiene un atraso de un mes en sus actividades diarias.




Nota. No. 132. 10 agosto 2016

Se hicieron Tomas con Tubo plus (hidráulicas) de calle 21 AC. 19 (Suarez) además se dejaron Tomas a Futuro en cada, Toma existente.

y se coló Guarnición de C. 19 AC. 21 SUR.

Junta de aguas no ha acudido a hacer las conexiones pendientes de C. 17 AC. 19 SUR y de C. 19 AC. 21 SUR.



Nota No. 133 12/ Agosto 2016.

Por acuerdo del Supervisor de Alumbrado Público el Ing. Heredia se le indica al Contratista que se podrá colocar la tubería del Riego en la misma zona del Alumbrado 30 cms. más abajo del poliducto eléctrico esto de la Calle 19 a la calle 21 sur.

✱ Junta de aguas hace una conexión del tubo de PVC. al tubo P.A.D. Energía. con calle 21 suministrando el Contratista todas las piezas especiales para este fin.


1.- codos FOF 2" y 3"

2.- Juntas Universales de 2" y 3"

3.- Tapa Juntas

4.- Juntas Yugal.

✱ Se le indica al contratista hacer el cruce de C. 21 hacia Parque para colocación de poliducto eléctrico y cableado debido a que cuando se quitaron los postes existentes de C 19 a C. 21 se quedaron las cuadras subsecuentes, sin Alumbrado, este trabajo se realizará de registro a registro.

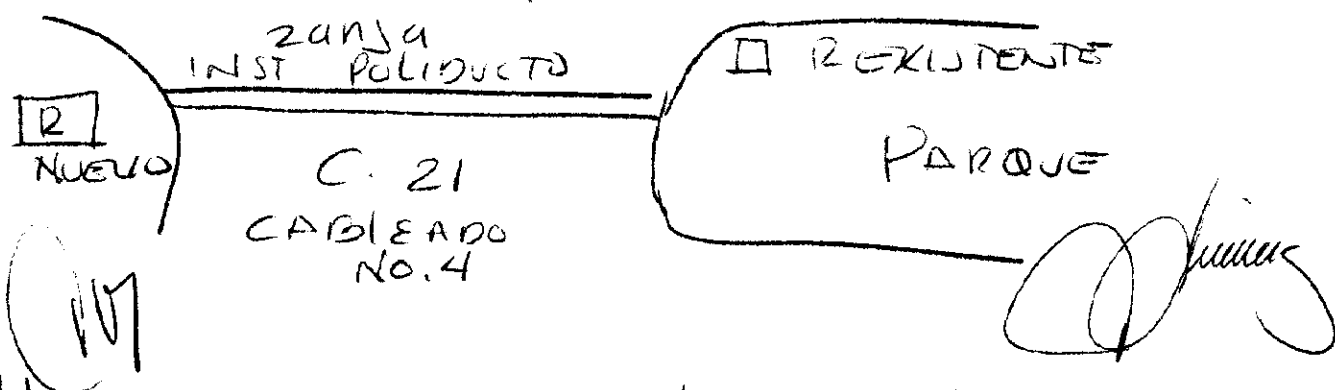

NOTA No. 134 12 / AGOSTO / 2016

CON ESTA FECHA SE LE ESTÁ AUTORIZANDO AL CONTRATISTA. POR MEDIO DEL OFICIO NO. D-3464/2016. UN DISCRIMINADO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA POR PAGO TARDEO DEL ANTICUPO. ESTABLECIENDOSE COMO NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE OBRA: 14 MARZO/2016 Y 9 DE SEPTIEMBRE/2016 RESPECTIVA

Nota NO 135 15 Agosto 2016

Se retira señalamiento existente, árboles, postes de alumbrado público y demolición de bases de C. 13 a C. 15 Norte, de C. 15 a C. 17 Norte, C. 15 a C. 17 Sur, C. 17 a C. 19 Sur y de C. 19 a C. 21 Sur.

* Se demuele banquetas y guardación existente de C. 13 a C. 15 Norte y de C. 15 a C. 17 Norte.

(117)



Nota No. 136 16 agosto 2016

Se hicieron 3 Registros Sanitarios e Hidráulicos en Tramo C. 13 a C. 15 a Entrada al Hotel Banqueta Norte.

* Se cambia y se coloca acero de refuerzo para colado de 2 bases de la C. 19 a la C. 21 Sur.
* Se compacta T. Natural de C. 19 a C. 21 Sur.

* Este día se colocan Postes de Cuadra C. 17 a C. 19, C. 15 a C. 17, C. 13 a C. 15 Los que faltaban de colocar.

(117)




Nota No. 138 18/ agosto 2016

Se hacen demolición de carpeta asfáltica para cruce de C. 15 Banqueta Norte. Para Poliducto eléctrico y tubos Hidráulicos del Riego en la misma Zanja. Por acuerdo con el Ing. Heredia Supervisor de Alumbrado Público.

Se relleno y compacta la Zanja con base compactada.

* Se hacen Tomas Hidráulicas con tubo Plus de C. 15 a C. 17 indicándole al Residente de por una Toma y Futuro en cada Toma existente con tubo Plus de 1/2" de diámetro.

(107)



Nota 139 19 agosto 2016

Se trabaja con tomas de C. 15 a C. 17 banqueta Norte.

Se hacen trabajos electricos colocacion postes C. 13 a C. 15 Norte y de C. 17 a C. 19 Sur.

Junta de aguas no ha hecho las conexiones del tubo PVC. al tubo PAD EN ESS. con C. 17 y ESS. con calle 19 se les ha solicitado la cuadrilla y a la fecha no se han presentado cuando a la fecha 3 semanas, debido a esto no se puede hacer granitacion furtante, corteo y colado de banquetas en el lugar, así como Bacheo Zangas.

(139)

Nota No. 140 20 agosto 2016

a la fecha se tienen 4 semanas sin poder trabajar en las esquinas de C. 17 a C. 19 Sur y de C. 19 a C. 21 Sur Esquinas con calle 19 debido a que cuadrilla de Junta de aguas no ha acudido para hacer las conexiones.

Se agachino el material de relleno en la cuadra de la C. 15 a la calle 17 Norte debido a las fuertes lluvias se tienen 3 días sin poder trabajar en esta cuadra. Por esta causa se colocó relleno en 35 cm. de espesor se sacó todo el material agachinado.

Se ha cancelado toda la semana la concreta por las lluvias.


(140)

Nota No. 141 22 agosto 2016

se demolió la rampa existente en Seguro Popular a Petición de Personal de esa dependencia solicitando la construcción de la misma con un descanso y 2 rampas con el 8% de pendiente.

Nota No. 142 23 agosto 2016

Se solicita al contratista por medio de Orden de Campo la construcción de la rampa para discapacitados de las oficinas del Seguro Popular.



Se construirá con concreto + c/c = 150 kg/cm². de un ancho de 1.10mts. de ancho, acabado rayado en rampas. Se solicita Presentar el Plano unitario como pendiente.

117

[Firma]

Nota No. 143 24 Agosto 2016

Se le indica al Residente de Obra volver a Pintar las rayas separadoras de carriles del Tramo de Blvd. Diaz Ordaz a C. Ocampo debido a que no se colocó Mues-Fera como se indica en las especificaciones de concreto.

Se ejecutan Trabajos eléctricos, colocación de adoquín, colados plantilla colados base para alumbrado C. 15 AC. 17 Norte. C. 19 AC. 21 Sur, haciendo cruce C. 15.

Se coloca Mobiliario Urbano de Blvd Diaz Ordaz a Ave Ocampo.

117

[Firma]

Nota No. 144 25 Agosto 2016 Jueves.

Se demuele Banqueta Norte de C. 17 AC. 19

El día de hoy no se coloca adoquín debido a que no se Presentó el adoquinero.

Hasta el día de hoy no se ha Presentado Junta de agua ha realizar las conexiones faltantes de Calle 17 AC. 19 y de C. 19 AC. 21 Sur.

[Firma]

[Firma]

Nota No. 145. 26 agosto 2016.
se le indica al contratista por este medio que de la calle 10 a la calle Ocampo se coloque un registro de 40x40 cms en esq. con Ocampo para cablear de ese registro a el poste existente pasando la Juarez, sobre la Ocampo lado Norte. debido a que con los trabajos ejecutados se dejaron sin encender las lamparas de esa cuadra sobre la Ocampo.

IN

Nota 146. 27 agosto 2016
se le indica al contratista que del Tramo de la Ocampo a la calle Independencia deberá retirar 8 postes con lampara/prazo, existentes en banqueta sur. para colocar 8 postes y sus respectivas lamparas considerando cable #6 (2 hilos) y cable 8 hilo que sube por el poste hasta la lampara.

DE INDEPENDENCIA AC. 2A — 2 PIEZAS
DE C. SEGUNDA AC. CUARTA — 3 PIEZAS
DE C. CUARTA AC. SEXTA — 1 PIEZA
DE CALLE SEXTA A AVE OCAMPO — 2 PIEZAS

De la misma manera se le indica retirar 3 postes y 3 lamparas de la plaza Talamantes Ubicadas al rededor del monumento, debido a que estas estan apagadas debido a los trabajos electricos realizados. Para esto se tendra que hacer el cruce de la calle 21 hacia la calle de la plaza. cablear, instalar poliducto como se indica.

