



DTA920302UN2
DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.
SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES
CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua México 31150

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

010003E4-AB9B-494F-8AE2-D1D40D2AB56B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

00001000000203495276

00001000000202492150

Chihuahua, Chihuahua

2016-04-09T10:13:22

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

296

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua, México 31000

SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES CHIHUAHUA
Chihuahua Chihuahua México 31150

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-09T12:19:50

No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

PAGO EN: No Identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	ESTIMACION	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) SEGÚN CONTRATO NO. 012/2016, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS). CON PERIODO DE 07 DE MARZO AL 11 MARZO DEL 2016.	\$ 431,820.04	\$ 431,820.04
DEDUCCIONES:		0.2% CMIC: \$863.64	Importe Total	\$ 431,820.04
0.2% I.C.I.C.: \$863.64		SUMA DE DEDUCCIONES: \$2,590.82	Subtotal	\$ 431,820.04
0.2% D.I.F.: \$863.64		NETO A RECIBIR: \$498,320.33	VA	\$ 69,091.21
TOTAL CON LETRA				
QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS, 25/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI			TOTAL	MXN \$ 500,911.25



Sello Digital del CFDI:
ZgQvuaPqld1alPUvZXd7Yz3jy2U/4ClignQKJA71Xg5jvqjDIH8Pe6EWdFbv+5clwPD6+m6C+OyTHIVnp1Jp2HcFrW5IZYXyYGzLKULFhm758KbVYz+g3srpYIKYnDINq+LZZgZT
Y8il4eq9cNyg7a4WJQSGZuB67ZA/eWo=
Sello del SAT:
e3QMUm8onXqWczxclO8c5W0sgWafXypSd1+8llyh0XrU7pUosun8Z6Kcmi1ZcJQ0uflQLGhdTRjmUs8NVyLgPR2XNcz8MaV2FN2xbEDOZJdtS7pyP7B/dIP5S+8P3JXkCsYth
ROXTZ1jd5arJ2VZsuFTJSKp38wVcz1Qdl5el=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.0]010003E4-AB9B-494F-8AE2-D1D40D2AB56B[2016-04-09T12:19:50]ZgQvuaPqld1alPUvZXd7Yz3jy2U/4ClignQKJA71Xg5jvqjDIH8Pe6EWdFbv+5clwPD6+m6C+OyTHIV
np1Jp2HcFrW5IZYXyYGzLKULFhm758KbVYz+g3srpYIKYnDINq+LZZgZT78il4eq9cNyg7a4WJQSGZuB67ZA/eWo=[00001000000203495276]



Folios
Digitales



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DTA920302UN2	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
010003E4-AB9B-494F-8AE2-D1D40D2AB56B	2016-04-09T10:13:22	2016-04-09T12:19:50	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$500,911.25	ingreso	Vigente	

Imprimir

[Handwritten signatures and marks]



CONTRATO No.: 012/2016
ESTIMACION No.: 1 (UNO)
PERIODO: 7 DE MARZO AL 11 MARZO DEL 2016
IMPORTE ESTIMADO: \$ 431,820.04
IMPORTE ACUMULADO: \$ 431,820.04

CONTRATADO: \$ 431.907,32

ESTIMACION No.: 1 (UNO)

PERIODO: 7 DE MARZO AL 11 MARZO DEL 2016

IMPORTE ESTIMADO: \$ 431 820 04

IMPORTE ESTIMADO: \$ 431,820.04

IMPORTE ACUMULADO: \$ 131,820.04

OBSERVACIONES

CONCEPTO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

\$431,820.04

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

DESCUENTOS:

0.2% I.C.I.C.

\$ 863.64

0.2% D.I.F.

\$ 863.64

0.2% CMIC

\$ 863.64

SUMA DESCUENTOS

\$2,590.92

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION

~~\$ 431,820.04~~

AMORTIZACION ANTICIPO (30 %)

\$ 0.00

DESCUENTOS

\$ 2,590.92

SUB - TOTAL

\$ 429,229.12

1. V.A.

\$ 69,091.21

SALDO NETO PARA PAGO

\$ 498,320.33

CON LETRA:

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 33/100 M.N.

[illegible]

[illegible]



DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO No.: 012/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

CONCEPTO: FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE 2.0 CM DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA.

CADENAMIENTO		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA (M2)	AREA ACUMULADA (M2)	ZONA
000+000	000+050	50.00	3.90	195.00	195.00	1
000+050	000+100	50.00	3.80	190.00	385.00	
000+100	000+150	50.00	3.75	187.50	572.50	
000+150	000+200	50.00	3.70	185.00	757.50	
000+200	000+250	50.00	3.90	195.00	952.50	
000+250	000+300	50.00	3.80	190.00	1,142.50	
000+300	000+350	50.00	3.90	195.00	1,337.50	
000+350	000+400	50.00	3.70	185.00	1,522.50	
000+400	000+450	50.00	3.80	190.00	1,712.50	
000+450	000+494	44.00	3.83	168.52	1,881.02	
000+494	000+544	50.00	3.65	182.50	2,063.52	2
000+544	000+594	50.00	3.63	181.50	2,245.02	
000+594	000+602	8.00	3.65	29.20	2,274.22	
000+602	000+652	50.00	7.30	365.00	2,639.22	3
000+652	000+702	50.00	7.30	365.00	3,004.22	
000+702	000+752	50.00	7.20	360.00	3,364.22	
000+752	000+802	50.00	7.30	365.00	3,729.22	
000+802	000+852	50.00	7.20	360.00	4,089.22	
000+852	000+902	50.00	7.10	355.00	4,444.22	
000+902	000+952	50.00	7.30	365.00	4,809.22	
000+952	000+989	37.00	7.35	271.95	5,081.17	

EL CONTRATISTA:
ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO



DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO No.: 012/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

CONCEPTO: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CM, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30

CADENAMIENTO		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA (M2)	AREA ACUMULADA (M2)	ZONA
000+000	000+050	50.00	3.90	195.00	195.00	1
000+050	000+100	50.00	3.80	190.00	385.00	
000+100	000+150	50.00	3.75	187.50	572.50	
000+150	000+200	50.00	3.70	185.00	757.50	
000+200	000+250	50.00	3.90	195.00	952.50	
000+250	000+300	50.00	3.80	190.00	1,142.50	
000+300	000+350	50.00	3.90	195.00	1,337.50	
000+350	000+400	50.00	3.70	185.00	1,522.50	
000+400	000+450	50.00	3.80	190.00	1,712.50	
000+450	000+494	44.00	3.83	168.52	1,881.02	
000+494	000+544	50.00	3.65	182.50	2,063.52	2
000+544	000+594	50.00	3.63	181.50	2,245.02	
000+594	000+602	8.00	3.65	29.20	2,274.22	
000+602	000+652	50.00	7.30	365.00	2,639.22	3
000+652	000+702	50.00	7.30	365.00	3,004.22	
000+702	000+752	50.00	7.20	360.00	3,364.22	
000+752	000+802	50.00	7.30	365.00	3,729.22	
000+802	000+852	50.00	7.20	360.00	4,089.22	
000+852	000+902	50.00	7.10	355.00	4,444.22	
000+902	000+952	50.00	7.30	365.00	4,809.22	
000+952	000+989	37.00	7.35	271.95	5,081.17	

EL CONTRATISTA:
ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO



DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE OBRA


CONTRATO No.: 012/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

CONCEPTO: CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENOVACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30

CADENAMIENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA (M2)	ESPESOR (M)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)	ZONA
000+000	000+050	50.00	3.90	195.00	0.007	1.37	1
000+050	000+100	50.00	3.80	190.00	0.007	1.33	
000+100	000+150	50.00	3.75	187.50	0.007	1.31	
000+150	000+200	50.00	3.70	185.00	0.007	1.30	
000+200	000+250	50.00	3.90	195.00	0.007	1.37	
000+250	000+300	50.00	3.80	190.00	0.007	1.33	
000+300	000+350	50.00	3.90	195.00	0.007	1.37	
000+350	000+400	50.00	3.70	185.00	0.007	1.30	
000+400	000+450	50.00	3.80	190.00	0.007	1.33	
000+450	000+494	44.00	3.83	168.52	0.007	1.18	
000+494	000+544	50.00	3.65	182.50	0.007	1.28	2
000+544	000+594	50.00	3.63	181.50	0.007	1.27	
000+594	000+602	8.00	3.65	29.20	0.007	0.20	
000+602	000+652	50.00	7.30	365.00	0.0061	2.23	3
000+652	000+702	50.00	7.30	365.00	0.0061	2.23	
000+702	000+752	50.00	7.20	360.00	0.0061	2.20	
000+752	000+802	50.00	7.30	365.00	0.0061	2.23	
000+802	000+852	50.00	7.20	360.00	0.0061	2.20	
000+852	000+902	50.00	7.10	355.00	0.0061	2.17	
000+902	000+952	50.00	7.30	365.00	0.0061	2.23	
000+952	000+989	37.00	7.35	271.95	0.0061	1.66	

EL CONTRATISTA:
ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO




DELTA
R.F.C. - DTA-920302-UN2


DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

CROQUIS DE OBRA

CONTRATO No.: 012/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA
ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

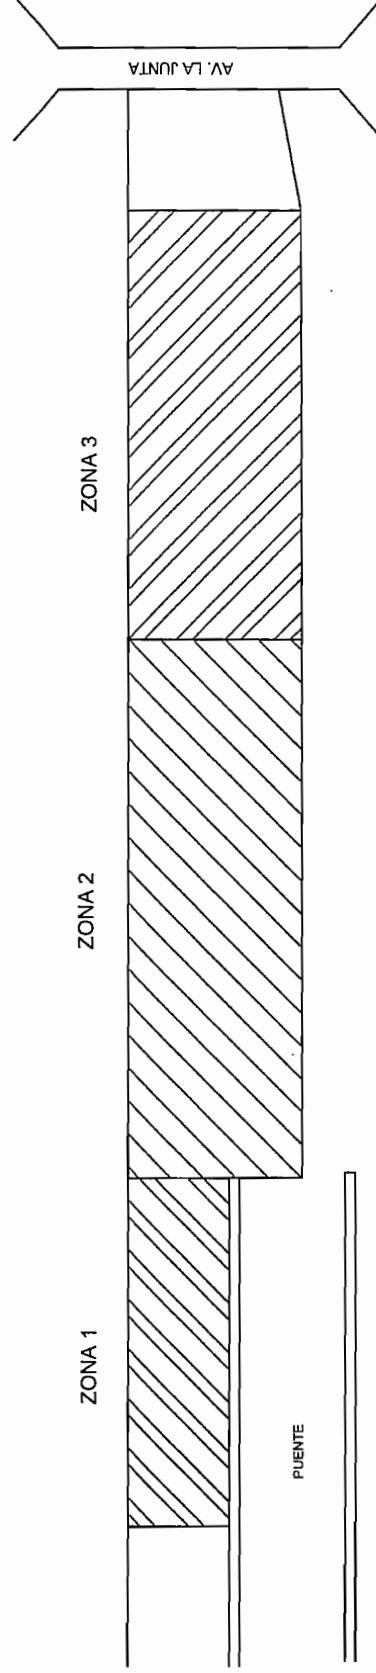

Tel: 01-(614)- 435-24-61
Fax: 01-(614)- 435-25-21

Calle Sierra Magisterial S/N
Col. Los Nogales

Chihuahua, Chih. Mex.



DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

CROQUIS DE OBRA

CONTRATO No.: 012/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

Aceites Lubricantes De
Chihuahua, SA De CV

and

45

451

Canarios
Mileños
Mirlos
se
Borunda

California

**Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro**

Calle Nueva Loja

Calle 12 -

Call
sor Jesus Lujan

Los Angeles

Calle Sinolda

35

México

Calle Jalisco

Guerrero

Miguel Ahumada

Industrias

Durango
Chilapas

Callie

Av de la Junta

Miguel Ahumada

Av Ferrocarril

Emilia Miller
Calle Juan José Escudero

Hernán Cortez

Campeche

California

Trias

Calle 57a

Papelera de Chihuahua ■

Calle 57a.

Calle 28
Juan F. Carrillo

Aniversario

Corregidora

Calle 55

Calle 53

Calle 5.

Calle 57a.

Tel: 01-(614)- 435-24-61
Fax: 01-(614)- 435-25-21

Calle Sierra Magisterial S/N
Col. Los Nogales

Chihuahua, Chih. Mex.



ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. DE C.V.
GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION
CALLE PRINCESA REAL 914 COL. REAL CAROLINAS IV SECTOR

INFORME DE PRUEBAS EN MEZCLA ASFALTICA 3/8"

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).


LOCALIZACION: CHIHUAHUA **REPORTE NO.** 1
TRAMO: AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA CARRIL DE ALTA (IZQ) **CLAVE:** DEL
SUBTRAMO: **FECHA DE MUESTREO:** 08/03/2016
EJECUTORA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V. **FECHA DE INFORME:** 10/03/2016

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCION DEL MATERIAL: MEZCLA DE MATERIALES
PARA USARSE EN: PROPUESTA DE DISEÑO
DEPOSITO MUESTREADO: BANCO DE TRITURACION OBRA ☐ PLANTA ☒ BANCO ☐
UBICACIÓN DE BANCO: GCC
PLANTA (NOMBRE Y UBICACIÓN): CHIHUAHUA
TENDENCIA DEL KM. NA AL KM. NA CUERPO: NA

GRAVA	SELLO	ARENA

MALLA	% QUE PASA	NORMA S.C.T.
3"	100	100
2"	100	100
1 1/2"	100	100
1"	100	100
3/4"	100	90-100
1/2"	100	72-90
3/8"	91	60-76
1/4"	78	44-57
No. 4	68	37-48
No. 10	28	20-29
No. 20	15	12-19
No. 40	10	8-14
No. 60	8	6-11
No. 100	6	4-8
No. 200	4	2-5

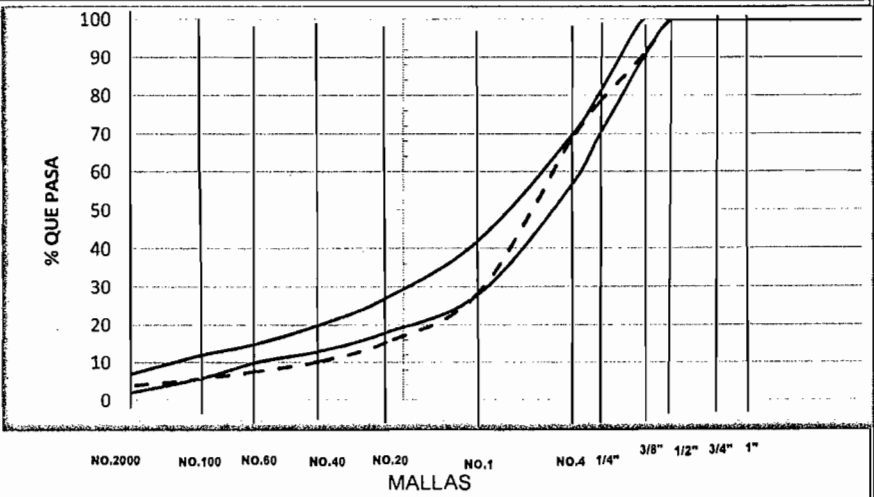

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE RECO		
LIMITE LIQUIDO:	NA	MAX. 25 %
INDICE PLASTICO:	NA	MAX. 6 %
EQUIV. DE ARENA %	66,00%	MAX. 40 %
DESP. POR FRIC:	NA	MIN. 90 %
DENSIDAD RELATIVA	2,52	MIN. 2,4
DESgaste de los Angeles	18	MAX. 30

CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
TIPO DE ASFALTO:	AC-30
TEMP. RECOMENDADA DE MEZCLADO (°C)	
TEMP. RECOMENDADA DE APLICACIÓN (°C)	
TEMP. RECOMENDADA DE COMPACTACION (°C)	

PRUEBAS A LA MEZCLA			CARACTERISTICA DE LA MEZCLA REACIADA		
CONTENIDO OPTIMO	ASF%	5,2	CARACTERISTICA	RESULTADO	10 <EL<10
CONTENIDO ASF. %	ASF. %	5,20	NO. GOLPES	75	V.M.C %
M.V DE LA MEZCLA	kg./m³	2333	ESTABILIDAD Kg	1022,00	3,45
			FLUJO mm (10 ⁻² in	3,33	V.F.A. %
				2-3,5	68,40
					VAM. %
					18,22
					14 MIN

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA ANALISADA CUMPLE CON LOS PARAMETRO ESTABLECIDOS

NORMATIVAS SCT APLICADAS:
N-CMT-4-04/VIGENTE
N-CMT-4-05-001/VIGENTE
N-CMT-4-05-003/ VIGENTE

JEFE DE VERIFICACION

Alonso Hernandez Estrada
ING. A. HERNANDEZ ESTRADA

ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. DE C.V.

GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION
CALLE PRINCESA REAL 914 COL. REAL CAROLINAS IV SECTOR

INFORME DE PRUEBAS EN MEZCLA ASFALTICA 3/8"

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

LOCALIZACION: CHIHUAHUA

REPORTE NO.	2
-------------	---

TRAMO: AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO
(SALIDA DEL PUENTE) Y AV. LA JUNTA CARRIL CENTRALES

CLAVE: _____ DEL _____

SUBTRAMO: (SALIDA DEL PUENTE) Y AV. LA JUNTA CARRIL CENTRALES

FECHA DE MUESTREO: 10/03/2016

EJECUTORA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

FECHA DE INFORME: 11/03/2016

DATOS DEL MUESTREO

DESCRIPCION DEL MATERIAL:	MEZCLA DE MATERIALES
----------------------------------	----------------------

PARA USARSE EN:	PROPUESTA DE DISEÑO
------------------------	----------------------------

DEPOSITO MUESTREADO:	BANCO DE TRITURACION
-----------------------------	----------------------

UBICACIÓN DE BANCO:**PLANTA (NOMBRE Y UBICACIÓN)**

TENDIDAD DEL KM.

CHIHUAHUA

NA


AI-KM.

NA

CUERPO:

NA

MALLA	% QUE PASA	NORMA S.C.T.
3"	100	100
2"	100	100
1 1/2"	100	100
1"	100	100
3/4"	100	90-100
1/2"	100	72-90
3/8"	91	60-76
1/4"	80	44-57
No. 4	70	37-48
No. 10	29	20-29
No. 20	16	12-19
No. 40	11	8-14
No. 60	8	6-11
No. 100	6	4-8
No. 200	4	2-5

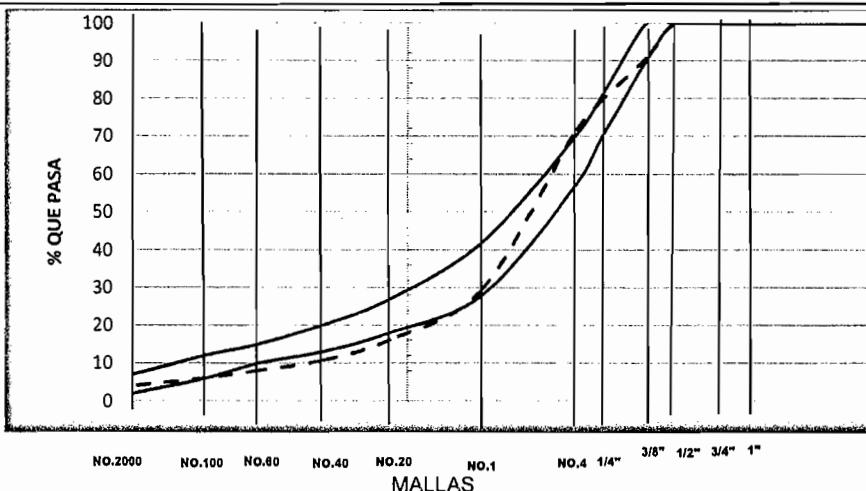

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PETREO

LIMITE LIQUIDO:	NA	MAX. 25 %
INDICE PLASTICO:	NA	MAX. 6 %
EQUIV. DE ARENA %	66,00%	MAX. 40 %
DESP. POR FRIC:	NA	MIN. 90 %
DENSIDAD RELATIVA	2,52	MIN. 2,4
DESgaste DE LOS ANGULES	18	MAX. 30

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO

TIPO DE ASFALTO:	AC-30
TEMP. RECOMENDADA DE MEZCLADO (°C)	
TEMP. RECOMENDADA DE APLICACIÓN (°C)	
TEMP. RECOMENDADA DE COMPACTACION (°C)	

PRUEBAS A LA MEZCLA

CONTENIDO OPTIMO	ASF%	5.2
CONTENIDO ASF. %	ASF. %	5.3
M.V DE LA MEZCLA	kg./m³	2347

CARACTERÍSTICAS DE LA HEZGLIASAL CA

CARACTERÍSTICA	RESULTADO	10 <ΣL≤10	CARACTERÍSTICA	RESULTADO	10 <ΣL≤10
NO. GOLPES	75		V.M.C %	3,23	3-5
ESTABILIDAD: Kg	988,00	815 MIN	V.F.A. %	66,40	65-75
FLUJO mm (10 ⁻² l/s)	3,22	2-3.5	VAM. %	17,50	14 MIN

OBSERVACIONES:

LA MEZCLA ANALISADA CUMPLE CON LOS PARAMETRO ESTABLECIDOS

NORMATIVAS SCT APLICADAS:

N-CMT-4-04/VIGENTE

N-CMT-4-05-001/VIGENTE

N-CMT-4-05-003/ VIGENTE

JEFE DE VERIFICACION

Alonso Valenzuela Estrada
ING. ALONSO VALENZUELA

COL. REAL CAROLINAS IV SECTOR CALLE. PRINCESA REAL NO. 914





DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
CONTRATO No.: 012/2016
OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE
VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

REPORTE FOTOGRAFICO

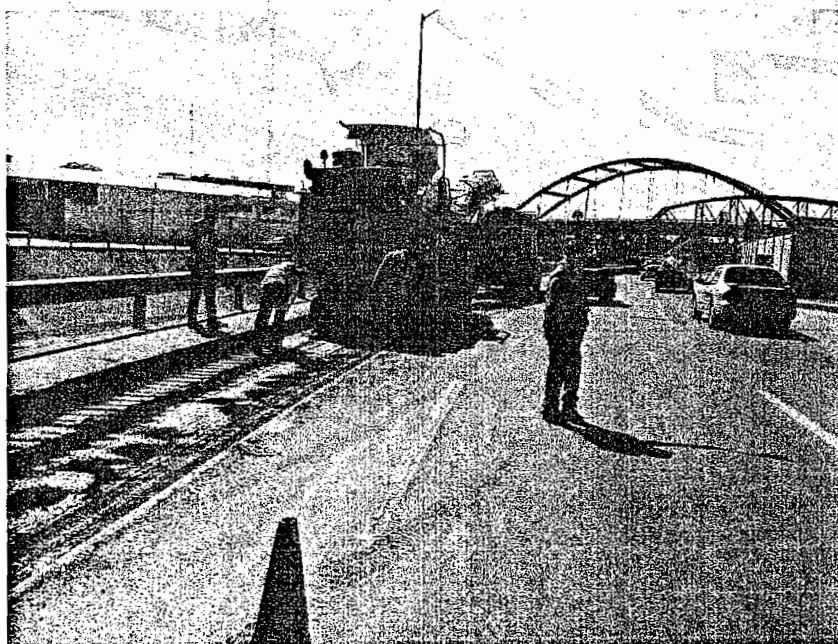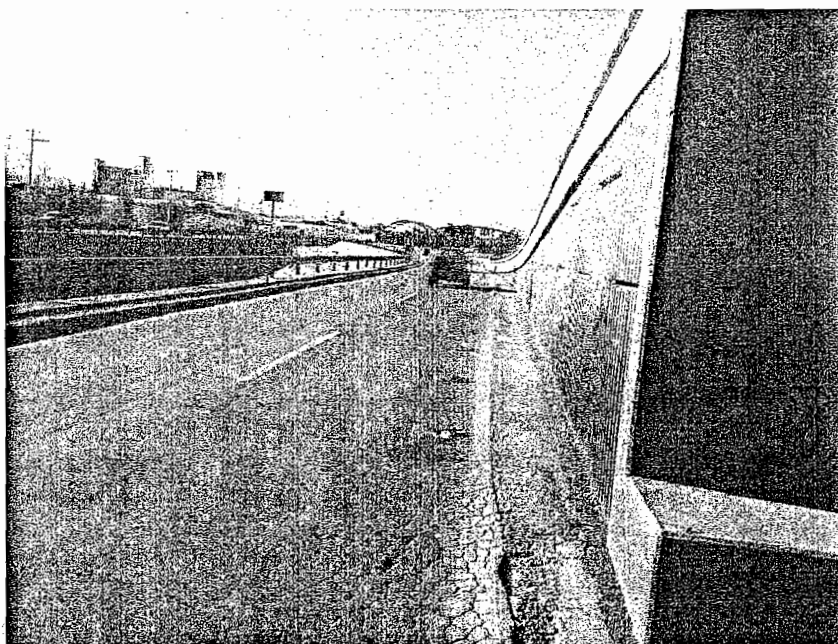



DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CHIHUAHUA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTRATO No.: 012/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE
VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

REPORTE FOTOGRAFICO

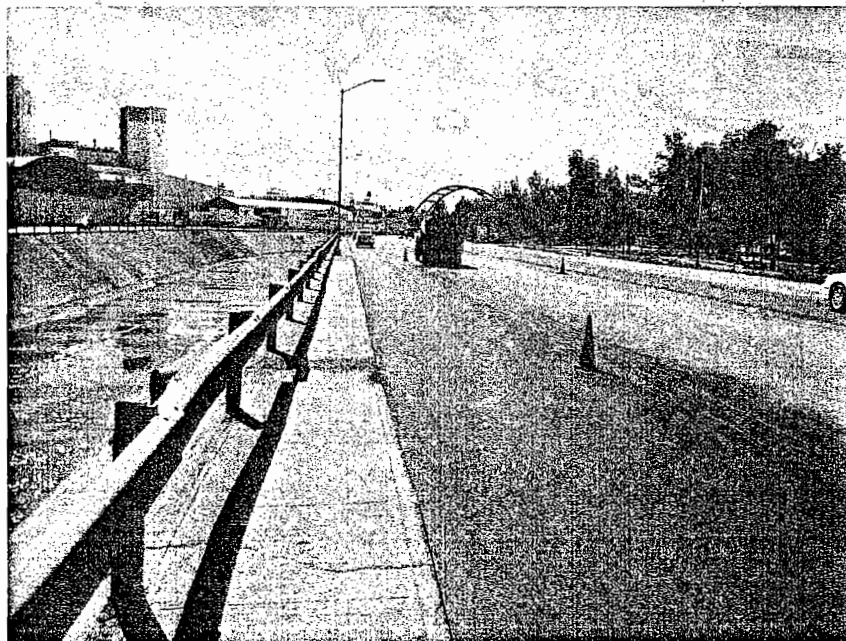

Handwritten signature and initials.



DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE CHIHUAHUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONTRATO No.: 012/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE
VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA (TRAMOS AISLADOS).

REPORTE FOTOGRAFICO

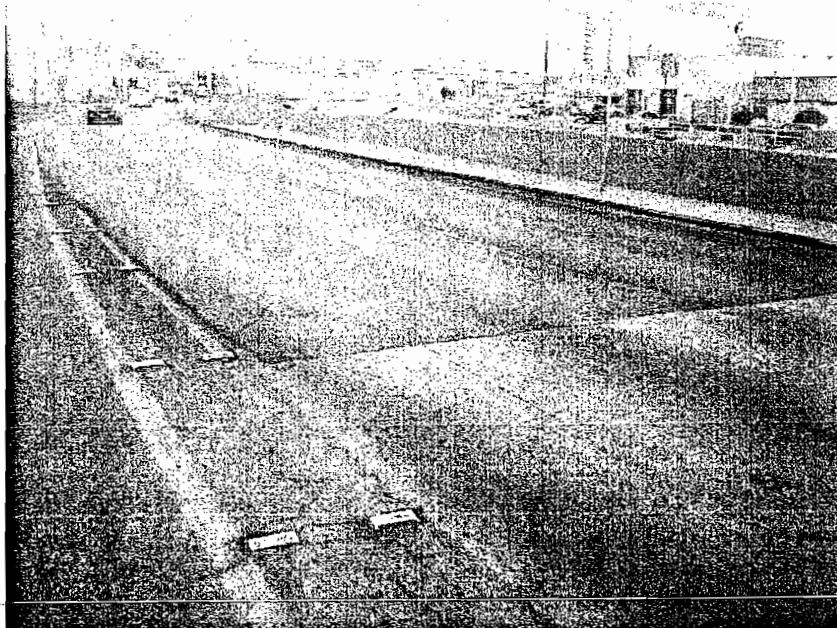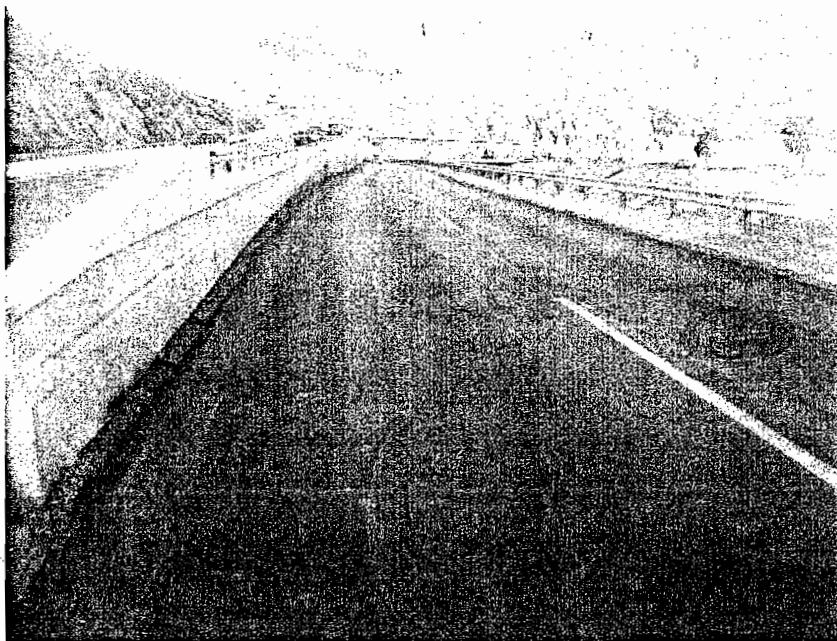


[Handwritten signature]

FOLIO N° 001

07-MARZO-2016

CON ESTA FECHA INICIAMOS LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 012/2016. SE FRESO EN AV. TROFIMO BOMUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA CARRETERA DE ALTA VELOCIDAD (I29) Y SE HIZO LIMPIEZA


M



08-MARZO-2016

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 012/2016. SE PAVIMENTO Y PUNEO MEZCLA ASFALTICA 3/8 EN AV. TROFIMO BOMUNDA NORTE ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. LA JUNTA CARRETERA DE ALTA VELOCIDAD (I29) Y SE REALIZA LIMPIEZA

M





09. MARZO - 2016

Continuamos con los trabajos de este contrato N° 012/2016
Se fresó en AU. Perfil Bounded Norte Entre Unidad
Sacramento (salida del puente) y AU. La Junta Corrientes
Centrales (2) y se hizo limpieza

10. MARZO - 2016

Se continuo con los trabajos de este contrato N° 012/2016. se
Pavimento y se dio mezcla asfaltica 3/8" en AU. Perfil Bounded
Norte Entre Unidad Sacramento (salida del puente) y AU.
La Junta Corrientes Centrales (2)

11. MARZO - 2016

Se Realizo limpieza General concluyendo con los trabajos
de este contrato

