



ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONSTRUCCIONES

Arturo Davila Dozal
DADA650730ER0
Domicilio Fiscal
Cerrada de Ciervo 3907
Col. Lomas del Sol 31114
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4403137,4197398

Factura No: 773

FOLIO FISCAL (UUID):

7EF02E48-6E7A-4B0E-9198-A060ED7F2F2A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000201291207

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:


2016-04-21T14:56:29

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-04-21T14:51:29

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Fecha de Expedición: 21 abril 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18.15x30.00MTS EN CANCHA USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE CAMPO DE AGOSTADERO Y MAIZAL DE LA COLONIA CAMPO BELLO. ESTIMACION No. 2 (DOS) SEGUN CONTRATO No. 016/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$130,967.92 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO D.I.F. DEL 0.2% \$261.94 I.C.I.C. DEL 0.2% \$261.94 C.M.I.C. DEL 0.2% \$261.94 SUMA \$785.81  NETO A RECIBIR \$151,136.98	\$ 130,967.92	\$ 130,967.92

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS, 79/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 130,967.92
IVA(IVA 16.00%): \$ 20,954.87
TOTAL: \$ 151,922.79

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TBKPjFLeFm2VKeMIMzMMzzTUJhHzNHYYOvc3VHcaXcaNAprM7P/ArMm3Hxjxoi0dc1VvMIJRGUyBICdAGYhcAsYHUSCw+e2WNP2vSyjB8B8K4BDcJWv3/opoiSXUjM3FKwqSVFSBFUuiG7qqkueipRNZkoEWJHK3M1Qra8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

xiY21JIV5MqUTgNTZCVp1gXnLrdhXqT3BKWnuYFD5Y6m7KWoz8vR6q1Fvhn+UMi2UHSUaAypczE3v1q67T3DIMKaOwBeLDJZZKFnC5UVH47tjC2LIVjO0A5Vx+baahOpeOBCxn3WUHD01eWAZxo3ZDqychYKkO1WSo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[11,0]7EF02E48-6E7A-4B0E-9198-A060ED7F2F2A[2016-04-21T14:56:29]TBKPjFLeFm2VKeMIMzMMzzTUJhHzNHYYOvc3VHcaXcaNAprM7P/ArMm3Hxjxoi0dc1VvMIJRGUyBICdAGYhcAsYHUSCw+e2WNP2vSyjB8B8K4BDcJWv3/opoiSXUjM3FKwqSVFSBFUuiG7qqkueipRNZkoEWJHK3M1Qra8=[00001000000203495276]



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





gob.mx


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal XRFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DADA650730ERO	Arturo Davila Dozal	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
7EF02E48-6E7A-4B0E-9198-A060ED7F2F2A	2016-04-21T14:51:29	2016-04-21T14:56:29	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$151,922.79	ingreso	Vigente	

Imprimir



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 016/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18.15X30.00 MTS EN CANCHA USOS MULTIPLES	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 920,410.56 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DEL 2016	
UBICACIÓN: CALLE CAMPO DE AGOSTADERO Y MAIZAL DE LA COLONIA CAMPOBELLO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 151,922.79 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 768,019.16 CON IVA
RFC DADA-650730-ER0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 919,941.95 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 106,505.08	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 22,081.46	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 2,381.39	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 130,967.92	

DESCUENTOS		
0.2% D.I.F	\$	261.94
0.2% I.C.I.C.	\$	261.94
0.2% C.M.I.C.	\$	261.94
SUMA DESCUENTOS	\$	785.81
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	130,967.92
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	130,967.92
I.V.A.	\$	20,954.87
TOTAL	\$	151,922.79
(CON LETRA)		
(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 79/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	785.81
SALDO NETO A RECIBIR	\$	151,136.98

AUTORIZO	ELABORO
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA	ING. ARTURO DAVILA DOZAL
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
Vo. Bo.	
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	

CHIHUAHUA, CHIH.,

11 DE ABRIL 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 151,136.98
(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 016/2011 POR LA CANTIDAD DE : \$ 920,410.56 INCLUYE CONVENIO
NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 56/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18.15X30.00 MTS EN CANCHA USOS MULTIPLES

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	130,967.92
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	130,967.92
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	IVA	\$	20,954.87
	TOTAL	\$	151,922.79
D.I.F. DEL 0.2%	261.94		
I.C.I.C. DEL 0.2%	261.94		
C.M.I.C. DEL 0.2%	261.94		
SUMA	785.81		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 920,410.56
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 768,019.16
ESTA ESTIMACION	\$ 151,922.79
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 919,941.95
POR EJERCER	\$ 468.61

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,324.17	\$ 1,324.17
ESTA ESTIMACION	\$ 261.94	\$ 261.94
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,586.11	\$ 1,586.11

0.2% C.M.I.C.

\$	1,324.17
\$	261.94
\$	1,586.11

R E C I B I M O S

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
DADA-650730-ERO

OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18.15X30.00
MTS EN CANCHA USOS MULTIPLES

MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 016/2016

ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERÍODO: 01 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

ALBAÑILERIA	\$	78,721.56
ELECTRICO	\$	27,783.52

EXCEDENTES

ALBAÑILERIA	\$	21,847.29
ELECTRICO	\$	234.17

OBRA EXTRAORDINARIA

OBRA EXTRAORDINARIA

	\$	2,381.39
--	----	----------

SUBTOTAL	130,967.92
I.V.A.	20,954.87
TOTAL	151,922.79

POR EL CONTRATISTA



ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M



ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		

4.1	ALBAÑILERIA						78,721.56
4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	210.00	210.00		32.07 \$	6,734.70
4.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CALIDAD, EN AREAS DE JUEGO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	m2	78.00	72.61	72.61	74.22 \$	5,389.11
4.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA ALUMINIO, EN MALLA CICLONICA, PORTERIA Y BARRAS EXISTENTES DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENT Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	142.00	84.24	84.24	76.84 \$	6,473.00
4.7	RETIRO Y REPOSICON DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5, INCLUYE: SOLERA EN PARTE SUPERIOR, INFERIOR E INTERMEDIA A BASE DE SOLERA DE 1/8" X 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	116.00	116.00	116.00	314.07 \$	36,432.12
4.9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE ALUMINIO EN TUBERIA EXISTENTE DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRE, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	164.00	164.00	164.00	46.63 \$	7,647.32

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO		
4.11	CON ARO EN CANASTA DE BASQUETBOL EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE TABLERO EXISTENTE, MATERIAL, CALADO DE 2 LOGOTIPOS, PINTURA,	pza	2.00	2.00		2.00	8022.65	\$ 16,045.30
5.1	ELECTRICO							\$ 27,783.52
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PD. DE 3/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, CONDULET TIPO "C", COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ml	55.00	55.00		55.00	47.79	\$ 2,628.45
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA LUMINARIAS EL CUAL CONSTA DE 3 CONDUCTORES MONOPOLAR THW CALIBRE 10, INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	ml	92.00	91.44		91.44	33.24	\$ 3,039.47
5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA 4X4(REGISTROS) INCLUYE TPA, SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	6.00	6.00		6.00	16.73	\$ 100.38
5.8	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIALES.	m2	544.50	544.40		544.40	4.53	\$ 2,466.13
5.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DESNUDO CAL. 4, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	kg	5.00	2.15		2.15	378.19	\$ 813.11
5.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	30.00	23.40		23.40	92.55	\$ 2,165.67
5.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO XLR CAL. 4 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	60.00	59.85		59.85	41.22	\$ 2,467.02

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M


ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Pag 2 de 4

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		
5.12	INSTALACION DE REFLECTORES EXISTENTES, INCLUYE FIJACION, CONEXIÓN, ELEVACION, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	pza	3.00	3.00	3.00	805.42 \$	2,416.26
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR MODELO DFL-400-AS/E BEVENTO DE 400W A.M. 220V MARCA TECNOLITE O SIMILAR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	pza	3.00	3.00	3.00	3788.5 \$	11,365.50
5.14	EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, PLANTILLA Y RELLENO COMPACTADO SECCION DE 0.40 X 0.60 MTS., COMPACTACION AL 80%, EN CAPAS DE 20 CMS., RETIRO DE MATERIAL SOBANTE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION.	ml	22.00	4.76	4.76	37.81 \$	179.98
5.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" SERVICIO PESADO INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ml	22.00	4.76	4.76	29.74 \$	141.56

4.1	ALBAÑILERIA					\$	21,847.29
4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	210.00	272.35	210.00	32.07 \$	1,999.56



POR EL CONTRATISTA
 ING. ARTURO DAVILA DOZAL


POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M


ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
4.7	RETIRO Y REPOSICION DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5, INCLUYE: SOLERA EN PARTE SUPERIOR, INFERIOR E INTERMEDIA A BASE DE SOLERA DE 1/8" X 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	116.00	163.98	116.00	314.07 \$	15,069.08
4.9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA DE ALUMINIO EN TUBERIA EXISTENTE DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRE, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	164.00	266.48	164.00	46.63 \$	4,778.64
5.1	ELECTRICO						234.17
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PD. DE 3/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, CONDULET TIPO "C", COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ml	55.00	59.90	55.00	47.79 \$	234.17

E	OBRA EXTRAORDINARIA					\$	2,381.39
E1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOTIMER DE 5 HORAS A 220V, INCLUYE BASE, CONTACTOR DE 25 AMP., FIJACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	-	1.00		2381.39 \$	2,381.39



POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M



ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO : 016/2016	TRAMO:	PARQUE UBICADO EN CALLE CAMPO DE AGOSTADERO Y MAIZAL DE LA COLONIA CAMPOBELLO
OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18.15x30.00 MTS.	CONTRATISTA:	ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION: DOS		PERIODO: 01/04/2016 AL 08/04/2016		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR		
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS						
4.1 ALBAÑILERIA	EJE	TRAMO	PZA	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUB-TOTAL
4.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	BASQUETBOL		3	13.95			ML	41.85
			2	27.90			ML	55.80
			4	5.62			ML	22.48
			2	3.60			ML	7.20
			6	5.79			ML	34.74
			12	0.20			ML	2.40
			4	1.19			ML	4.76
			2	20.06			ML	40.12
VOLEYBOL			2	18.00			ML	36.00
			3	9.00			ML	27.00

RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

2 / 20

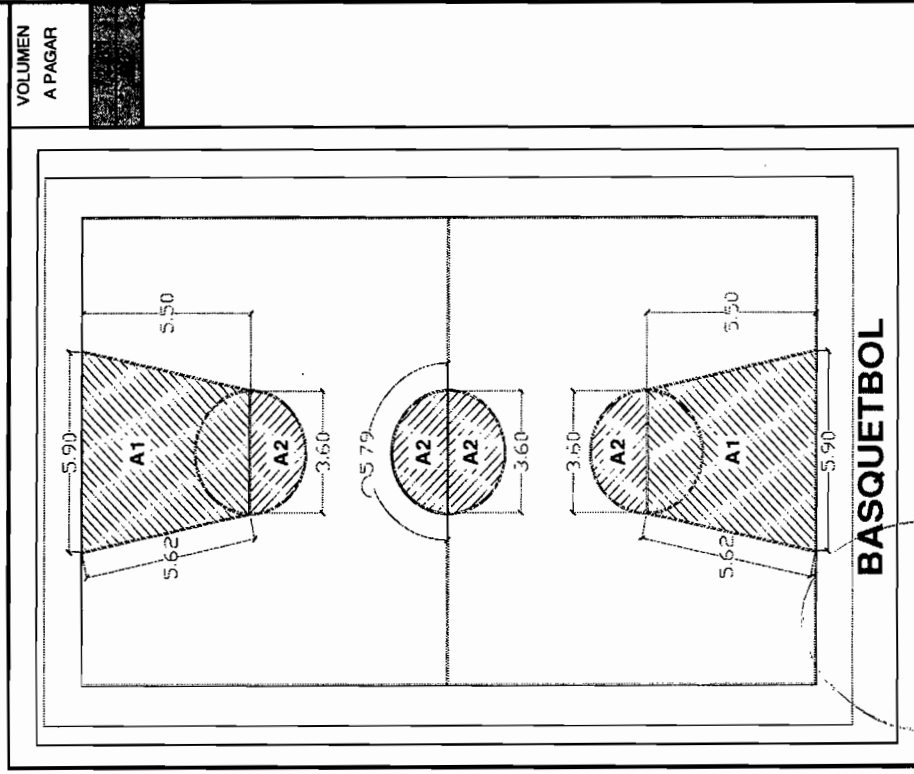[illegible]

RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

HOJA:

Nº DE ESTIMACION:	DOS	PERIODO: 01/04/2016 AL 08/04/2016
		VOLUMEN

VOLUMEN
A PAGAR

EJE A

2396

1145


EJE B

2380

1152

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

4 / 20

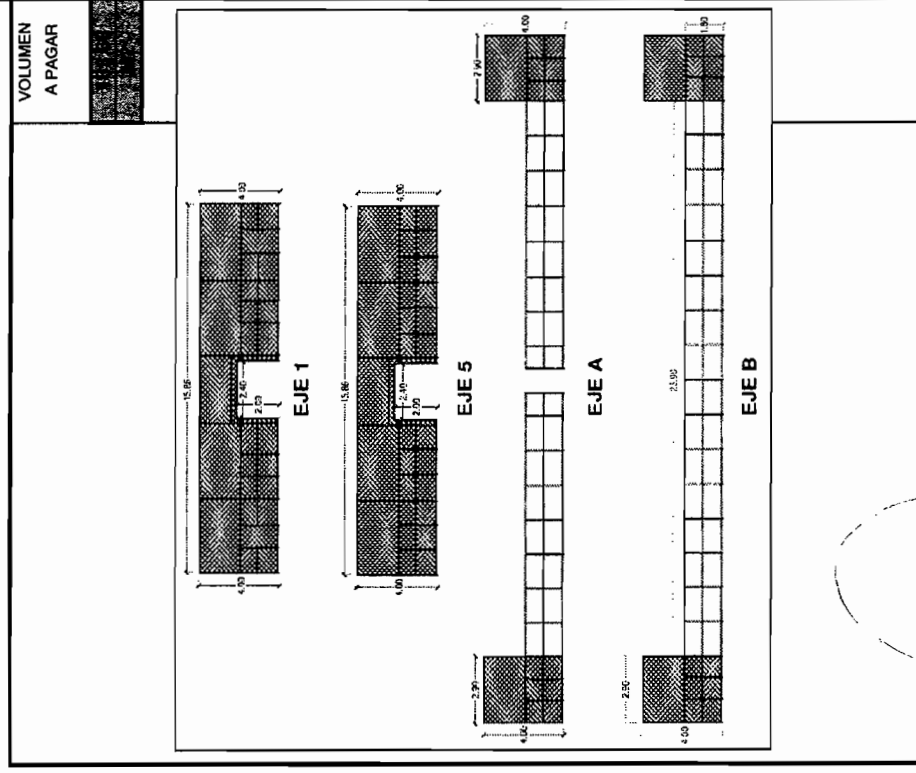[illegible]


RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

5 / 20

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

HOJA:


CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

HOJA: 7 / 20

PARQUE UBICADO EN CALLE CAMPO DE AGOSTADERO Y MAIZAL DE LA COLONIA CAMPOBELLO

ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 01/04/2016 AL 08/04/2016

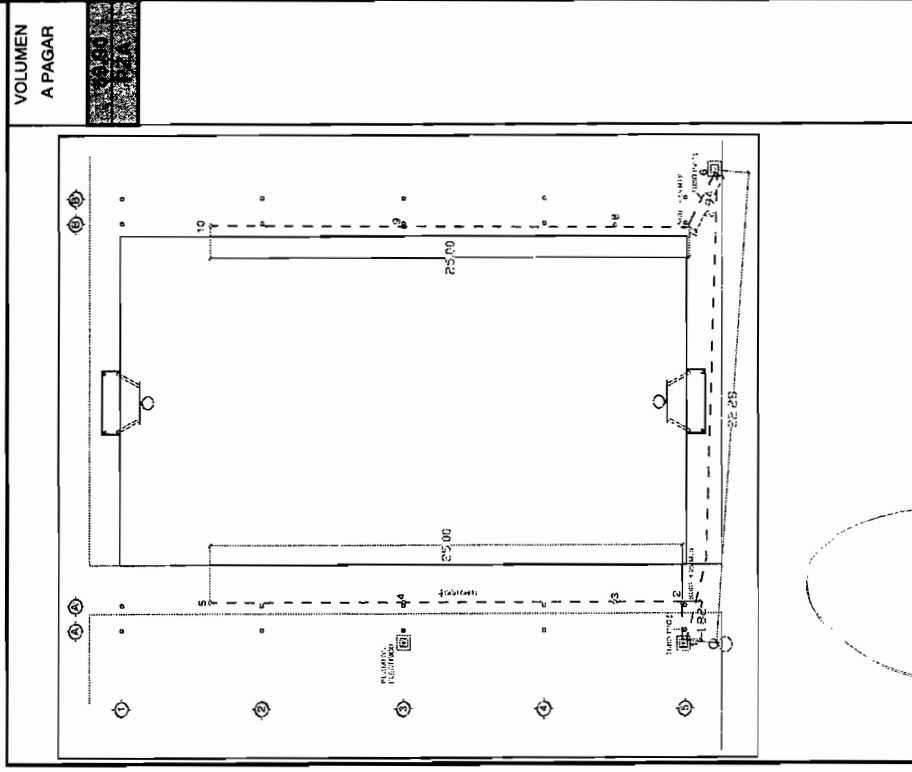[illegible]

RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

8 / 20

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

HOJA:

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

10 / 20


CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

HOJA:

PARQUE UBICADO EN CALLE CAMPO DE AGOSTADERO Y MAIZAL DE LA COLONIA CAMPOBELLO

ARTURO DAVILA DOZAL

016

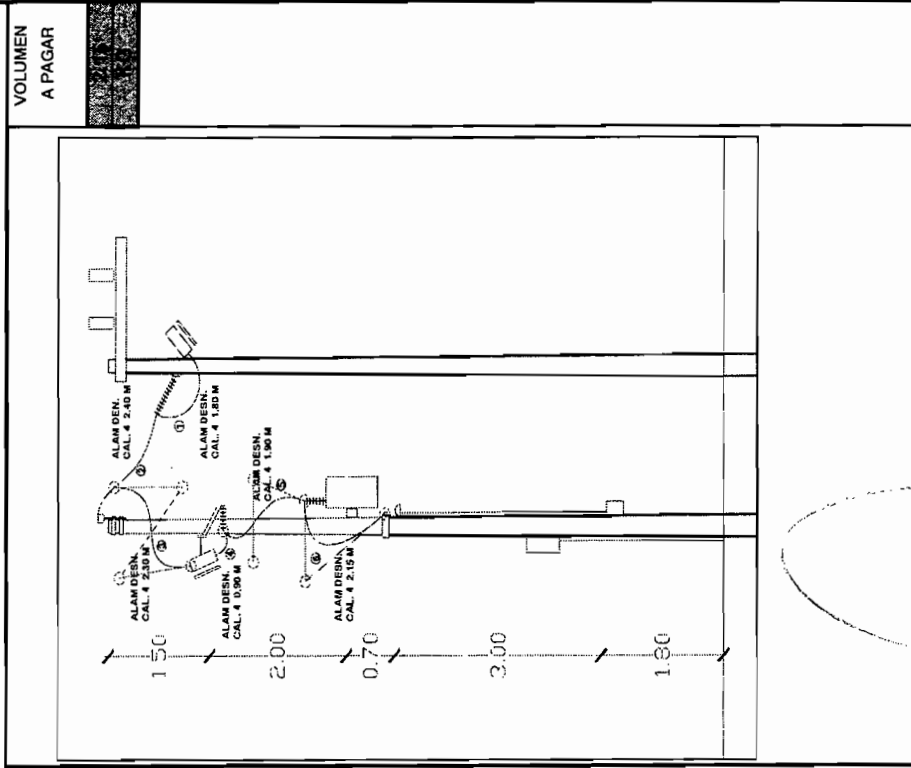[illegible]

RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

12 / 20

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

HOJA:

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

HOJA:

[illegible]

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

15 / 20


RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

HOJA:

[illegible]

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

17 / 20

CONTRATISTA
ARTURO DÁVILA DOZAL

18 / 20

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL



GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA: 19 / 20

CONTRATO : 016/2016	TRAMO:	PARQUE UBICADO EN CALLE CAMPO DE AGOSTADERO Y MAIZAL DE LA COLONIA CAMPOBELLO
OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18.15X30.00 MTS.	CONTRATISTA:	ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION:	DOS	PERIODO: 01/04/2016 AL 08/04/2016
-------------------	-----	-----------------------------------

FOTOS

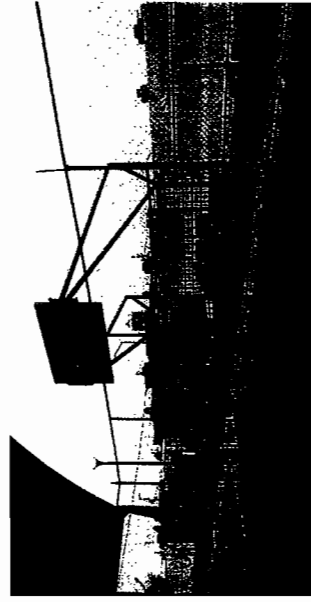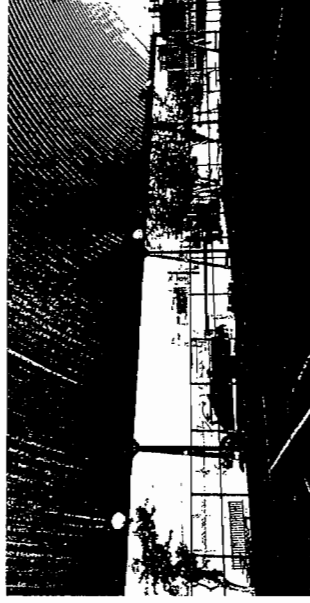


RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA


CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL



GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA: 20 / 20

CONTRATO : 016/2016	TRAMO:	PARQUE UBICADO EN CALLE CAMPO DE AGOSTADERO Y MAIZAL DE LA COLONIA CAMPOBELLO
OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 18.15X30.00 MTS.	CONTRATISTA:	ARTURO DAVILA DOZAL

Nº DE ESTIMACION: DOS PERIODO: 01/04/2016 AL 08/04/2016

FOTOS

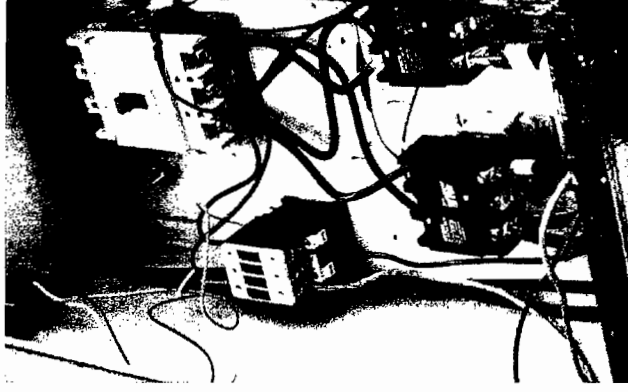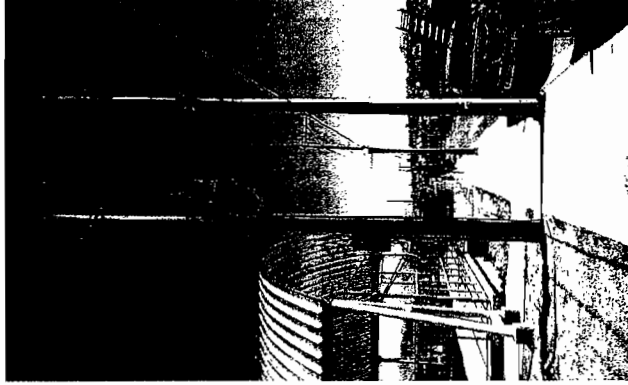

RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL
