



Reg. Fiscal: GENERAL DE LEY

FACTURA

Fecha	Mayo 18 2016 - 16:45:28
Serie	
Número	304

CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.
CDU9712034K0

HACIENDA DE CARRIZAL No. 3402 Int. No. 2
 HACIENDA SANTA FE
 31215, CHIHUAHUA MEXICO

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
RFC:	MCI651010V22		
Domicilio	CALLE MINA No. 408		
Colonia	CENTRO	Teléfono	
CP	31000	Ciudad	CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FACTURA EMITIDA EN: HACIENDA DE CARRIZAL 3402 2, HACIENDA SANTA FE, 31215, CHIHUAHUA, MEXICO, MEXICO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1.00	OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA CONCEPTO: ESTIMACION NUMERO 4 (CUATRO) CONTRATO NO.034/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C \$433.07 0.2% C.M.I.C \$433.07 0.2% D.I.F \$433.07 SUMA \$1,299.21 NETO A RECIBIR \$249,880.84	216,534.53	216,534.53
SUB TOTAL			216,534.53
IVA			34,645.52
TOTAL			251,180.05

Importe total con letra	Forma de pago
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 05/100 M.N. Peso Mexicano	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No identificado	Cuenta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal: 59F08D0E-E809-4E7F-B84F-CA128D35E322

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y Hora de Certificación: Mayo 18 2016 - 17:45:31

Sello digital del CFDI

S8FwSvaOq3WBoB6mf2oL+X7ttRz7UzUA0Ra7/57F32/p1H7o810Jrq0uLf7OtrZUTbeOUULgWBpJyL+aM5dGqi
 MO6JcQt1c12xVu/MW7jOpLpo5e9i+dFFedcfZIScnqcxFVu4mvjXs965rgHo+LucWjlofFUDy4qz9kcMNq1NE=

Sello del SAT

IlrP3ptVPWMrVtFbhlWYL84Iz6X8HFDi2+IpiEMK7RfXIloeW0+pVb41TsoaSfx6cnjflhuVhFyJQyLF
 w/uTJKJMxIloXZGjrlz4Rq42Z5tzENzkobgkcuFpKMDjEhMKFKsIvKCW5gGjfr9kAunKRRathSps9Dv
 bUzpZhDuSTA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|59F08D0E-E809-4E7F-B84F-CA128D35E322|2016-05-18T17:45:31|S8FwSvaOq3WBoB6mf
 2oL+X7ttRz7UzUA0Ra7/57F32/p1H7o810Jrq0uLf7OtrZUTbeOUULgWBpJyL+aM5dGqiMO6JcQt1c12
 xVu/MW7jOpLpo5e9i+dFFedcfZIScnqcxFVu4mvjXs965rgHo+LucWjlofFUDy4qz9kcMNq1NE=|0000
 1000000202864883||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CDU9712034K0	CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
A634D271-E71C-44DE-AE85-A707FDAEB2BB	2016-05-17T18:49:52	2016-05-17T19:49:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$251,180.05	ingreso	Vigente	



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL PARA 2016	CONTRATO No. 034/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)	\$ 29,355,601.94 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 09 AL 15 DE MAYO 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 251,180.05 CON IVA
CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,659,477.37 CON IVA
RFC CDU9712034K0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,910,657.42 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 57,671.21	
	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 158,863.32	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 216,534.53

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 433.07
0.2% D.I.F.	\$ 433.07
0.2% C.M.I.C.	\$ 433.07
	\$
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,299.21

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 216,534.53
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 216,534.53
I.V.A.	\$ 34,645.52
TOTAL	\$ 251,180.05


(CON LETRA)

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 5/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,299.21
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 249,880.84

AUTORIZO


ELABORO


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M


Vo. Bo.


ING. XOCHILT PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO


CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y
AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION
CONTRATISTA

REVISO


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

CHIHUAHUA, CHIH.,

16 DE MAYO 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 249,880.84
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 4 (CUATRO) CONTRATO No. 034/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 29,355,601.94
VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 94/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 216,534.53

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 216,534.53
IVA	\$ 34,645.52
TOTAL	\$ 251,180.05

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%	433.07
D.I.F. DEL 0.2%	433.07
C.M.I.C DEL 0.2%	433.07
SUMA	1,299.21

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 29,355,601.94
PRIMERA ASIGNACION	\$ 7,000,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,659,477.37
ESTA ESTIMACION	\$ 251,180.05
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,910,657.42
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ 5,089,342.58
POR EJERCER	\$ 27,444,944.52

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,861.18	\$ 2,861.18	\$ 2,861.18
ESTA ESTIMACION	\$ 433.07	\$ 433.07	\$ 433.07
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3,294.25	\$ 3,294.25	\$ 3,294.25

RECIBIMOS

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION
CDU9712034K0

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO
HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 034/2016
4 (CUATRO)

ESTIMACIÓN No.

CONTRATIST. CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARI/ PERÍODO: DEL 09 AL 15 DE MAYO 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

DEMOLICIONES

PRELOMINARES

57,671.21

20,384.45

37,286.76

EXTRAS

158,863.32

SUBTOTAL	216,534.53
I.V.A.	34,645.52
TOTAL	251,180.05

FOR EL CONTRATISTA

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V EN ASOCIACION

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN

CHIHUAHUA, No. CONTRATO: 034/2016
CHIH.

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)

CONTRATISTA:

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA
S.A DE C.V. EN ASOCIACION

PERIODO:

DEL 09 AL 15 DE MAYO 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	

OBRA NORMAL

DEMOLICIONES

4 Carga y acarreo de escombros, incluye; carga de escombros con
maquinaria, camion de volteo, y acarreo a tiro autorizado M3 9,308.52 243.60 0.00 243.60 83.68 20,384.45


PRELIMINARES

9 Relleno con material de banco en capas de 20 cm de espesor,
compactado a 90% P.P.S considerando compactador tipo
ballarina. Incluye material, mano de obra, desperdicios, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. M3 1,318.46 213.25 0.00 213.25 174.85 37,286.76

EXTRAS

EXT-08 Elemento estructural para Friso, incluye; cimentaciones, muros,
columnas metálicas, losa, muros recubiertos con cantera de 2" de
espesor de acuerdo a planos estructurales PZA 0.00 3.00 2.00 3.00 146,860.20 146,860.20

EXT-11 Demolicion de concreto armado, incluye; maquinaria, herramienta
y mano de obra M3 0.00 86.65 66.52 86.65 596.28 12,003.12

POR EL CONTRATISTA

CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A DE C.V. EN ASOCIACION


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
	CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 4	PERIODO: 09 AL 15 DE MAYO 2016	CROQUIS
---------------------	--------------------------------	---------

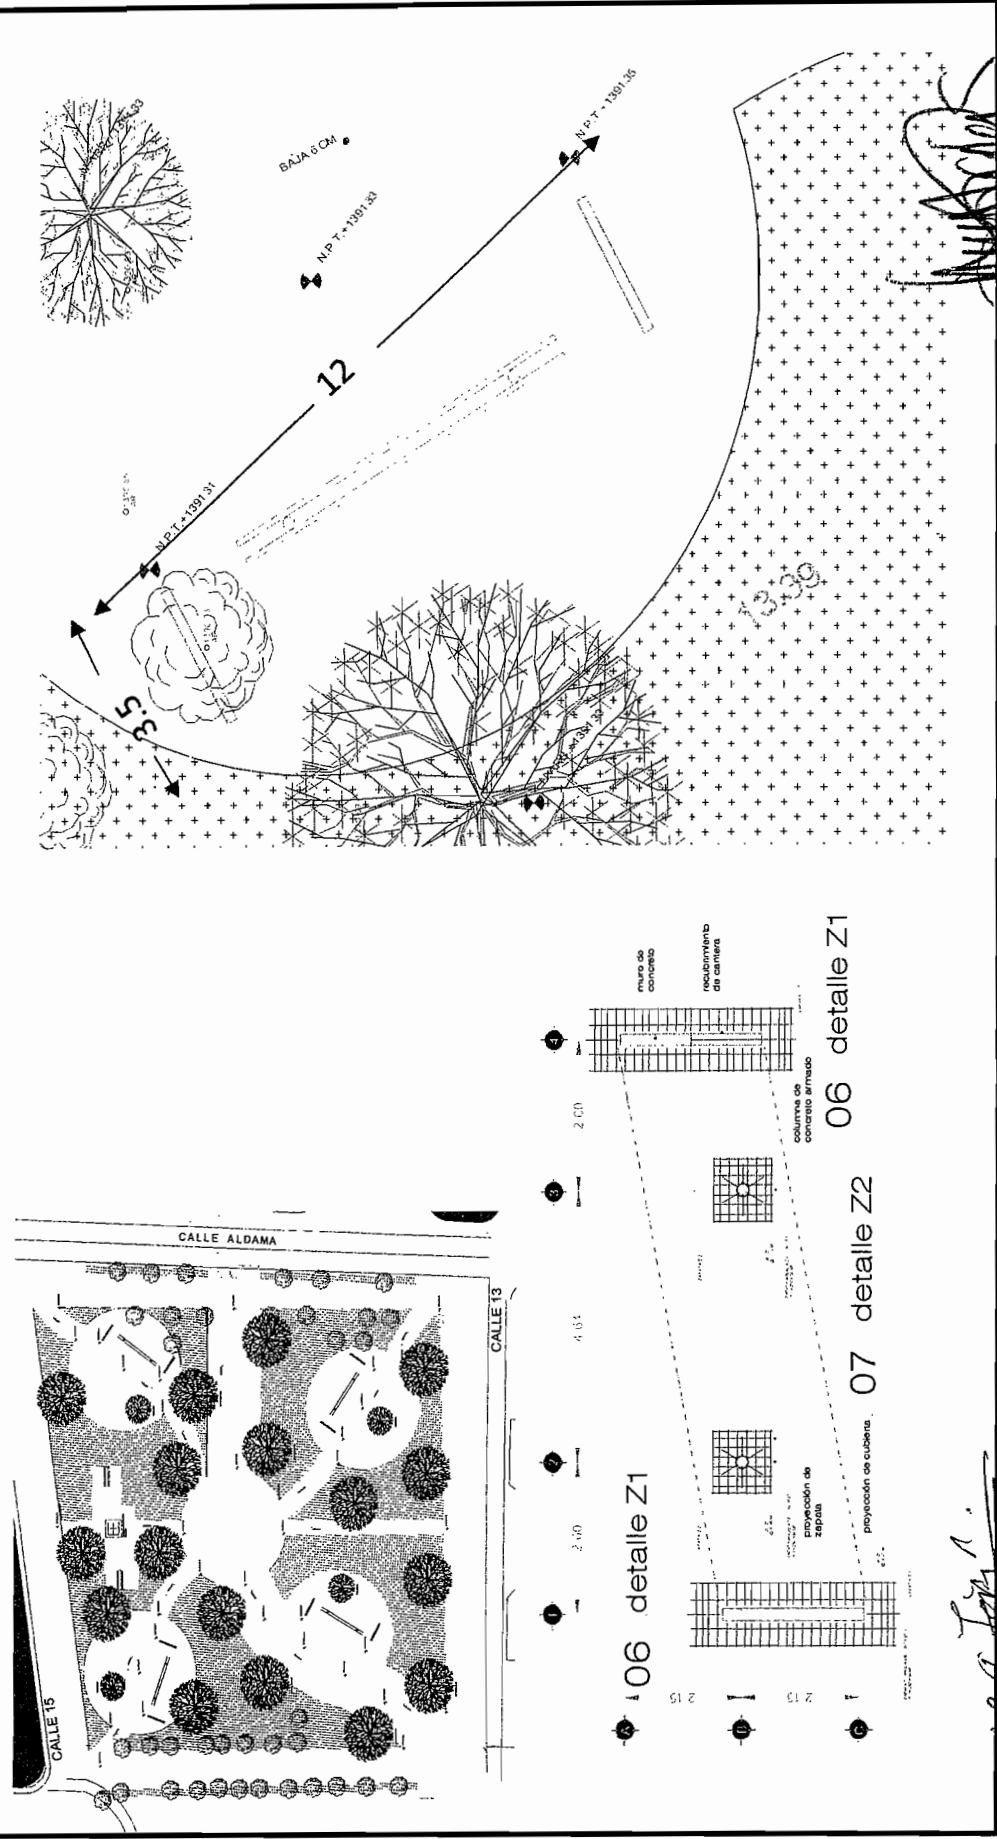

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION: 4 PERIODO : PERIODO: 09 AL 15 DE MAYO 2016

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR 213.25
---------	-------------------------------------

92 Japs 1.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:




OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 4

PERIODO: 09 AL 15 DE MAYO 2016

CROQUIS

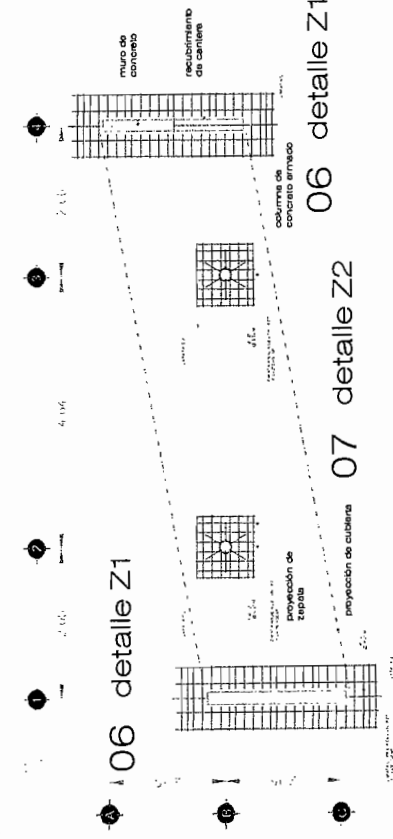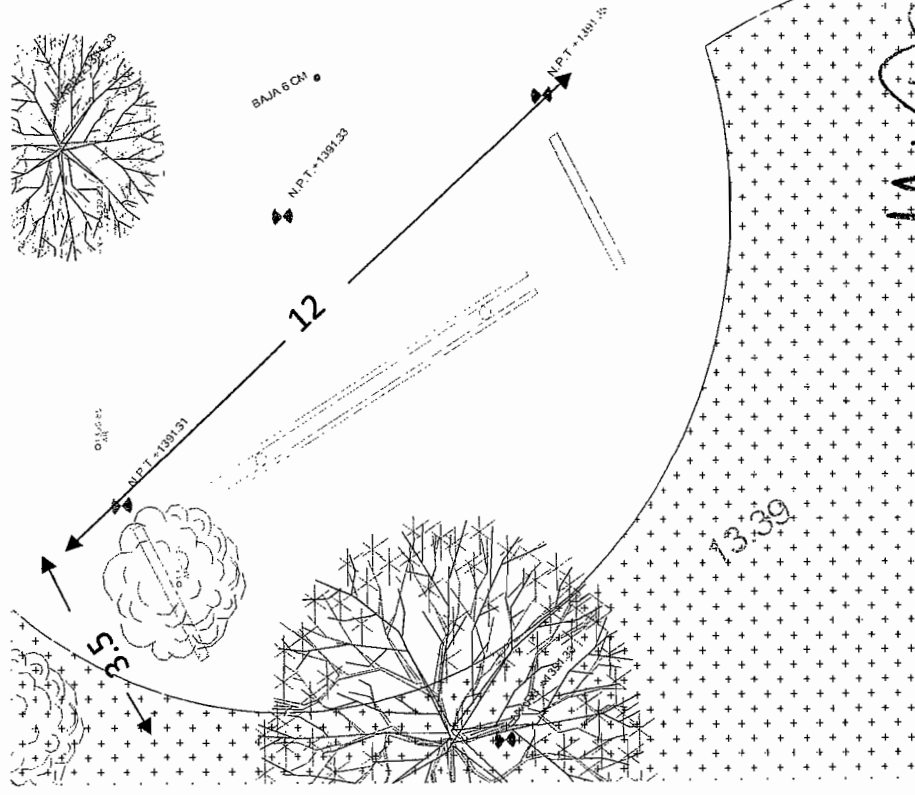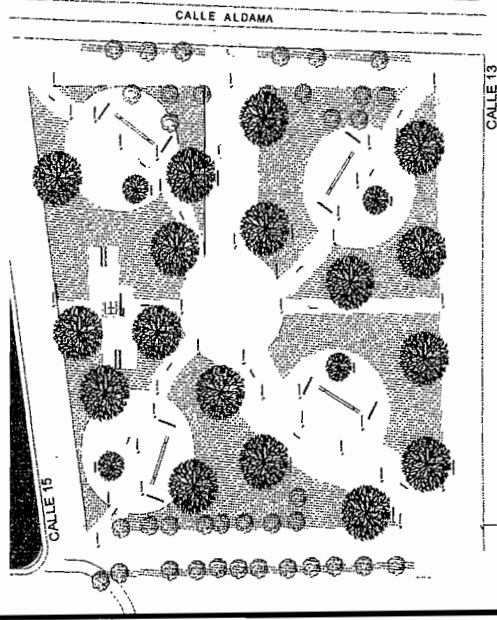

[Handwritten signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten signature]

ARQ. IVONNE DAYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 034/2016

TRAMO:





OBRA : CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION

No DE ESTIMACION: 4

PERIODO: 09 AL 15 DE MAYO 2016

CROQUIS

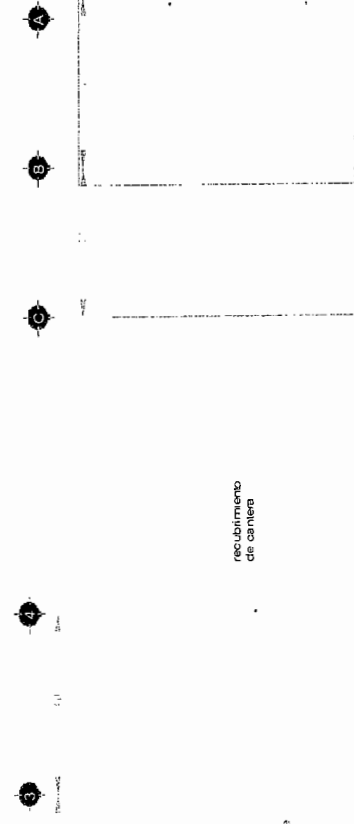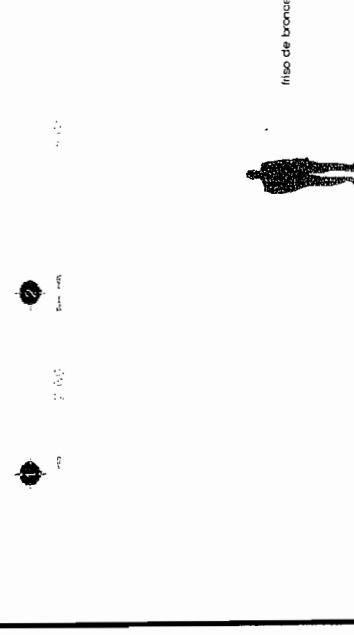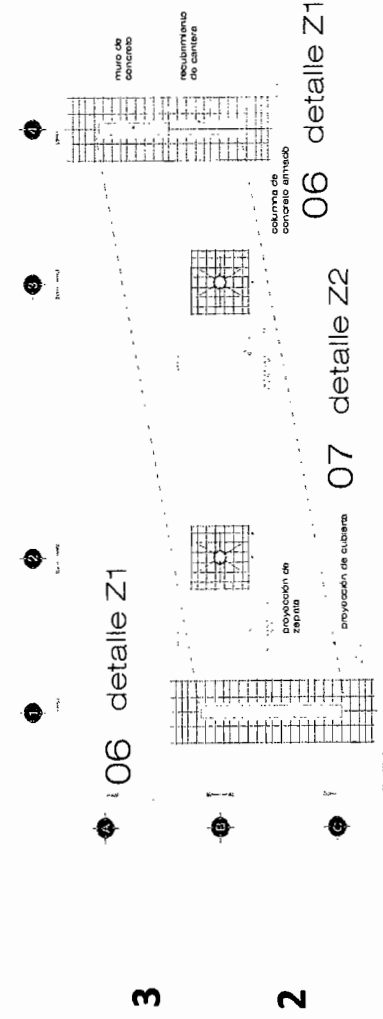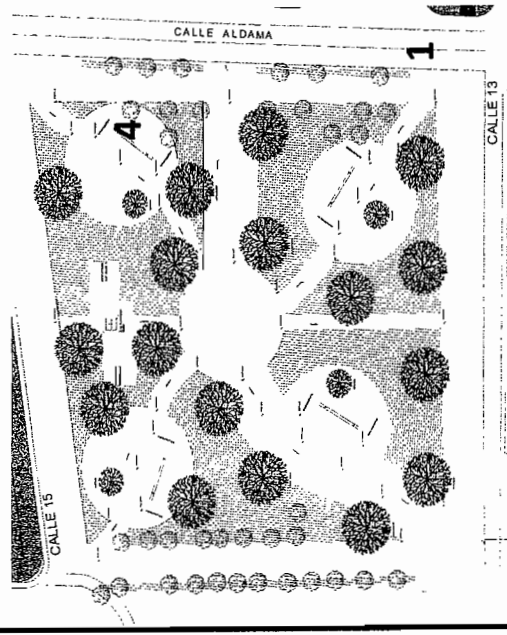

02 elevación frontal

03 elevación lateral

[Signature]

[Signature]

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA EN ASOCIACION

CONTRATO : 034/2016	TRAMO:
CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN LA CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V. Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION
OBRA :	CONTRATIS

No DE ESTIMACION:	4 PERIODO : DEL 09 AL 15 DE MAYO 2016
-------------------	---------------------------------------

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR 20.13

Top a.

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CORPORATIVO DULSA S.A DE C.V.
Y AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION



**CORPORATIVO DULSA S.A. DE C.V. Y
AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION**

**Reporte Fotográfico No.4
ESTIMACION**

FECHA: 16/mayo/2016

PERIODO: 09/mayo/2016 – 15/mayo/2016

**OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA LOS FRISOS EN EL
CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN: CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA
NUMERO DE CONTRATO: 034/2016**



**ARQ. IVONNE E. AYALA SILVA
CONTRATISTA**

**ING. ARTURO LOPEZ RIOS
SUPERVISOR OPM**

OBRA: PLAZA FRISOS



Carga y acarreo de
escombros, incluye; carga
de escombros con
maquinaria, camión de
volteo, y acarreo a tiro
autorizado


FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

J. A. Tapia

OBRA: PLAZA FRISOS

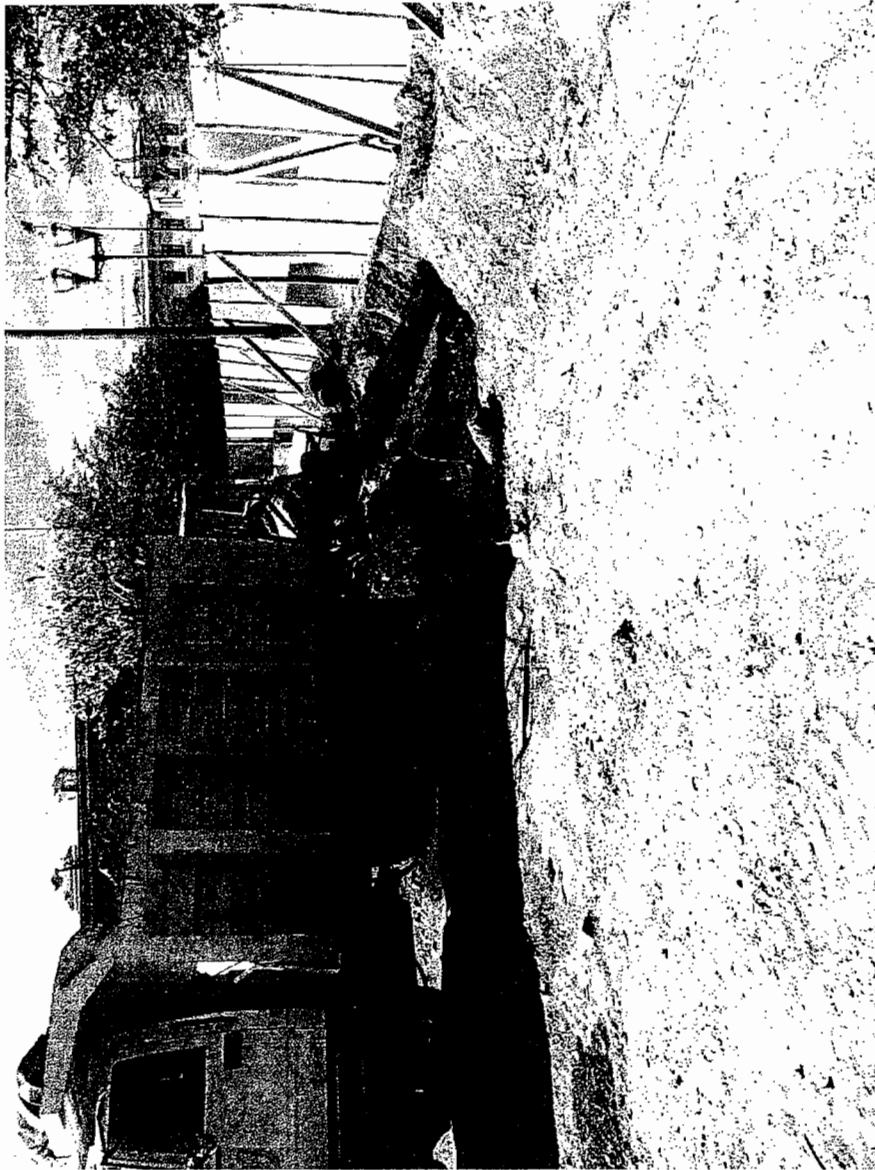

Carga y acarreo de
escombro, incluye; carga
de escombro con
maquinaria, camión de
volteo, y acarreo a tiro
autorizado

J. A. Torres



OBRA: PLAZA FRISOS



Relleno con material de banco en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S considerando compactador tipo bailarina. Incluye material, mano de obra, desperdicios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

[Handwritten signature]

OBRA: PLAZA FRISOS

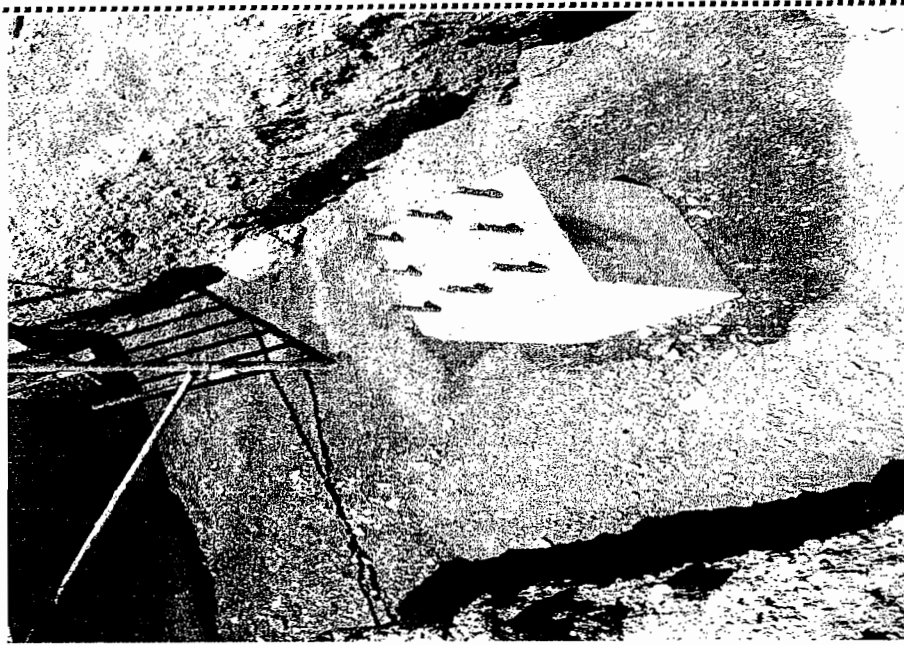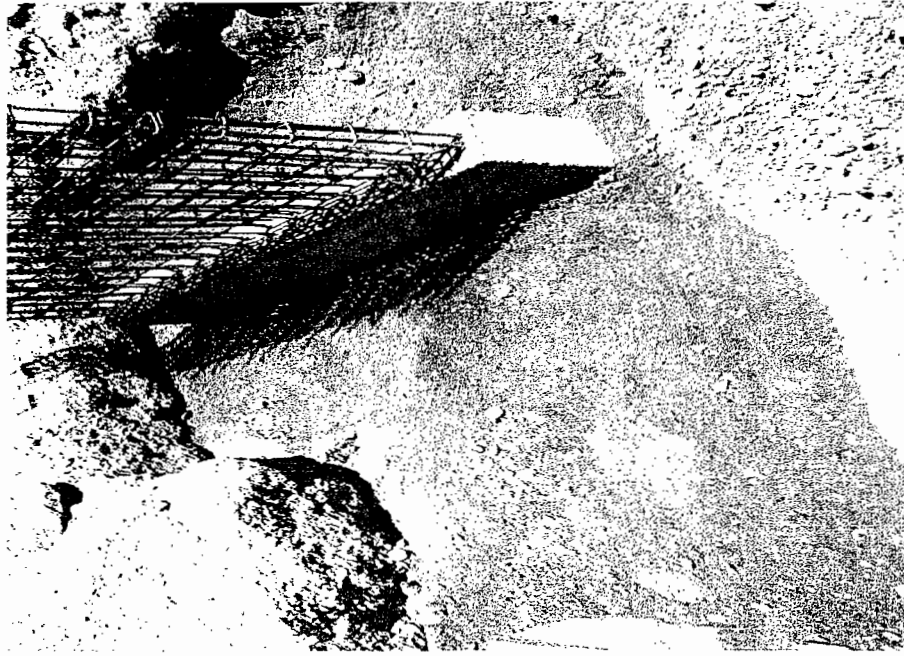

Elemento estructural para
Friso, incluye;
cimentaciones, muros,
columnas metálicas, losa,
muros recubiertos con
cantera de 2" de espesor de
acuerdo a planos
estructurales


J. Lopez

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14


OBRA: PLAZA FRISOS

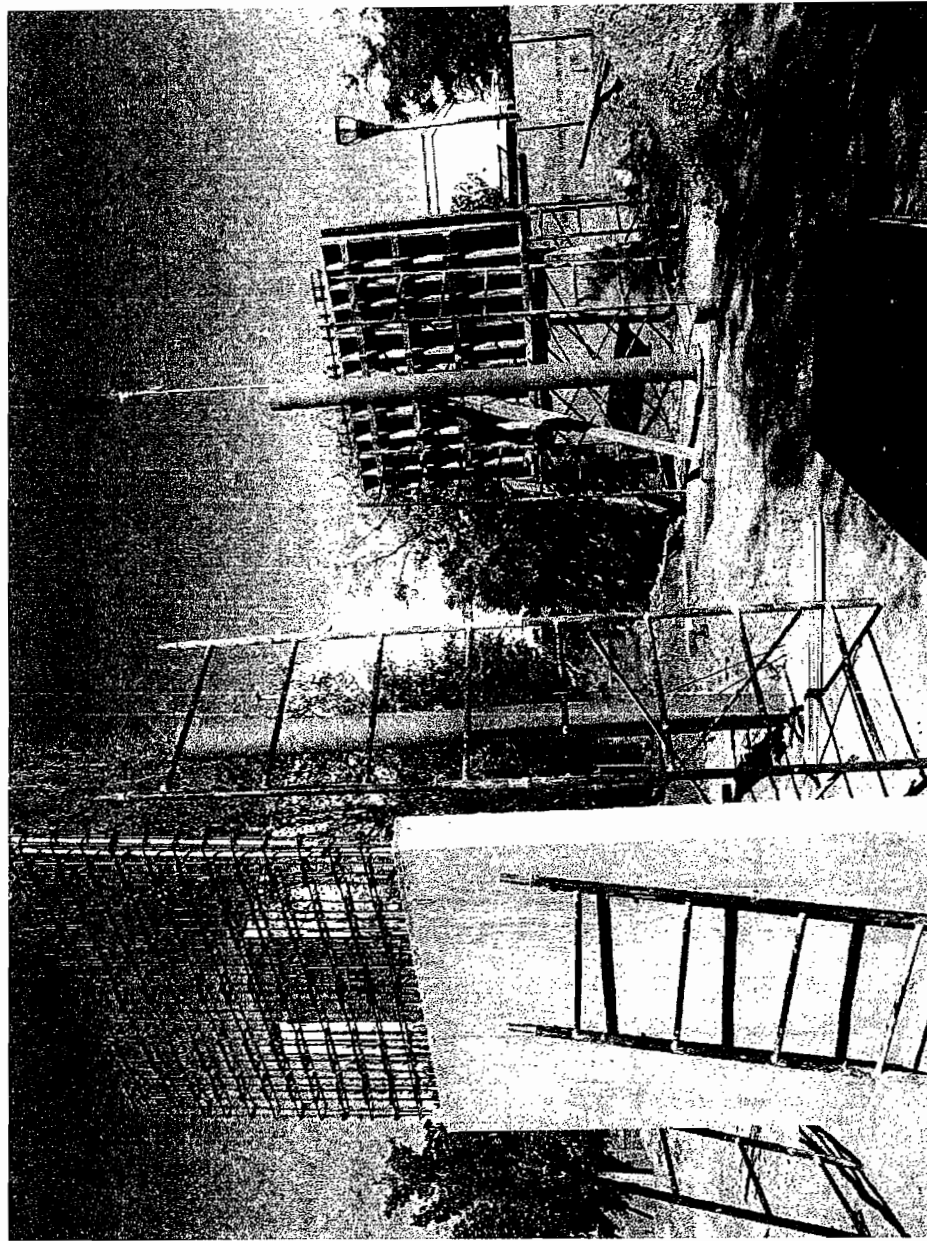

Elemento estructural para
Friso, incluye;
cimentaciones, muros,
columnas metálicas, losa,
muros recubiertos con
cantera de 2" de espesor de
acuerdo a planos
estructurales

J. J. J.

OBRA: PLAZA FRISOS

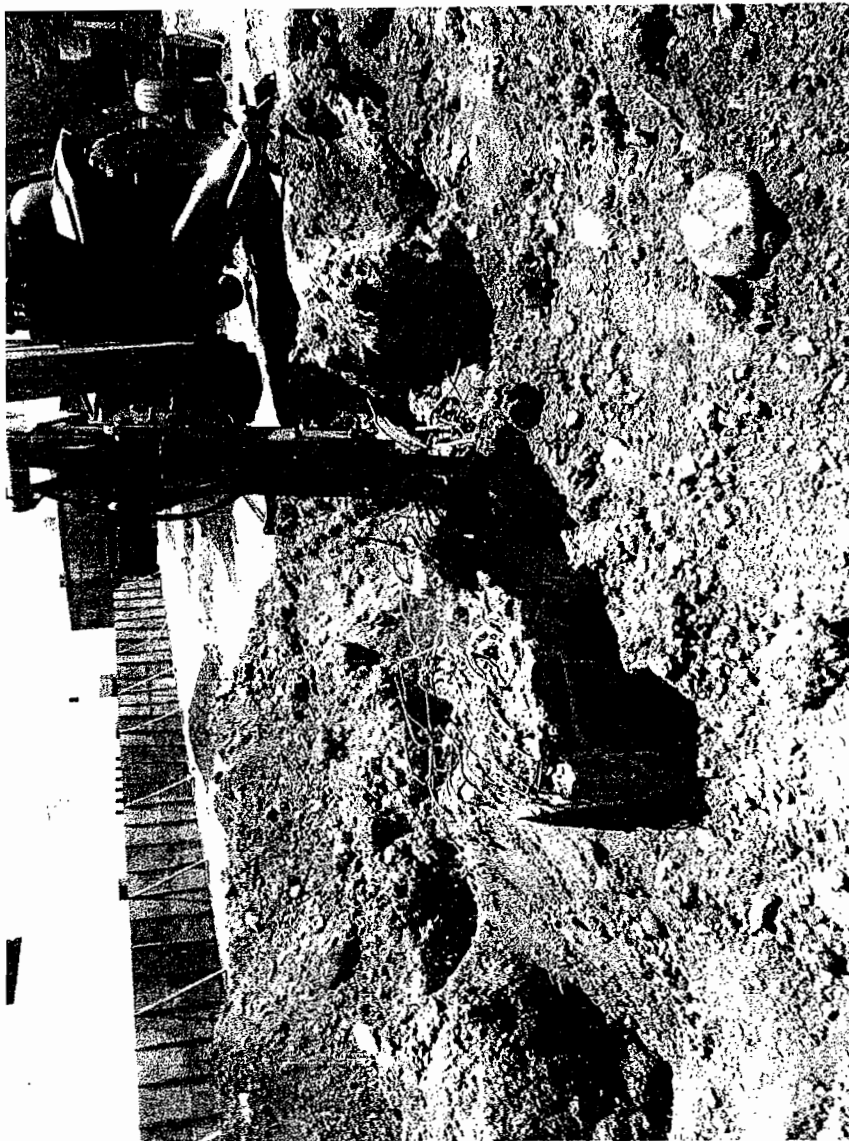

Demolición de concreto
armado, incluye;
maquinaria, herramienta y
mano de obra

[Handwritten signature]

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14

OBRA: PLAZA FRISOS



Demolición de concreto
armado, incluye;
maquinaria, herramienta y
mano de obra

[Handwritten signature]

FOR 7.5 CONS 09

REV. 02

FECHA DE REV. 03/06/14
