



AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
R.F.C. AAR901228868
CALLE ORTIZ DE CAMPOS NO. 1103
COLONIA SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
C.P. 31203

REFERENCIA: A844
FOLIO FISCAL SAT:

C15F7FE5-B28C-4716-842D-8EB01B770FDA

Certificado CSD: 00001000000202597019

Certificado SAT: 00001000000301251152

Fecha emisión: 2016-09-29T17:00:05

Fecha certificación: 2016-09-29T18:12:50

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI).

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL	
CALLE: ORTIZ DE CAMPOS	NO. EXT.: 1103	NO. INT.	
COLONIA: SAN FELIPE	LOCALIDAD: CHIHUAHUA	MUNICIPIO: CHIHUAHUA	
ESTADO: CHIHUAHUA	PAÍS: MÉXICO	C.P. 31203	

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FACTURADO A:			
NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
R.F.C.: MCI651010V22			
CALLE: CALLE MINA	NO. EXT.: 408	NO. INT.	
COLONIA: CENTRO	LOCALIDAD:		
ESTADO: CHIHUAHUA	PAÍS: MEXICO	C.P.: 31000	

CONDICIONES DE ESTE DOCUMENTO:	
FORMA DE PAGO: Pago una sola exhibición	MÉTODO DE PAGO: 02Cheque Nominativo

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMON BOLIVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH	NO APLICA	1	\$ 217,749.14	\$ 217,749.14
ESTIMACION NUMERO 5 (CINCO ULTIMA)				
SEGUN CONTRATO NUM. 035/2016				
ALCANCE DE LA ESTIMACION 217,749.14				
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
0.2% I.C.I.C. 435.50				
0.2% C.M.I.C. 435.50				
0.2% D.I.F. 435.50				
SUMA 1,306.50				
NETO A RECIBIR 251,282.50				
FIRMA DEL CONTRATISTA				
ING. JUAN GABINO DURAN RODRIGUEZ				
REPRESENTANTE LEGAL				



CANTIDAD CON LETRA:

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)

DESCUENTO:

SUBTOTAL: \$ 217,749.14

I.V.A. 16.00% \$ 34,859.86

DESCUENTOS: \$ -

I.V.A. RETENIDO: \$ -

SECODAM

(0.50%): \$ -

TOTAL: \$ 252,588.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[11.0]c15f7fe5-b28c-4716-842d-8eb01b770fda|2016-09-29T18:12:50|Aubk4EEHMBZvhaJbkiqdxpglyyyx3jonk5djY45eLIGKT8Fn82qL2YmsPpK1UDdAPdsCb4sji8Wx4E47xIEBtYhXAHy8mezOBoiWMzL8umrNlrrHnQGcrV3jdt+i7ab0F3YSBxolS5jIO98JATSzHcTwCSAAE29kZbEoUkA=|00001000000301251152|

SELLO DIGITAL CFDI:

Aubk4EEHMBZvhaJbkiqdxpglyyyx3jonk5djY45eLIGKT8Fn82qL2YmsPpK1UDdAPdsCb4sji8Wx4E47xIEBtYhXAHy8mezOBoiWMzL8umrNlrrHnQGcrV3jdt+i7ab0F3YSBxolS5jIO98JATSzHcTwCSAAE29kZbEoUkA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2/GDC/cMOMnGPWwXaEr//HK1Bxsd4rNic4qH5kiKOMm1InJoedh82FTFrOeZQVjchEXEvWUvj8tB0mJO3+ciug7BYC7iIXxTNYIAEeunuIgcslPDajYGKcxtwOx1H9U/TH48gNe57D5fTBxx+ag8qWDCljBwG7HTC/goI98=



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
AAR901228868	AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C15F7FE5-B28C-4716-842D-8EB01B770FDA	2016-09-29T17:00:05	2016-09-29T18:12:50	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$252,589.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: MUNICIPAL	CONTRATO No. 035/2016	CONTRATADOS
OBRA: RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMON BOLIVAR Y A VENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACIÓN No. 5 ULTIMA (CINCO ULTIMA)	\$ 6,964,472.22 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 01 AL 9 AGOSTO 2016	
UBICACIÓN: 0	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 252,589.00 CON IVA
CONTRATISTA: AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,830,631.32 CON IVA
RFC AAR901228868	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 3,083,220.32 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 217,749.14	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 217,749.14	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 435.50
0.2% C.M.I.C	\$ 435.50
0.2% D.I.F.	\$ 435.50

SUMA DESCUENTOS \$ 1,306.50

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 217,749.14
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 217,749.14
I.V.A.	\$ 34,839.86
TOTAL	\$ 252,589.00

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,306.50
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 251,282.50

AUTORIZO

ARQ. GABRIELA FLORES HURTADO
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO

SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ELABORO

AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

OFICIO No. DG-3104/2016

5 de Agosto de 2016

ING. JUAN GABINO DURÁN RODRÍGUEZ
AXIS ARQUITECTURA, S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 5 de Agosto del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Restauración y equipamiento de "Quinta Touche"**, ubicado en el Centro Histórico entre las calles del Paseo Simón Bolívar y avenida Independencia, II etapa, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. **035/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-110	Suministro e instalación de gabinete para Interruptor termomagnético nuevo en muro de tablaroca existente incluye demolición, sujeción, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	2	pza	\$ 3,381.69
EXT-111	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x200amperes 600VCA SQUARE D, incluye interconexión a centro de carga existente, cableado calibre 1/0, tubo flexible de 2", tubo de pvc pesado de 2" y todo lo necesario para su correcta ejecución	1	pza	\$ 13,372.56
EXT-112	Trabajos de entubado de equipo minisplit y tomacorriente de servidor incluye tubería de pvc pesado de 2", caja para registro eléctrico de plástico, cable cal. 12 demolición, conectores, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	2	pza	\$ 547.16
EXT-113	Suministro y colocación de Pasador phillips Zamak de soprano de cuadro para ventana superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	27	pza	\$ 462.34

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIAMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO*

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

OFICIO No. DG-3104/2016

EXT-114	Suministro e instalación de botaguas de 2x2 para puerta ventana de 0.90 mts de largo, incluye: material, mano de obra, detallado de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta-ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	28	pza	\$	837.87
EXT-115	Suministro y colocación de pasador retractil de latón antiguo de 3" tenco modelo 250 en ventana en ático. Incluye: Pasador, mano de obra, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$	432.66
EXT-116	Trabajos en ventana superior de puertas en planta baja de 1.26 x 0.45 mts en ajuste de dimensiones, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye: madera para perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$	1,879.07
EXT-117	Suministro y colocación de placa de bronce fundida en bastidor de acero al carbón, y pintada para descripción de datos importantes del general Toribio Ortega al calce de la pieza de bronce. Incluye: accesorios de fijación, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$	8,124.57

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Arq. Gabriela Florez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

OFICIO No. DG-3121/2016

5 de Agosto de 2016

ING. JUAN GABINO DURÁN RODRÍGUEZ
AXIS ARQUITECTURA, S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 5 de Agosto del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Restauración y equipamiento de "Quinta Touche"**, ubicado en el Centro Histórico entre las calles del Paseo Simón Bolívar y avenida Independencia, II etapa, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. **035/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-118	Suministro y colocación de sanitario color blanco venus castel eco blanco. Incluye asiento, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pijas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	3	pza	\$ 3,640.95
EXT-119	Suministro y colocación de lavabo barbados rectangular blanco. Incluye llave monomando oslo alta cromo pulido, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, pijas, conectores de hule, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	3	pza	\$ 4,738.74
EXT-120	Suministro y colocación de mingitorio en seco, Gobi TDS B. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	1	pza	\$ 7,246.64
EXT-121	Restauración en balastrada inferior de 0.73 cm consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	23	ml	\$ 2,022.28

Camino a la
Presa Chuviscar No. 105
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Ext. 111 y 112
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIAMOS
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-3121/2016

EXT-122	Restauración en balaustrada superior de 0.81 cm consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	17	ml	\$ 2,068.33
EXT-123	Suministro e instalación de gabinete de 97x55 cm Sienna sencillo color chocolate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	pza	\$ 3,153.27
EXT-124	Suministro e instalación de gabinete Coruña.50 Gris/Teka. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 4,932.09

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Arq. Gabriela Florez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Presa Chuvísar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	095/2016				TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ				CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-118	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de sanitario color blanco venus castel eco blanco. Incluye asiento, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, cuello de cera, pilas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				
ES PLANTA ALTA		2.00 PZAS		
O PLANTA ALTA		1.00 PZA		3.00 PZAS

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING SERVANDO CHAVEZ C.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



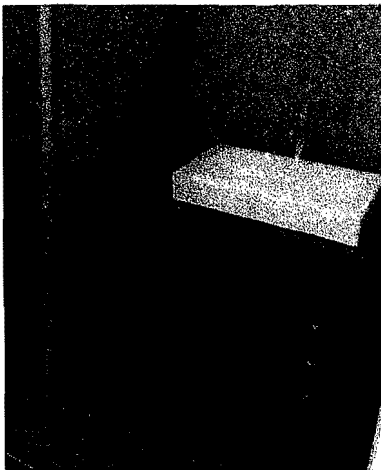
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016				TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUHE				CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	501119	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	--------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXF-119	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de lavabo barbeado rectangular blanco. Incluye llave manomando Oslo alta cromo pulido, llaves de retención con alimentador de manguera metálica, pljas, conectores de hule, taquetes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	BAÑOS DOBLES PLANTA ALTA	2.00 PZAS		2.00 PZAS

ARQ GABRIELA FLOREZ MURTADO
SUPERVISOR D.O.P.M

ING. SERGIO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ING SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ING SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



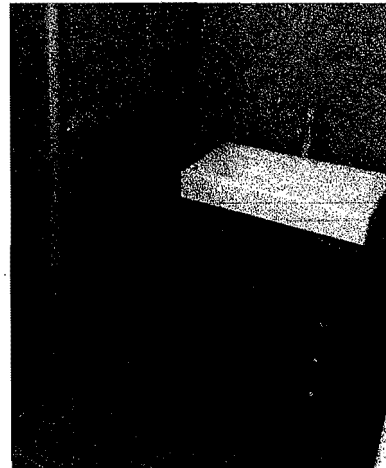
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016				TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE				CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-123	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalación de gabinete de 97x55 cm. Sienna sencillo color chocolate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PLANTA ALTA 2.00 PZAS		2.00 PZAS

ARQ GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



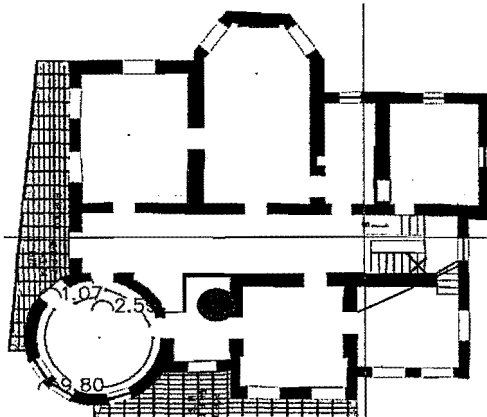
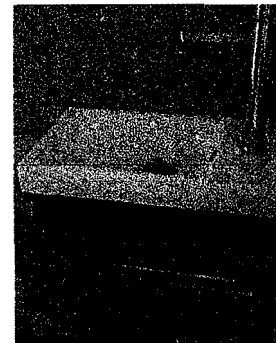
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016				TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE				CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	SULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	---------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-124	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalación de gabinete Coruña 50 Gris/Teka. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
PLANTA ALTA	1	PIEZA			1.00 PZAS

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



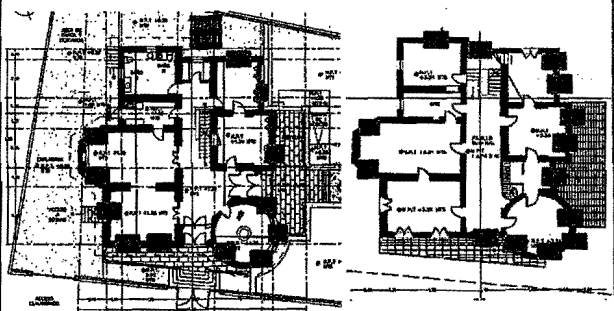
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATIST	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 ULTIMA	PERIODO	07 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-113	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de Pasador philips Zamak de soprano de cuadro para ventana superior. Incluye: material, mano de obra, herramienta, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		EJE	UNIDAD	 PLANTA BAJA PLANTA ALTA	TOTAL 30.00
			PZA		
			CANTIDAD		
			30.00		

ARO GABRIELA FLOREZ MURABO
SUPERVISION D.O.R.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



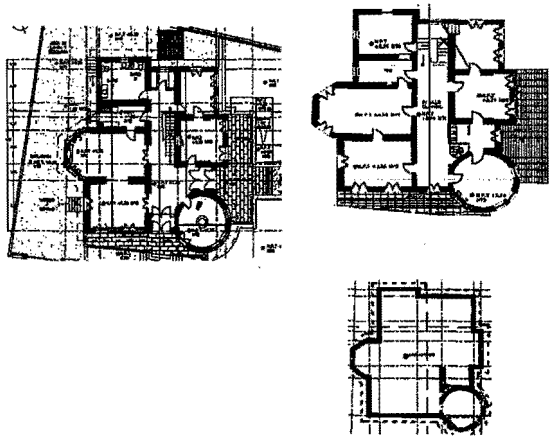
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2018		
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE		AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2010
--------------------	---------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-114	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalación de botagtas de 2x2 para puerta ventana de 0.90 mts de largo, incluye: material, mano de obra, detallado de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la puerta-ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.		EJE	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL 24.00
			PZA	24.00		

ARQ. GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



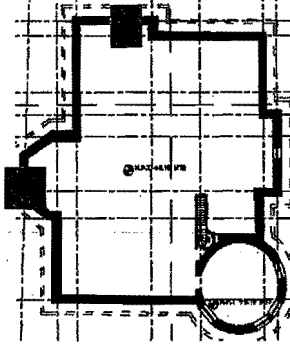
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-115	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de pasador retráctil de latón antiguo de 3" tenoo modelo 250 en ventana en ático. Incluye: Pasador, mano de obra, detallado (pintura) de puerta en área de trabajo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		EJE	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL 2.00
			PZA	2.00		

ARQ GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISOR C.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



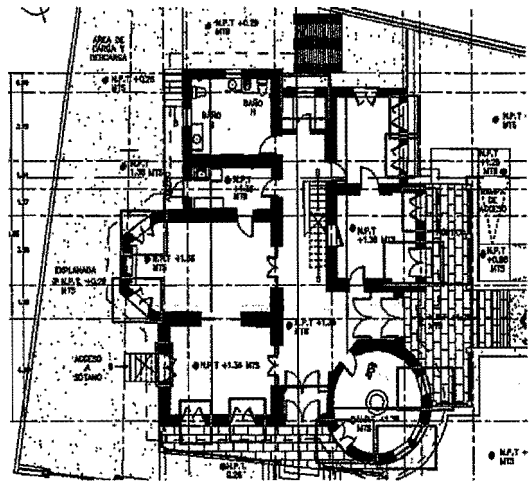
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATIST	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-116	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Trabajos en ventana superior de puertas en planta baja de 1.26 x 0.45 mts en ajuste de dimensiones, resane, cepillado, lijado, detallado y pintura derivadas del ajuste. Incluye, madera de perfilado de aristas en marco de cristales, pulido de marco, reemplazo de madera, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área donde se encuentra la ventana, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.		EJE	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL 13.00
			PZA	13.00		

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M.

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	033/2016	TRAMO:
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA: AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 OUTINA	PERIODO:	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	----------	----------------------

CONCEPTO	EXE-121	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Restauración en balustrada inferior de 0.75 cm consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
BALAUSTRADO INFERIOR ACCESO PRINCIPAL AV. SIMÓN BOLÍVAR	8.39			
BALAUSTRADO INFERIOR ACCESO PRINCIPAL AV. INDEPENDENCIA	10.13			
				18.52 ML

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION B.O.P.M.ING. SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



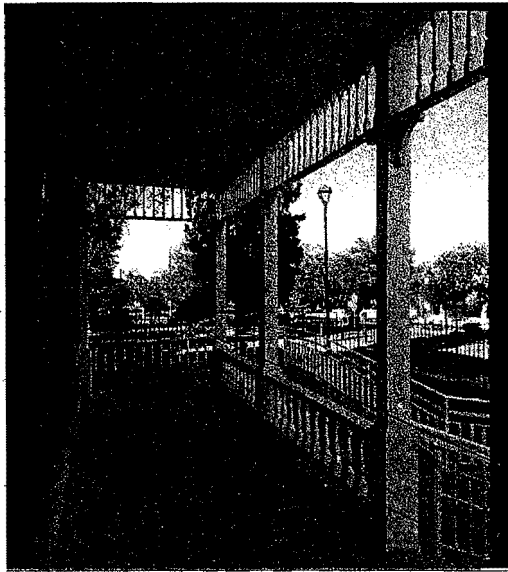
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ	CONTRATISTA
		AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 01111A	PERIODO	01 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------

CONCEPTO	EXT-121	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Restauración en balaustrade inferior de 0.73 cm consistientes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.			 BALAUSTRADO INFERIOR	

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	033/2016	TRAMO:
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA: AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5.01.01.01	PERIODO:	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	------------	----------	----------------------

CONCEPTO	EXT-122	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Restauración en balustrada superior de 0.81 cm. consistentes en lijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.		BALAUSTRADO SUPERIOR ACCESO PRINCIPAL AV. SIMÓN BOLÍVAR BALAUSTRADO SUPERIOR ACCESO PRINCIPAL AV. INDEPENDENCIA		25.52 ML

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



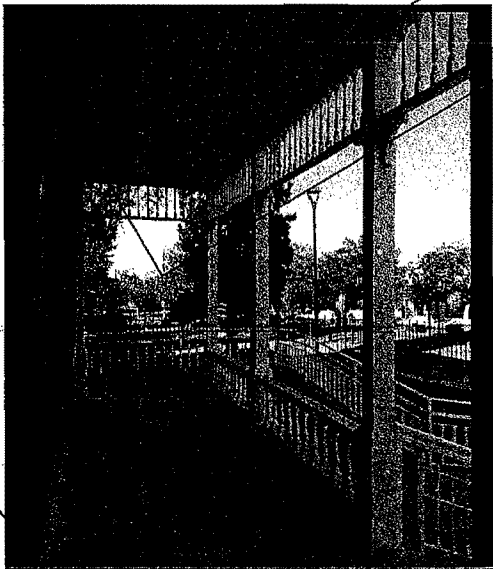
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	085/2016				TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHÉ				CONTRATISTA	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 UTIFA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	---------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-122	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Restauración en balaustrada superior de 0.81 cm constantes en fijado, detallado reposición de piezas y pintura. Incluye, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza fina del área, retiro de basura y todo lo necesario para su correcta ejecución.		BALAUSTRADO SUPERIOR		

ARQ GABRIELA FLORES HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING SERVANDO CHAVEZ O.
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



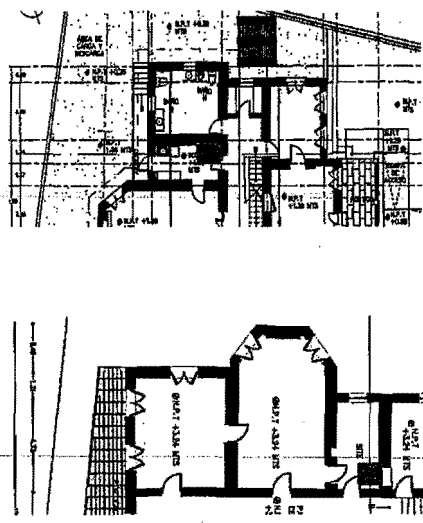
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-110	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalación de gabinete para Interruptor termomagnético nuevo en muro de tablaroca existente Incluye demolición, sujeción, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		EJE	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL 2.00
		PZA		2.00		

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3 ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-111	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 3x200amperes 600VCA SQUARE D, incluye Interconexión a centro de carga existente, cableado calibre 1/0, tubo flexible de 2", tubo de pvc pesado de 2" y todo lo necesario para su correcta ejecución		EJE	UNIDAD	CANTIDAD		
			PZA	1.00		
						TOTAL 1.00

ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M.

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ING OMAR-ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



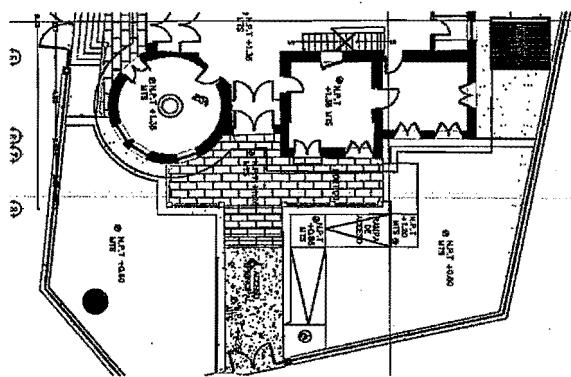
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	035/2016	TRAMO:	
OBRA:	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE QUINTA TOUCHE	CONTRATISTA:	AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	5 ULTIMA	PERIODO	01 AL 09 AGOSTO 2016
--------------------	----------	---------	----------------------

CONCEPTO	EXT-117	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de placa de bronce fundida en bastidor de acero al carbón, atornillado y pintado para descripción de datos importantes del General Toribio Ortega al calce de plaza de bronce con dimensiones 35 cm x 45 cm. Incluye: Accesorios para fijación, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		EJE	UNIDAD	CANTIDAD		
			PZA	1.00		
						TOTAL 1.00



ARQ GABRIELA FLOREZ HURTADO
SUPERVISION D.O.P.M

ING OMAR ALEJANDRO LOPEZ BARRAZA
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NOTA N° 34

16 JUNIO 2016



Con esta nota y fecha se hace entrega de actividades (colocación e instalación de cable de cobre para luminarias en sótano, se revisa, en voladizo de base de muros, tuberías, tuberías, suministro e instalación de gases de escape eléctricos, para abastecer con de medición



29 JULIO 2016

NOTA N° 35


Se realizaron trabajos eléctricos que consistieron en ranurado de banqueta para colocación de tubería para cables de conducción eléctrica, así como su reparación en la banquetta, se llevo a cabo limpieza en dintel, terminación de carpintería en puertas, ventanas y puerta, así como el término de la limpieza de la dintel de fachada, pulido en piso de sala principal (chiminera) y la colocación de sello en adosquin en el exterior.



NOTA N° 36

05 Agosto 2016



Se ingresan a revisión precios extras del número 110 al 117 y del 118 al 124. SE INGRESA ESTIMACIÓN N° 4 A REVISIÓN.



Nota N° 37

5 Agosto 2016

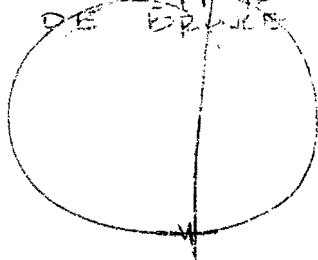
Con esta nota y fecha se entrega (entrega) DE REVISIÓN DE PRECIOS



Nota N° 38

3 Agosto 2016


Con esta nota y fecha se entrega a R Estimación A
Contratista N. 4. Se terminan trabajos de instalación
de ~~trabajos~~ detalles de Carpintería, colocación de placa
de ~~trabajos~~ trabajos eléctricos, tuberías sanitarias.



Nota N° 39

9 Agosto 2016

Con esta nota y fecha se le hace saber que los trabajos quedan
terminados a la fecha de contrato, solicitando la revisión de
estimación No 5.



Nota N° 40

Con esta nota y fecha se hace constar la conclusión de
los trabajos objeto del contrato N° 039/2016 relativo
a restauración y equipamiento de Quinta Touche ubicado
en el Centro Histórico entre las calles del Paseo Simón
Bolívar y Avenida Independencia II etapa por lo que se
cierra administrativa y técnicamente la presente obra.

