

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua. México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

RFC:MCI651010V22

FACTURA**Folio Fiscal:**

4FB97D82-61EE-4962-ACF7-8AFE4BDC4C02

No. de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000402234727No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301251152Fecha y hora de certificación:
2016-06-17T15:47:29Lugar, fecha y hora de emisión:
México, Chihuahua 2016/06/17 T 15:47:29Serie y Folio:
A222

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA No.2757 ESTIMACION NUMERO 1 SEGUN CONTRATO NUM. 043/2016  FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANJE DE LA ESTIMACION \$ 61,009.11 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% I.C.I.C. \$ 122.02 0.2% DIF \$ 122.02 0.2% CMIC \$ 122.02 SUMA \$ 366.06 NETO A RECIBIR \$ 70,404.5	1.00	\$61,009.11	\$61,009.11

**Total con letra:**
Setenta mil setecientos setenta pesos 57/100.-MXN**Forma de Pago:**
Pago en una sola exhibición.**Método de Pago:**
No identificado
Número de Cuenta:
No Aplica**SUBTOTAL** \$61,009.11
IVA 16.00% \$9,761.46**TOTAL** \$70,770.57**Sello digital del Emisor:**

VMS5jKD6qFAvvalN2Rwm5kZXzvl+zUjRir9xneR7WorJN4DbgyYLJX8TrzfzWg3LYziGFM4M6YAdzsC61g0wZ5EWi189MLGeYeGekocFr4ZcPLyme5KIZBozKuFyH7cJG2XGtKiJ5RPINBrxbcb3wmqkK0mJKmGTAbYbsPQcWknxEd9AUrJ8gJq5b4d20P2NJ6DtppeV2ogFWNKeAQHpURpRSdfiww7yta8LqM4dMmWERDh3DICO2bMP3Kcpeuq0XpcTWvf3bNonSbuk741WrqDMYVWlq1ugkNnJ4dbGgiRRCIuq2aGCuLQqyKi5NSEQnJr47j7bGaZbaFGrg==

Sello digital del SAT:

CjffXWF3zfkHnKbTjc45bBMhN7fS0Upped4rGEKUbdY56mON+N10puQLGKbpLgQo/a1DM5xjnl1xEee/3YPpGoDhFKGDMfLPVlQ0pQErfJlwmVgx+/oM7KqYPHMQgX7ZP+ZTZSxgAUs7/V4xUeKsOX79hFplaLs9mpzD4j48=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4fb97d82-61ee-4962-acf7-8afe4bdc4c02|2016-06-17T15:47:29|VMS5jKD6qFAvvalN2Rwm5kZXzvl+zUjRir9xneR7WorJN4DbgyYLJX8TrzfzWg3LYziGFM4M6YAdzsC61g0wZ5EWi189MLGeYeGekocFr4ZcPLyme5KIZBozKuFyH7cJG2XGtKiJ5RPINBrxbcb3wmqkK0mJKmGTAbYbsPQcWknxEd9AUrJ8gJq5b4d20P2NJ6DtppeV2ogFWNKeAQHpURpRSdfiww7yta8LqM4dMmWERDh3DICO2bMP3Kcpeuq0XpcTWvf3bNonSbuk741WrqDMYVWlq1ugkNnJ4dbGgiRRCIuq2aGCuLQqyKi5NSEQnJr47j7bGaZbaFGrg=|00001000000301251152||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

HCO110712730

Folio Fiscal

4FB97D82-61EE-4962-ACF7-
8AFE4BDC4C02

Total del CFDI

\$70,770.57

Nombre o Razón Social del
Emisor

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-17T15:47:29

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T15:47:29

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

CFA110411FW5

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 043/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA No. 2757	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 457,416.37 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 02-May al 10-Jun-16	
UBICACIÓN: C. EUCALIPTO Y C. 2a, COL. VISTA CERRO GRANDE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 70,770.57 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 70,770.57 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 45,824.10	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 15,185.01	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 61,009.11	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 122.02
0.2% INSTITUTO	\$ 122.02
0.2% D.I.F.	\$ 122.02
SUMA DESCUENTOS	\$ 366.06

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 61,009.11
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 61,009.11
I.V.A.	\$ 9,761.46
TOTAL	\$ 70,770.57

(CON LETRA)

(SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 57/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 366.06
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 70,404.50

AUTORIZO

ELABORO

ING. EVER GARCIA PALMA
RESIDENTE D.O.P.M

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



CHIHUAHUA, CHIH.,

10 DE JUNIO

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 70,404.51
(SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 043/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 457,416.37 INCLUYE CONVENIO
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA NO. 2757.

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	61,009.11
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$	-
	SUBTOTAL	\$	61,009.11
	IVA	\$	9,761.46
	TOTAL	\$	70,770.57
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
SANCION POR RETRASO 0.5%	0		
C.M.I.C. DEL 0.2%	122.02		
DIF 0.2%	122.02		
I.V.C.S 0.2%	122.02		
SUMA	366.06		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 457,416.37
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 70,770.57
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 70,770.57
POR EJERCER	\$ 386,645.80

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 571.14	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 122.02	\$ 293.03	\$ 122.02
ACUMULADO ACTUAL	\$ 122.02	\$ 864.17	\$ 122.02

R E C I B I M O S

HONORATE CODONOR S.A. DE C.V.
HCO110712730



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA NO. 2757,
MUNICIPIO: UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2A, COL. VISTA CERRO GRANDE
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO: 02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1
No. CONTRATO: 043/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		
	\$	45,824.10
EXCEDENTES		
	\$	15,185.01
EXTRAS		
	\$	-

SUBTOTAL \$	61,009.11
I.V.A. \$	9,761.45
TOTAL \$	70,770.56

POR EL CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION.

ING EVER GARCIA



OBRA:		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA NO. 2757.			
MUNICIPIO:		UBICADA EN CALLE EUCAUPTO Y CALLE 2A. COL. VISTA CERRO GRANDE			
CONTRATISTA:		HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.			
PERIODO:		02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016			
ESTIMACIÓN No.		1			
No. CONTRATO:		043/2016			
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES	
DESCRIPCION		UNIDAD		ACUM. ANTERIOR	
				VOL. ESTIMADO	
				PRECIO UNITARIO	
				IMPORTE	
OBRA NORMAL				\$ 45,824.10	

CIMENTACION Y PISO				\$ 45,824.10	
2 CIMENTACION				0	
2.1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.	M2	68.64	55.25	0
				55.25	8.54
2.2	DESPLAME DE TERRENO HASTA 20 CM ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO AL 90% DE SU P.V.S.M DEL AREA DESPALMADA, INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, Y DESALOJO DEL PRODUCTO DE ACARREOS FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL.	M2	68.64	55.25	0
				55.25	23.47
2.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE[NO SE PAGARAN SOBREANCHOS].	M3	3.5	0.342	0
				0.342	152.19
2.4	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE[NO SE PAGARAN SOBREANCHOS].	M3	35	14.4	0
				14.4	54.55
2.5	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO.	M2	26	18.36	0
				18.36	109.71
2.6	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	15	8.505	0
				8.505	66.18
					562.86

ARG. POR EL CONTRATISTA:
ARG. POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. EVER GARCIA



OBRA:	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA NO. 2757.
MUNICIPIO:	UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2A, COL. VISTA CERRO GRANDE
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No.	1
No. CONTRATO:	049/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
2.7	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS, DE ESPESOR, CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA DE PROCTOR. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MEDIDO COMPACTO.	M3	24	24	0	24	✓ 183.31	4399.44
2.8	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO DE 1.5X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:5. INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS, CON PROPORCION DE 1.5 LTS/M2. CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F' C =100 KG/M2.	M2	14	14	0	14	✓ 529.44	7412.16
2.9	CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	14	14	0	14	✓ 125.36	1755.04
2.1	CIMBRA APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4" INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	16	16	0	16	✓ 272.55	4360.8
2.11	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=2400 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 2.	KG	64	64	0	64	✓ 26.86	1719.04
2.12	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 3.	KG	178	178	0	178	✓ 26.86	4781.08
2.13	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 4.	KG	108	108	0	108	✓ 26.86	2900.88
2.14	FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE: VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3	M3	8.2	5.028	0	5.028	✓ 2647.66	13312.43

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. BRIAN WALTER HINOJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. EVER GARRIO



OBRA:	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA NO. 2757,
MUNICIPIO:	UBICADA EN CALLE EUCAUPTO Y CALLE 2A, COL. VISTA CERRO GRANDE
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1	
No. CONTRATO:	043/2016

CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			

OBRA EXCEDENTE											
2.7	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS, DE ESPESOR, CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA DE PROCTOR. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	24	19.165	0	19.165	✓	183.31	✓	3513.13	
2.9	CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	14	2.6	0	2.6	✓	125.36	✓	325.93	
2.1	CIMBRA APARENTE EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4" INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	16	0.8	0	0.8	✓	272.55	✓	218.04	
2.8	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:5. INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS, CON PROPORCION DE 1.5 LIT/M2. CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F' C = 100 KG/M2.	M2	14	19.578	0	19.578	✓	529.44	✓	10365.37	
2.11	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=2400 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 2.	KG	64	5	0	5	✓	26.86	✓	134.3	
2.12	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 3.	KG	178	17.45	0	17.45	✓	26.86	✓	468.7	
2.13	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 4.	KG	108	5.94	0	5.94	✓	26.86	✓	159.54	
										\$ 15,185.01	

POR EL CONTRATISTA:


ARG. BRUNO VILLERMINIOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO 043/2016	TRAMO:	UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA NO. 2757,	CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016

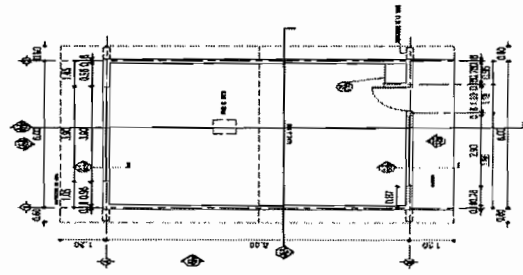[illegible]

55.25 M2	
----------	--

RESIDENTE

CONTRATISTA

1000

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016

RESIDENTE


CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.


[illegible]

 CONTRASTA

--	--

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016

RESIDENTE



1000

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016

~~RESIDENTE~~

CONTRATISTA

1000

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016

RESIDENT

CONTRATISTA

1000


CONTRATISTA

RESIDENTE






1000

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 02 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016

RESIDENTE

~~CONTRATISTA~~

FOTOGRAFIAS

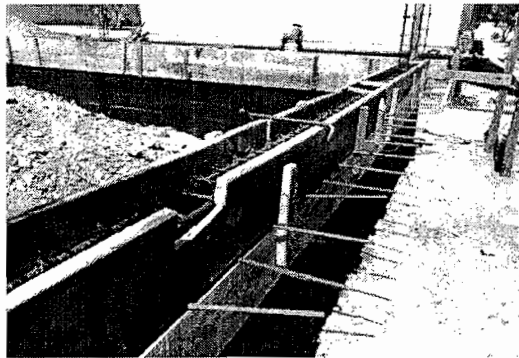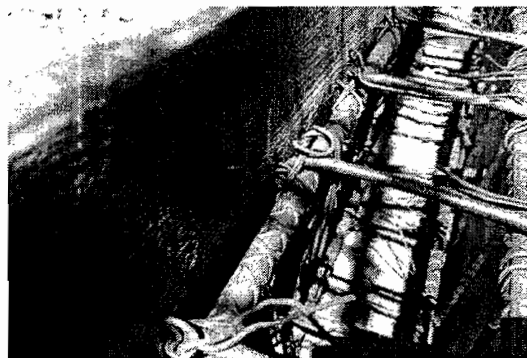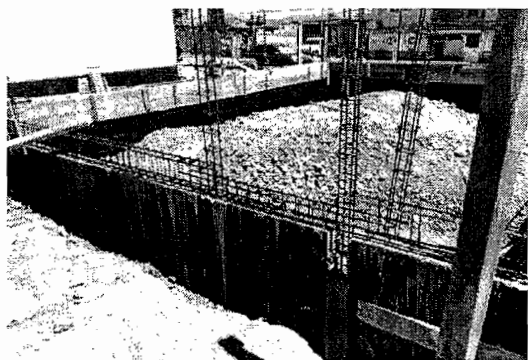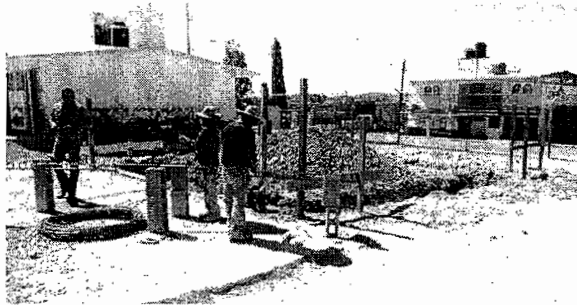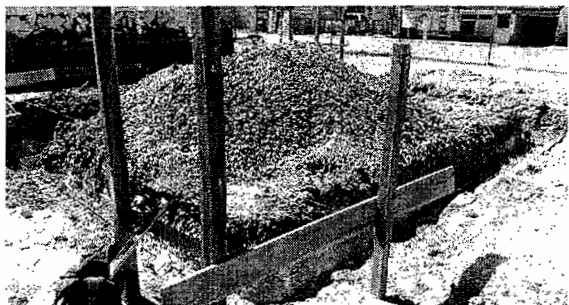

1

2
