

Ingeniería civil
objetiva s.a. de c.v.

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV
ICO970409973
Domicilio Fiscal
VALLARTA 4313 5
Col. GRANJAS 31160
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144179830

Factura No: 347

FOLIO FISCAL (UUID):

BE30E8F8-3401-4247-821A-00F31FB7911E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202136805

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-06-24T18:31:07

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-06-24T18:26:06

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA No. 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 24 junio 2016

Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	0	TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO ESTIMACIÓN No.1 (UNO) SEGÚN CONTRATO No. 056/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 525,280.00 AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$ 157,584.00 SUMA \$ 367,696.00 IVA \$ 58,831.36 TOTAL \$ 426,527.36 MENOS RETENCIONES D.I.F. DEL 0.2% \$ 1,050.56 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 1,050.56 C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 1,050.56 TOTAL RETENCIONES \$ 3,151.68 NETO A RECIBIR \$ 423,375.68	\$ 367,696.00	\$ 367,696.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS, 36/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 367,696.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 58,831.36
TOTAL: \$ 426,527.36

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jp+fc2005ED0M6idMq6alE7RxAuS2mPULVcglw9826BTYaVQZq+XbSz+q91TJ+c284JaxM80By+FuKbHxSZXSwPhLaSgwBzhdNUQcf898vmdZkN+IRf0ApqVf+s38258TYxSHYtbHYNJlrm07bAonkLJSOXCMNGI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

0MWRaIqFnH1DO+40aWV8cdmK+TXxw/Nwgrw6HCKTpyongSj8QYjhb3ISKWzMBzBVPInPgdlwCISH6MSh+Xe1wEdbHp06c7dYOBdE3+yRtdxaNlOyXH89EJSuJ9CVLMzJBSSNIK0V7V3NP4yzPbAdVBxeq3Y1wk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0|BE30E8F8-3401-4247-821A-00F31FB7911E|2016-06-24T18:31:07|jp+fc2005ED0M6idMq6alE7RxAuS2mPULVcglw9826BTYaVQZq+XbSz+q91TJ+c284JaxM80By+FuKbHxSZXSwPhLaSgwBzhdNUQcf898vmdZkN+IRf0ApqVf+s38258TYxSHYtbHYNJlrm07bAonkLJSOXCMNGI=|00001000000203495276|



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

ICO970409973

Folio Fiscal

BE30E8F8-3401-4247-821A-
00F31FB7911E

Total del CFDI

\$426,527.36

Nombre o Razón Social del Emisor

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-06-24T18:26:06

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-24T18:31:07

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203JS7

Imprimir



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PDM	CONTRATO No. 056/2016	CONTRATADOS
OBRA: TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 633,360.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 09 DE MAYO DE 2016 AL 27 DE MAYO DE 2016	
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 609,324.80 CON IVA
CONTRATISTA: INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC: ICO970409973	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 609,324.80 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
OBRA NORMAL.- <u>ALBAÑILERIA</u>	\$ 525,280.00	
OBRA EXCEDENTE.-		
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 525,280.00	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	1,050.56
0.2% I.C.I.C.	\$	1,050.56
0.2% D.I.F.	\$	1,050.56
SUMA DESCUENTOS	\$	3,151.68
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	525,280.00
AMORT ANTICIPO	\$	157,584.00
SUB-TOTAL	\$	367,696.00
I.V.A.	\$	58,831.36
TOTAL	\$	426,527.36
(CON LETRA)		
(CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	3,151.68
SALDO NETO A RECIBIR	\$	423,375.68

AUTORIZO	ELABORO
ING. SERGIO DE LA O RUBIO RESIDENTE D.O.P.M	INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTORA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS & MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH., 20 DE JUNIO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 423,375.68
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN No. 1 CONTRATO No. 056/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 633,360.00

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 525,280.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 157,584.00
SUBTOTAL	\$ 367,696.00
IVA	\$ 58,831.36
TOTAL	\$ 426,527.36

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

D.I.F. DEL 0.2%	\$ 1,050.56
I.C.I.C. DEL 0.2%	\$ 1,050.56
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$ 1,050.56
	\$ 3,151.68

NETO A RECIBIR \$ 423,375.68

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO.

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 633,360.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 609,324.80
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 609,324.80
POR EJERCER	\$ 24,035.20

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 190,008.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 182,797.44
ACUMULADO ACTUAL	\$ 182,797.44
POR AMORTIZAR	\$ 7,210.56

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO.

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR			
ESTA ESTIMACION	\$ 1,050.56	\$ 1,050.56	\$ 1,050.56
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,050.56	\$ 1,050.56	\$ 1,050.56

R E C I B I M O S

INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.

ICO970409973

OBRA: TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO
SACRAMENTO

No. CONTRATO: 056/2016

ESTIMACIÓN No. 1

CONTRATISTA: INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.

PERÍODO: DEL 09 DE MAYO DE 2016 AL 27 DE MAYO DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS


No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
1	OBRA NORMAL.- <u>ALBAÑILERIA</u>	\$ 525,280.00
SUBTOTAL		\$ 525,280.00
I.V.A.		\$ 84,044.80
TOTAL		\$ 609,324.80

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.



ING. SERGIO DE LA O RUBIO.

OBRA:		TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO				MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.					
No. CONTRATO:		056/2016				ESTIMACIÓN No. 1					
PERIODO:		DEL 09 DE MAYO DE 2016 AL 27 DE MAYO DE 2016									
CONTRATISTA:		INGENIERIA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.									
		CONCEPTOS				PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.		DESCRIPCIÓN				VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADA TOTAL	ACUMULADA ANTERIOR		

OBRA NORMAL.- \$525,280.00

1.001	Amacise a todo lo largo del tunel para desprendimiento de piedras que se puedan caer por medio de barras, protegiendo el barandal. Incluye desalojo de piedras.	120.00	ml	120	0.00	120.00	\$686.00	\$82,320.00
1.002	Colocacion de malla en el area del techo del tunel (contracielo), malla tipo ciclonica anclada con split det de 60 cms de largo de 3.5 cms de diametro, con placa de 15 x 15 cms, colocadas entre 1-2 mts de distancia, y varilla de 1/2" de diametro de 30 cms de largo colocadas en cuadrícula de 80 cms de separacion.	120.00	ml	120	0.00	120.00	\$1,274.00	\$152,880.00
1.003	Colocacion de concreto lanzado sobre malla (techo del tunel) con un espesor promedio de 8 cms, concreto de 200 kg / cm (T.M.A. 3/8" con fibra), protegiendo el barandal, incluye limpieza.	112.00	ml	112	0.00	112.00	\$2,590.00	\$290,080.00

POR EL CONTRATISTA

INGENIERÍA CIVIL OBJETIVA, S.A DE C.V.

1 / 1

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. SERGIO DE LA O RUBIO

CROQUIS GENERADOR PARA ESTIMACION DE OBRA
EJECUTADA EN, TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS
NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO.


UBICACIÓN : CIUDAD CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA.

ELABORO:
INGENIERIA CIVIL OBJETIVA.

CROQUIS 2

ESCALA: INDICADAS ACOTACION: METROS
DIBUJO: REVISO:

COLOCACION DE
CONCRETO & MALLA
SOBRE CIELO DEL
TUNEL

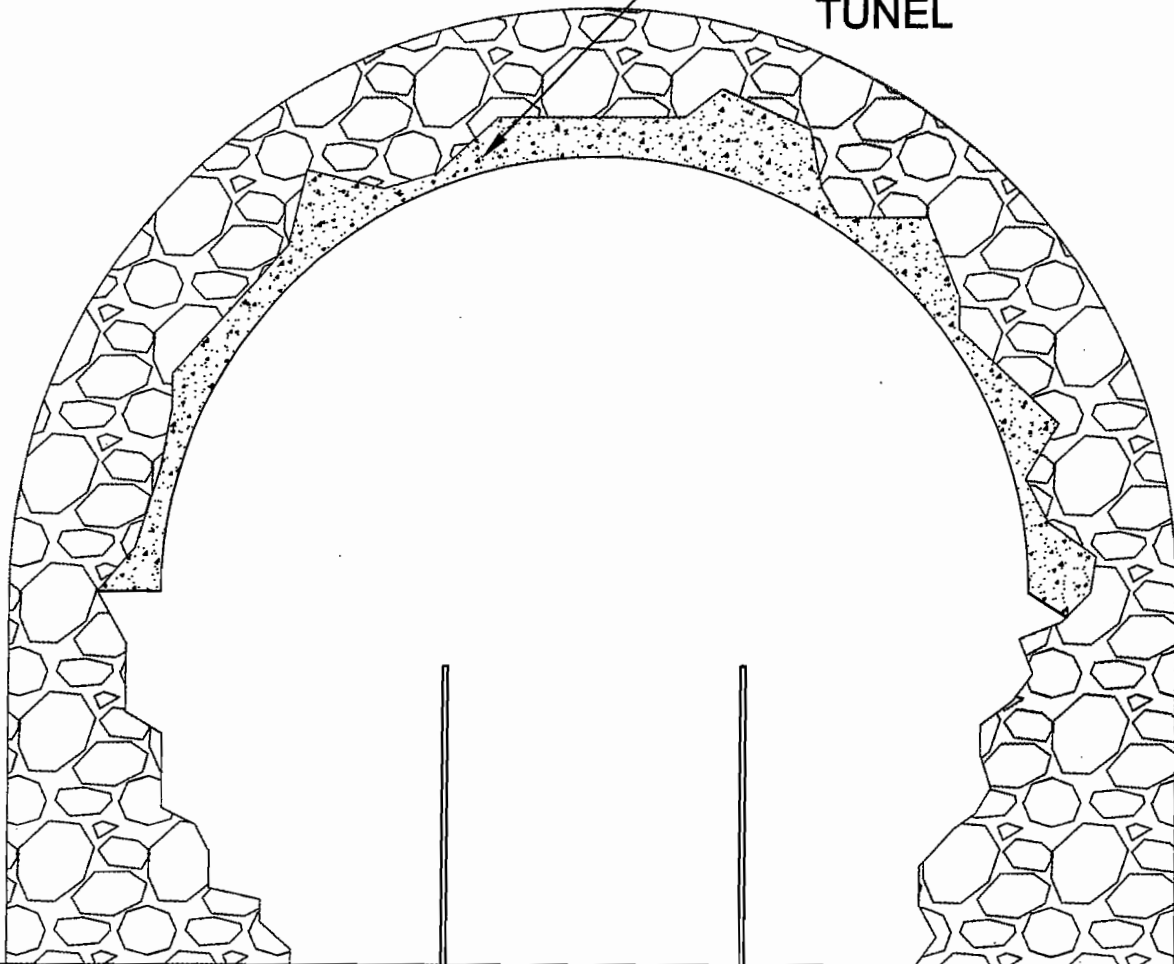


ALBUM FOTOGRAFICO DE LA OBRA

OBRA: TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS
LOCALIDAD: CD CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

ESTIMACION: 1 (UNO)

		(1.01) AMACISE A LO LARGO DEL TUNEL.			(1.02) COLOCACION DE MALLA EN EL TECHO DEL TUNEL.	
		(1.03) COLOCACION DE CONCRETO LANZADO				(1.02) PERFORACION & COLOCACION DE ANCLAS.



CROQUIS GENERADOR PARA ESTIMACION DE OBRA
EJECUTADA EN, TUNEL DE SALIDA EN LAS GRUTAS
NOMBRE DE DIOS, EN EJIDO SACRAMENTO.

UBICACIÓN : CIUDAD CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA.

ELABORO:
INGENIERIA CIVIL OBJETIVA.

PROYECTÓ:

CROQUIS 3

ESCALA: INDICADAS

ACOTACION: METROS

DIBUJO:

REVISO:

