

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV
RFC960423N15
Domicilio Fiscal
TRASVIÑA Y RETES 5304
Col. PANAMERICANA 31210
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144266056

Factura No: 181
FOLIO FISCAL (UUID):
43CDECF0-F409-4362-9E38-2FF6A2E7850D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000403161827
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-07-29T10:24:13
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-07-29T10:19:12

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 29 julio 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONTRATO: 059/2016 ESTIMACIÓN 1 (UNO) AUTOMATIZACIÓN DE PILA Y POZO RANCHO LOS AGUILARES ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 55,409.53 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ 0.00 SUBTOTAL: \$55,409.53 IVA: \$8,865.52 TOTAL: \$64,275.05 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO: I.C.I.C 0.2% \$110.82 D.I.F 0.2% \$110.82 INSTITUTO 0.2% \$110.82 SUMA RETENCIONES: \$332.46 NETO A RECIBIR: \$63,942.59	\$ 55,409.53	\$ 55,409.53

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 05/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 55,409.53
IVA(IVA 16.00%): \$ 8,865.52
TOTAL: \$ 64,275.05

SELLO DIGITAL DEL CFDI

029Fz2kpA8Kc/d8uQ57F040DroXGhCDREWOON/JgtZ9uV80CKEoJCKKcXLM1gHrOKYtpdM299X/Z/SY9T100YlbB6gCcdMGFvNZQWIX30TJAIDW1G7eUk7msrQVfWRFhTQ8K0SGs+ugKgAo8F+CR3zRjQSKlUPnEgd12+61YROsd
o08UTQv1B7RIKzR3uHbuRCPWg+hKiyTqdl.1202Ho3wImdpJocqYKJGtm1OEcmSuk8XtpN34L67ZIM4Q7WNoRcF9C5AyRtu1j3qrD4KAodTjZ8Nach7WW14IZox/8c00k27FpPUv15PwszByDyOG4ztdaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0SMKwwYttHmqSO09IY96n0IKH5XPcARvXydZ+0dFEoHNg9CZZH+fnw4B7TYkkyVRwHfshSKfEx4iNLxkGB8CR6thp8aCmK5M0KNooyD0Rb7xyPlgWmxgXqJhefqWKAf7lBxjKSpB4Amz0DuV52SqDj5jetZvkXzmJTXU0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0143CDECF0-F409-4362-9E38-2FF6A2E7850D2016-07-29T10:24:13029Fz2kpA8Kc/d8uQ57F040DroXGhCDREWOON/JgtZ9uV80CKEoJCKKcXLM1gHrOKYtpdM299X/Z/SY9T100YlbB6gCcdMGFvNZQWIX30TJAIDW1G7eUk7msrQVfWRFhTQ8K0SGs+ugKgAo8F+CR3zRjQSKlUPnEgd12+61YROsd08UTQv1B7RIKzR3uHbuRCPWg+hKiyTqdl.1202Ho3wImdpJocqYKJGtm1OEcmSuk8XtpN34L67ZIM4Q7WNoRcF9C5AyRtu1j3qrD4KAodTjZ8Nach7WW14IZox/8c00k27FpPUv15PwszByDyOG4ztdaw==00001000000203495276



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

[Verificar CFDI](#)




RFC del Emisor


RFC960423N15

Nombre o Razón Social del Emisor

COMPAÑIA RIO FLORIDO
CONSTRUCTORA SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-07-29T10:19:12

Efecto del Comprobante

ingreso

\$64,275.05

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203JS7

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-07-29T10:24:13

Estado CFDI

Vigente

43CDECFO-F409-4362-9E38-
2FF6A2E7850D

Total del CFDI



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2015	CONTRATO No. 059/2016	CONTRATADOS
OBRA: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO RANCHO LOS AGUILARES	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 64,275.14 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 09/MAYO/2016 AL 21/MAYO/2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 64,275.05 CON IVA
CONTRATISTA: COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC RFC-960423-N15	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 64,275.05 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 53,407.34	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 2,002.19	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 55,409.53	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	110.82
0.2% DIF.	\$	110.82
0.2% INSTITUTO	\$	110.82
SUMA DESCUENTOS	\$	332.46
RESUMEN		
SÚMA ESTA ESTIMACION	\$	55,409.53
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	55,409.53
I.V.A.	\$	8,865.52
TOTAL	\$	64,275.05
(CON LETRA)		
(SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 5/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	332.46
SALDO NETO A RECIBIR	\$	63,942.59

AUTORIZO	ELABORO
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ	COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE V. ARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

28/JULIO/2016.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 63,942.59
(SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 059/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 64,275.14 INCLUYE CONVENIO
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO RANCHO LOS AGUILARES

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 55,409.53

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 55,409.53

IVA \$ 8,865.52

TOTAL \$ 64,275.05

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 110.82

DIF 0.2% 110.82

INSTITUTO 0.2% 110.82

SUMA 332.46

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 64,275.14
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 64,275.05
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 64,275.05
POR EJERCER	\$ 0.09

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% INSTITUTO	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 110.82	\$ 110.82	\$ 110.82
ACUMULADO ACTUAL	\$ 110.82	\$ 110.82	\$ 110.82

RECIBIMOS

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
RFC-960423-N15



OBRA: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO RANCHO LOS AGUILARES
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERÍODO: 09/MAYO/2016 AL 21/MAYO/2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 059/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

<u>NORMALES</u>	\$	53,407.34
<u>EXCEDENTES</u>	\$	2,002.19
<u>EXTRAS</u>	\$	-

SUBTOTAL	\$	55,409.53
I.V.A.	\$	8,865.52
TOTAL	\$	64,275.05

POR EL CONTRATISTA

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
2013-2016

OBRA:	AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO RANCHO LOS AGUILARES		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V		
PERIODO:	09/MAYO/2016 AL 21/MAYO/2016		
ESTIMACIÓN No.	1 (JUNO)		
No. CONTRATO:	059/2016		

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL \$ 53,407.34

1.-	PILA DE AGUA									\$ 53,407.34
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA OJILLADA DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	19.60	19.60	-	19.60	\$ 317.38	\$	6,220.65	
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: DOS CODOS DE 45º X 2", DOS NIPLES DE 2" X 1.0 MT., 10.00 MT. DE TUBO GALVANIZADO DE 4"	PZA	2.00	2.00	-	2.00	\$ 5,587.00	\$	11,174.00	
1.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	M2	78.00	78.00	-	78.00	\$ 62.19	\$	4,850.82	
1.4	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 MTS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES.	PZA	2.00	2.00	-	2.00	\$ 6,354.03	\$	12,708.06	

POR EL CONTRATISTA:

ING. CARLOS HUARTEZA RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE



OBRA:		AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO RANCHO LOS AGUILARES			
MUNICIPIO:		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA			
CONTRATISTA:		COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V			
PERIODO:		09/MAYO/2016 AL 21/MAYO/2016			
ESTIMACIÓN No.		1 (UNO)			
No. CONTRATO:		059/2016			

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR				
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BRIDAD, VASTAGO FIJO, CON CUNA RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-509 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, LISTADO UL, ULC, FM, NSF-61, INCLUYE:CUERPO Y BONETE DE FIERRO FUNDIDO ASTM-A126 CLASE B BRIDA Y ESTOPERO DE FIERRO DUCTIL ASTM-A536, RECUBRIMIENTO RESINA EPOXICA ADHERIDA POR FUSION ELECTROSTATICAMENTE APLICADA QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACION HIERRO DUCTIL ASTM-536 VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F, ASTM A582, CUNA DE FIERRO DUCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUNA EN BROCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NUTRILLO BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VASTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	4.00	3.00	-	3.00	2,002.26 \$	6,006.78	
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS UNIVERSALES COMPLETAS PARA 150 PSI PUESTAS EN OBRA, DE 2" DE DIAMETRO	PZA	2.00	2.00	-	2.00	481.58 \$	963.16	
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OBRA PARA VENTILACION A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	1.00	-	1.00	625.65 \$	625.65	
1.8	INSTALACION DE EQUIPO COMPLETO PARA AUTOMATIZAR VIA RADIO EL POZO Y TANQUE INCLUYE VIATICOS Y TRASPORTACION ASOCIADA, INSTALACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	1.00	1.00	-	1.00	7,453.55 \$	7,453.55	
1.9	INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE CLORACION POR GRAVEDAD COMPLETO.	LOTE	1.00	1.00	-	1.00	3,404.67 \$	3,404.67	

POR EL CONTRATISTA:

ING. CARLOS HUMBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE



OBRA:	AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO RANCHO LOS AGUILARES		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V		
PERIODO:	09/MAYO/2016 AL 21/MAYO/2016		
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)		
No. CONTRATO:	059/2016		

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA EXCEDENTE									
									\$ 2,002.19

1.-	PILA DE AGUA							\$	2,002.19
1.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	M2	78.00	79.22	78.00	1.22	\$ 62.19	\$	75.87
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS UNIVERSALES COMPLETAS PARA 150 PSI PUESTAS EN OBRA. DE 2" DE DIAMETRO	PZA	2.00	6.00	2.00	4.00	\$ 481.58	\$	1,926.32


SUBTOTAL	\$	55,409.53
IVA	\$	8,865.52
TOTAL	\$	64,275.05

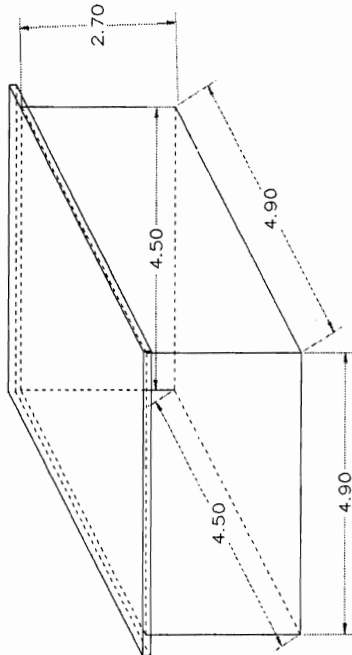
POR EL CONTRATISTA:


ING. CARLOS HUMBERTO TARRAZUA RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE

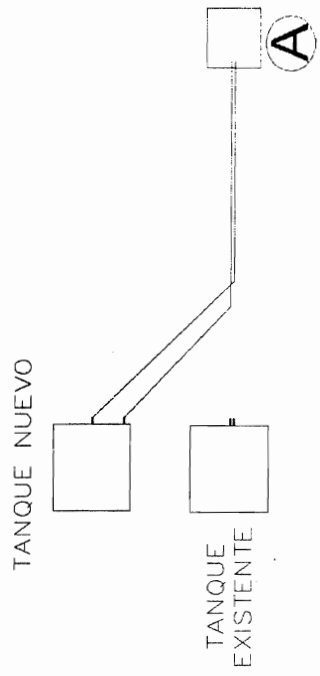
	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha: 20/06/2016
		Periodo: 09 de Mayo al 21 de Mayo	
Numero de Contrato: No.059/2016		Obra: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES	No. De Estimacion. : 1 (UNO)


CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
PILA DE AGUA 1.3.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	M2	Pintura: En Muros: $A = 4.90m \times 2.70m \times 4 = 52.92 m^2$ En volado y canto de losa: $A = (5.30 \times 0.15) \times 4 \text{ lados} = 3.18m^2$ $A = (5.30m \times 0.20m) \times 4 \text{ lados} = 4.24m^2$ En losa: $A = 5.30m \times 5.30m = 28.09 m^3$ $A = 88.43 m^2$	
		TOTAL	88.43



Elaboró:  Ing. Guillermo Anador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
---	---

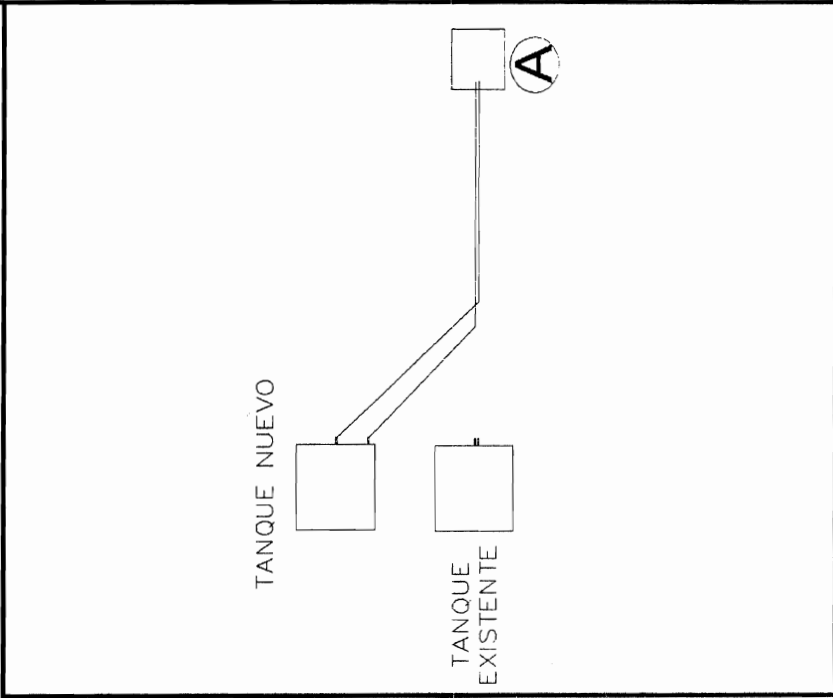
VOLUMEN A PAGAR:	88.43 M2
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	ANEXO "B"


	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 09 de Mayo al 21 de Mayo Numero de Contrato: No.059/2016	Fecha: 20/06/2016 No. De Estimacion. : 1 (UNO)
	Obra: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES		

CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	
PILA DE AGUA 1.4.- CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, TIPO 5 DE 1,30 X 0,90 MTS., INCLUYE TODOS LOS MATERIALES.	PZA	En A:		
				TOTAL

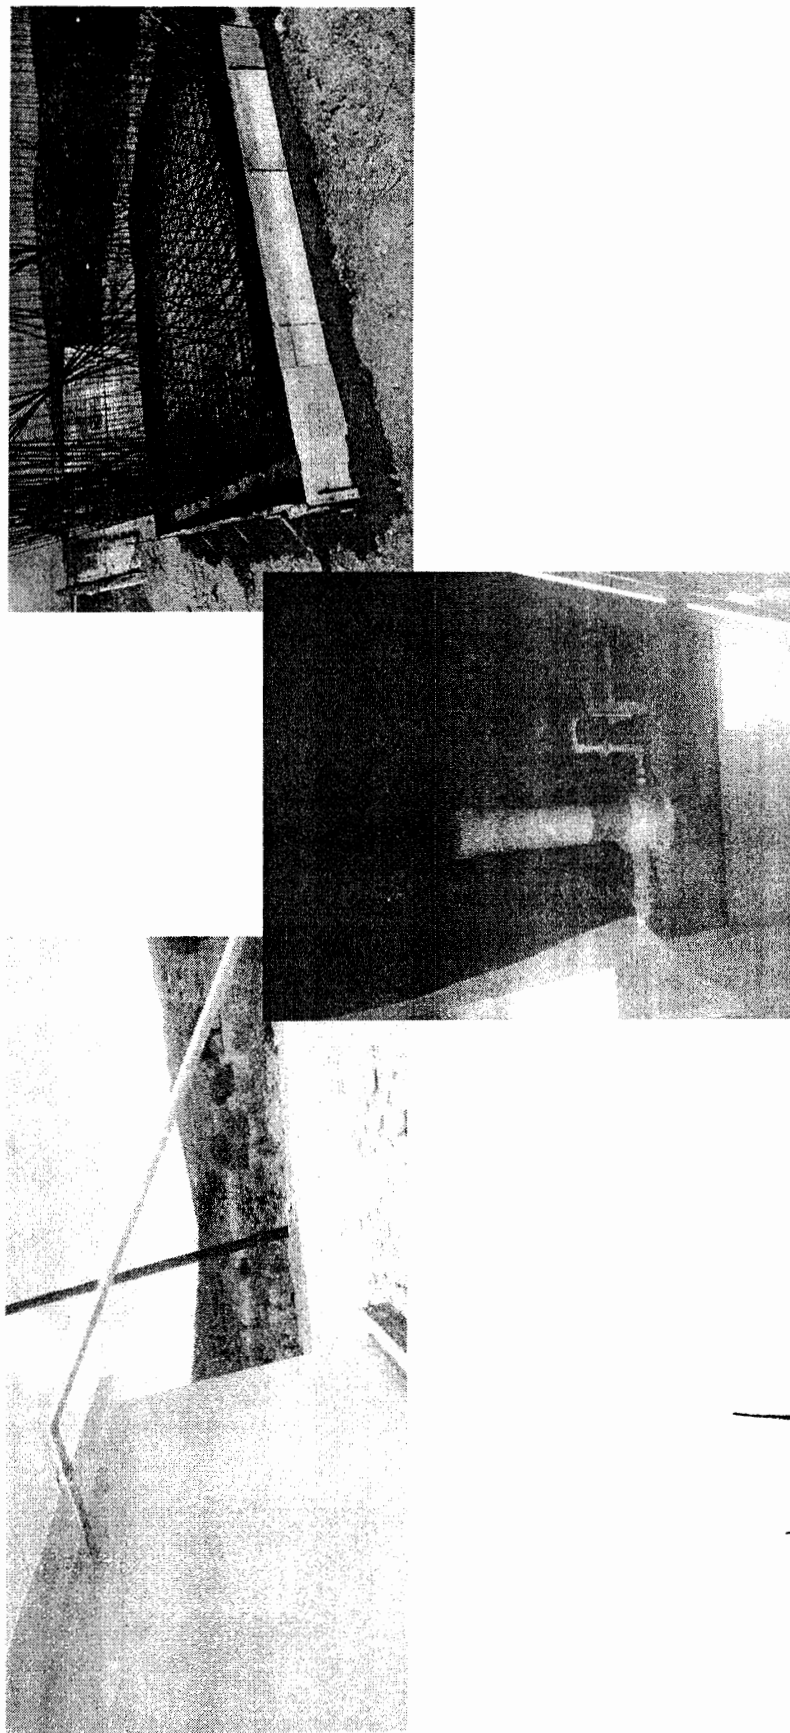
Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
VOLUMEN A PAGAR: 2.00 PZA	
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

	Contratista:	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:	20/06/2016
	Periodo:	09 de Mayo al 21 de Mayo	No. De Estimacion. :	1 (UNO)	
Numero de Contrato:		No.059/2016	Obra:	AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES	
CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS			
PILA DE AGUA POTABLE 50 M3 1.5.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BRIDAD, VASTAGO FIJO, CON CUÑA RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-509 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, LISTADO UL, ULG, FM, NSF-61. INCLUYE: CUERPO Y BONETE DE FIERRO FUNDIDO ASTM-A126 CLASE B BRIDA Y ESTOPERO DE FIERRO DUCTIL ASTM-A536, RECUBRIMIENTO RESINA EPOXICA ADHERIDA POR FUSION ELECTROSTATICAMENTE APLICADA QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACION HIERRO DUCTIL ASTM-536 VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F. ASTM A582, CUÑA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUÑA EN BROCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NUTRILO BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VASTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA. DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	TOTAL 3.00			
	En A:	2.00 PZAS			
	En tanque nuevo:	1.00 PZA			
ELABORÓ:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora		REVISÓ:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente		VOLUMEN A PAGAR: 3.00 PZA REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	




	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA		Fecha:
	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Periodo: 09 de Mayo al 21 de Mayo		No. De Estimacion.: 1 (UNO)
Numero de Contrato: No.059/2016		Obra: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES		

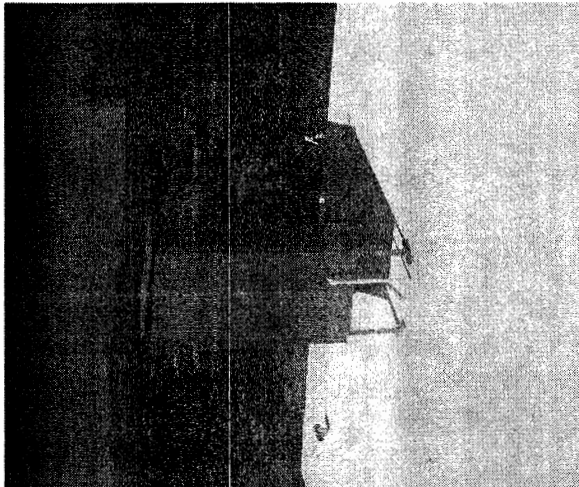
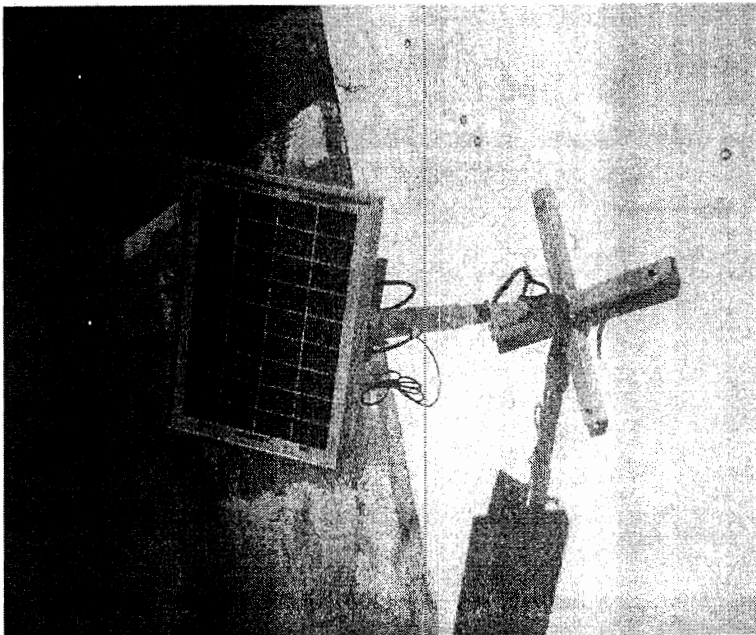
FOTOGRAFIAS




Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	 Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha: 20/06/2016
		Periodo: 09 de Mayo al 21 de Mayo	
Numero de Contrato: No.059/2016		Obra: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN RANCHO LOS AGUILARES	No. De Estimación.: 1 (UNO)

FOTOGRAFIAS



Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Esquivel Hernandez Residente
---	---
