

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV
RFC960423N15
Domicilio Fiscal
TRASVIÑA Y RETES 5304
Col. PANAMERICANA 31210
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144266056

Factura No: 183
FOLIO FISCAL (UUID):
5023265B-5057-4CE6-B336-F140C90272DF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000403161827
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-01T13:02:20
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-08-01T12:57:19

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Fecha de Expedición: 01 agosto 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONTRATO: 060/2016 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXIÓN A LINEA LA CASITA ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 111,086.04 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ 0.00 SUBTOTAL: \$111,086.08 IVA: \$17,773.77 TOTAL: \$128,859.81 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO: I.C.I.C 0.2% \$222.17 D.I.F 0.2% \$222.17 INSTITUTO 0.2% \$222.17 SUMA RETENCIONES: \$666.51 NETO A RECIBIR: \$128,193.30	\$ 111,086.04	\$ 111,086.04

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 81/100
MXN

SUBTOTAL: \$ 111,086.04
IVA (IVA 16.00%): \$ 17,773.77
TOTAL: \$ 128,859.81

SELLO DIGITAL DEL CFDI

deTYnHduIS0DuiQSsfFOXTpDe0iQn01b3Zl0qHqCw8z0BGW7ob3y3fmdnErGKvCQX2d7cxhlyrQ65D8X40AJ6628URYRPAiPPhoBdVczeEaeXLwMHdX8IGVAMRTRP9Rnmzy7+eOHjDaiUk922KD2jIV8O13pYgwnDU9J3CrvAr7hTtLq6
*EqJeT5qAVF8E32qDU3VZq0LhK0+q7ZK2wWXdY708yZ7J+7pppeXRZVo4OAYT2qjh1pBrpns4OBSKqrxng9yy/GFWLXtbbzRzcMmMY4G+g6AFJINpTPdZr4pL0QuW51eez7ewpU3eSzfj9ONVA68mA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

b7UViRECUVMN3eeCAzJ0OC794p1/DopeJ86N7nRlaIC80uCnQb11IKDoHkEsahvJgi4UxH4zbIdyCrdWmpKMBXSIDInsalof3qm2VL56vXd5yD66Z2w4o/APqGSmpzS1ZwzxCzPHKIPC18NixdigYV6YU2enZJLzU4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


11j05023265B-5057-4CE6-B336-F140C90272DF2016-08-01T13:02:20jseTXnHduIS0DuiQSsfFOXTpDe0iQn01b3Zl0qHqCw8z0BGW7ob3y3fmdnErGKvCQX2d7cxhlyrQ65D8X40AJ6628URYRPAiPPhoBdVczeEaeXLwMHdX8IGVAMRTRP9Rnmzy7+eOHjDaiUk922KD2jIV8O13pYgwnDU9J3CrvAr7hTtLq6+EqJeT5qAVF8E32qDU3VZq0LhK0+q7ZK2wWXdY708yZ7J+7pppeXRZVo4OAYT2qjh1pBrpns4OBSKqrxng9yy/GFWLXtbbzRzcMmMY4G+g6AFJINpTPdZr4pL0QuW51eez7ewpU3eSzfj9ONVA68mA==100001000000203495276



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales?
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor
5023265B-5057-4CE6-B336-
F140C90272DF

Nombre o Razón Social del Emisor
COMPAÑIA RIO FLORIDO
CONSTRUCTORA SA DE CV

Folio Fiscal
5023265B-5057-4CE6-B336-
F140C90272DF

Fecha de Expedición
2016-08-01T12:57:19

Total del CFDI

\$128,859.81

RFC del Receptor
MCI651010V22

Nombre o Razón Social del Receptor
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Certificación SAT
2016-08-01T13:02:20

PAC que Certificó
FMD100203J57

Estado CFDI

Vigente

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016	CONTRATO No. 060/2016	CONTRATADOS
OBRA: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LINEA LA CASITA	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 128,859.85 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 23/MAYO/2016 AL 21/JUNIO/2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 128,859.81 CON IVA
CONTRATISTA: COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC RFC-960423-N15	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 128,859.81 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 106,094.65	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 4,991.39	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 111,086.04	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	222.17
0.2% DIF.	\$	222.17
0.2% INSTITUTO	\$	222.17
SUMA DESCUENTOS	\$	666.51
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	111,086.04
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	111,086.04
I.V.A.	\$	17,773.77
TOTAL	\$	128,859.81
(CON LETRA)		
(CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	666.51
SALDO NETO A RECIBIR	\$	128,193.30

AUTORIZO	ELABORO
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ	COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

28/JULIO/2016.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 128,193.30
(CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 060/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 128,859.85 INCLUYE CONVENIO
CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LINEA LA CASITA

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	111,086.04
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 111,086.04
	IVA	\$ 17,773.77
	TOTAL	\$ 128,859.81
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.I.C. DEL 0.2%	222.17	
DIF 0.2%	222.17	
INSTITUTO 0.2%	222.17	
SUMA	666.51	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 128,859.85
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 128,859.81
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 128,859.81
POR EJERCER	\$ 0.04

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% INSTITUTO	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 222.17	\$ 222.17	\$ 222.17
ACUMULADO ACTUAL	\$ 222.17	\$ 222.17	\$ 222.17

R E C I B I M O S

COMPañIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
REC-988423-N15



OBRA: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LINEA LA CASITA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERÍODO: 23/MAYO/2016 AL 21/JUNIO/2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 060/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No. IMPORTE

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

NORMALES

\$ 106,094.65

EXCEDENTES

\$ 4,991.39

EXTRAS

\$ -

SUBTOTAL \$ 111,086.04

I.V.A. \$ 17,773.77

TOTAL \$ 128,859.81

POR EL CONTRATISTA

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA:	EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LINEA LA CASTIA
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERIODO:	23/MAYO/2016 AL 21/JUNIO/2016
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	040/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DESCRIPCION		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
No.								

OBRA NORMAL

									\$	106,094.65
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	------------

1.-	PILA DE AGUA								\$	17,677.35
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA OJILLADA DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	19.60	19.60	-	19.60			\$ 338.16	\$ 6,627.94
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: DOS CODOS DE 45° X 4", DOS NIPLES DE 4" X 1.0 MT., 3.50 MT. DE TUBO GALVANIZADO DE 4"	PZA	1.00	1.00	-	1.00			\$ 11,049.41	\$ 11,049.41
2.-	LINEA DE CONDUCCION								\$	88,417.30
2.1	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION	M2	80.00	80.00	-	80.00			\$ 10.58	\$ 846.40
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	63.00	63.00	-	63.00			\$ 99.61	\$ 6,275.43
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR APISONADA EN ZANJA. INCLUYE MATERIAL DE BANCO (ARENA).	M3	7.00	7.00	-	7.00			\$ 208.81	\$ 1,461.67
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL CALIZO CRIBADO PARA RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90%. INCLUYE: MATERIAL CALIZO Y HUMECTACION.	M3	35.00	34.52	-	34.52			\$ 225.93	\$ 7,799.10
2.5	RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	32.00	32.00	-	32.00			\$ 48.25	\$ 1,544.00
2.6	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 MTS., INCLUYE TODOS LOS MATERIALES.	PZA	2.00	2.00	-	2.00			\$ 5,385.61	\$ 10,771.22
2.7	SUMINISTRO DE CONTRAMARCOS, SENCILLOS DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 4". PUESTO EN OBRA.	PZA	2.00	2.00	-	2.00			\$ 2,156.89	\$ 4,313.78

POR EL CONTRATISTA:

ING. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOVERNMENT OF CHIHUAHUA
2013-2016

OBRA:	EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LINEA LA CASITA
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERIODO:	23/MAYO/2016 AL 21/JUNIO/2016
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	060/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
2.8	INSTALACION DE CONTRAMARCOS, SENCILLOS DE 1,10 MTS., CON CANAL DE 4" INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS.	PZA	2.00	2.00	-	2.00	\$ 297.73	\$ 595.46
2.9	SUMINISTRO DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS. PUESTOS EN OBRA. MEDIANO CON PESO DE 97 KG.	PZA	2.00	2.00	-	2.00	\$ 2,803.89	\$ 5,607.78
2.10	INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS. PUESTOS EN OBRA. MEDIANO CON PESO DE 97 KG.	PZA	2.00	2.00	-	2.00	\$ 744.35	\$ 1,488.70
2.11	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO DE 1/2" HASTA 12" DE DIAMETRO, PUESTAS EN EL LUGAR DE LA OBRA. DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-126 CLASE B, FY=2180 KG/CM2.TORNILLOS Y TUERCAS NORMA ASTM-325 Y EMPAQUES DE 1/4" NORMA ASTM C-564 PARA 150PSI..	KG	60.00	60.00	-	60.00	\$ 122.23	\$ 7,333.80
2.12	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS.	KG	60.00	60.00	-	60.00	\$ 50.06	\$ 3,003.60

POR EL CONTRATISTA

ING. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Pag 2 de 4

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE



OBRA:	EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LINEA LA CASTIA
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERIODO:	23/MAYO/2016 AL 21/JUNIO/2016
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	060/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BRIDA, VASTAGO FIJO, CON CUÑA RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-509 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, LISTADO UL, UL, FM, NSF-61, INCLUYE CUERPO Y BONETE DE FIERRO FUNDIDO ASTM-A126 CLASE B BRIDA Y ESTOPERO DE FIERRO DUCTIL ASTM-A536, RECUBRIMIENTO RESINA EPOXICA ADHERIDA POR FUSION ELECTROPSTATICAMENTE APLICADA QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACION FIERRO DUCTIL ASTM-536 VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F, ASTM A582, CUÑA DE FIERRO DUCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUÑA EN BROCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NITRIL BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VASTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, DE 4" DE DIAMETRO	PZA	4.00	2.00	-	2.00	\$ 2,140.64	\$ 4,281.28
2.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS UNIVERSALES COMPLETAS PARA 150 PSI PUESTAS EN OBRA, DE 4" DE DIAMETRO	PZA	6.00	6.00	-	6.00	\$ 665.63	\$ 3,993.78
2.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS UNIVERSALES COMPLETAS PARA 150 PSI PUESTAS EN OBRA, DE 2" DE DIAMETRO	PZA	2.00	2.00	-	2.00	\$ 564.76	\$ 1,129.52
2.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO HIDRAULICO RD-26 INC. ACCESORIOS, PEGAMENTO Y PRUEBA HIDROSTATICA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	156.00	156.00	-	156.00	\$ 164.11	\$ 25,601.16
2.17	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA	M3	41.00	41.00	-	41.00	\$ 57.82	\$ 2,370.62

POR EL CONTRATISTA

ING. CARLOS HUMBERTO VILLARAZ RODRIGUEZ
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE



 AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA 2013 - 2016		CONCEPTOS		VOLUMENES					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				
	OBRA:		EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LINEA LA CASITA								
	MUNICIPIO:		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA								
	CONTRATISTA:		COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V								
	PERIODO:		23/MAYO/2016 AL 21/JUNIO/2016								
	ESTIMACIÓN No.		1 (UNO)								
	No. CONTRATO:		060/2016								

OBRA EXCEDENTE

\$ 4,991.39					
-------------	--	--	--	--	--

2.-	LÍNEA DE CONDUCCIÓN				\$ 4,991.39
2.11	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO DE 1/2" HASTA 12" DE DIAMETRO. PUESTAS EN EL LUGAR DE LA OBRA. DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-126 CLASE B, FY=2180 KG/CM2.TORNILLOS Y TUERCAS NORMA ASTM-325 Y EMPAQUES DE 1/4" NORMA ASTM C-564 PARA 150PSI...	KG	60.00	96.00 60.00 36.00	122.23 \$ 4,400.28
2.12	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS.	KG	60.00	71.81 60.00 11.808	50.06 \$ 591.11



SUBTOTAL	\$ 111,086.04
IVA	\$ 17,773.77
TOTAL	\$ 128,859.81

POR EL CONTRATISTA

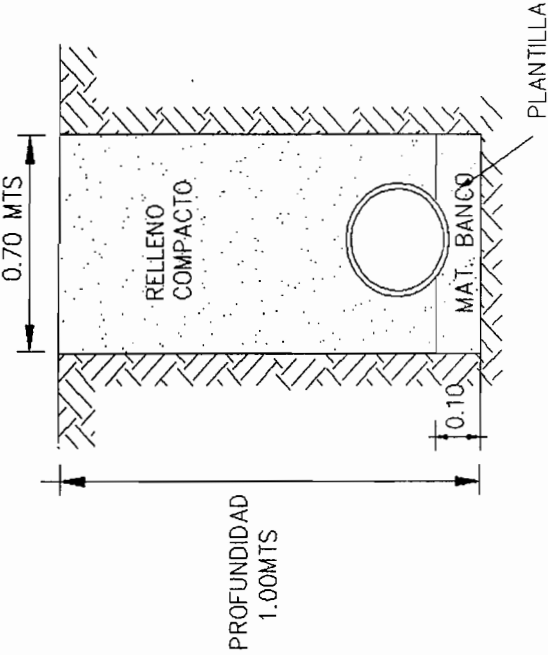
ING. CARLOS HUMBERTO RAZA RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

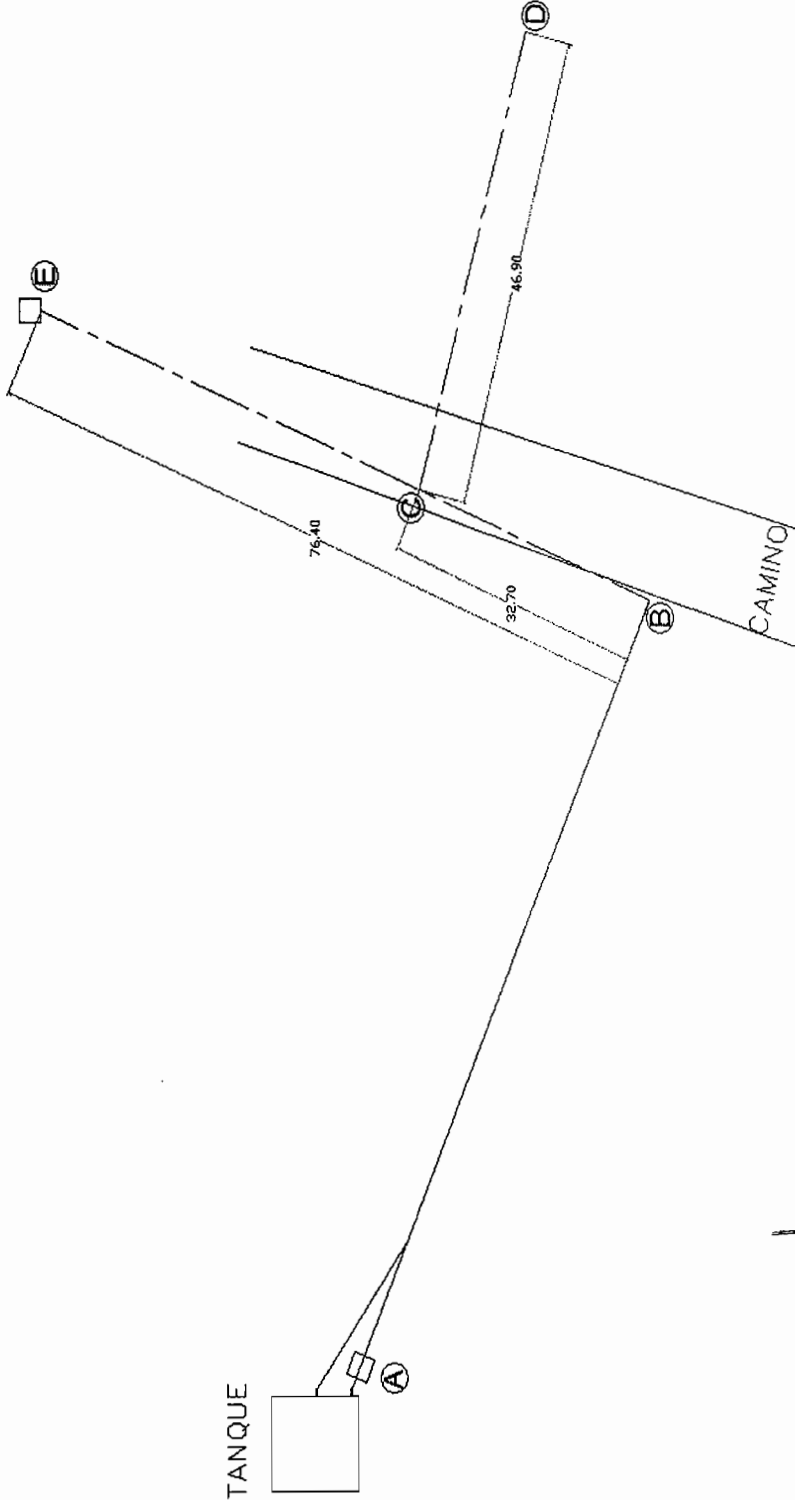

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE

	Contralista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha: 22/06/2016	
		Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio		
CONCEPTO PILA DE AGUA 1.2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: DOS CODOS DE 45° X 4", DOS NIPLES DE 4" X 1,0 MT., 3,50 MT. DE TUBO GALVANIZADO DE 4"	UNIDAD PZA	OPERACIONES ARITMETICAS	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA	No. De Estimacion. : 1 (UNO)
			CROQUIS	
		VOLUMEN A PAGAR: 1.00 PZA		
Elaboró: Ing. Guillermo Amador Lara Residente Constructora		Revisó: Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente		
TOTAL 1.00		REFERENCIA DE DOCUMENTACION:		

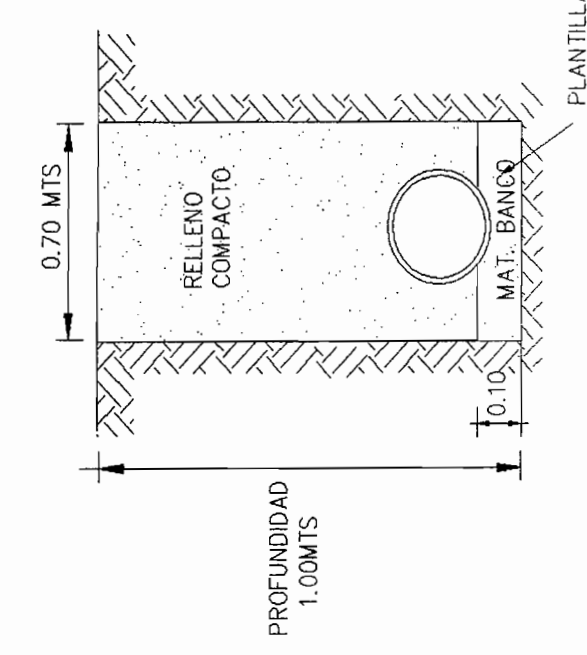
	Fecha: 22/06/2016 No. De Estimación: 1 (UNO)
Localidad: CHIHUAHUA Período: 23 de Mayo al 21 de Junio	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA
Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV	Numero de Contrato: No.060/2016


CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS		
LINEA DE CONDUCCION 2.1.- LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2 AREA: 76.40m x 0.70m= 53.48m2 46.90m x 0.70m= 32.83 m2		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1190 174 1247 871">TOTAL</td> <td data-bbox="1190 871 1247 1234">86.31</td> </tr> </table>	TOTAL	86.31
TOTAL	86.31				

Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente-Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
VOLUMEN A PAGAR: 86.31 M2	REFERENCIA DE DOCUMENTACION: ANEXO "A"

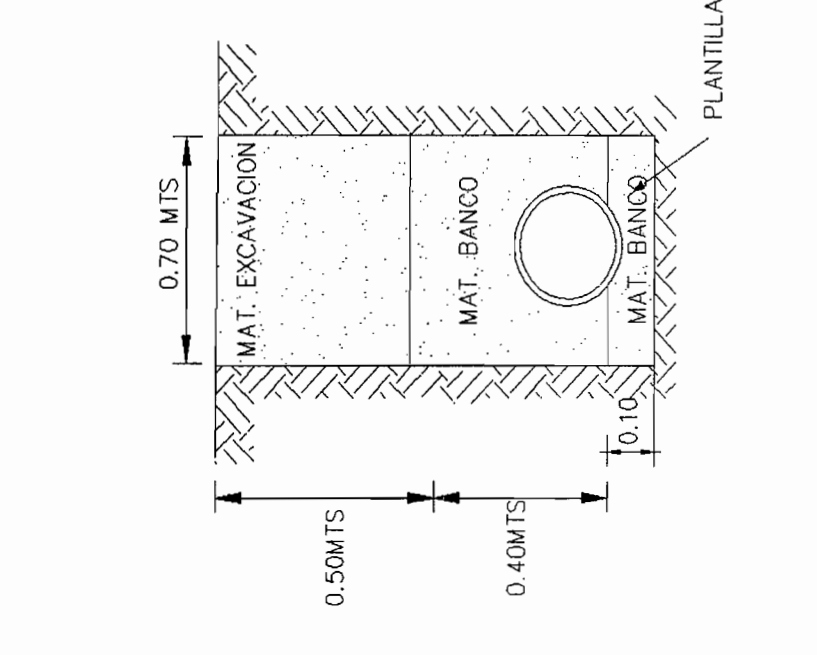

	Fecha: 22/06/2016 No. De Estimación.: 1 (UNO)
Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA
Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Numero de Contrato: No.060/2016
DOCUMENTO ANEXO "A"	
	
Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente

	Fecha: 22/08/2016 No. De Estimación: 1 (UNO)
Localidad: CHIHUAHUA Período: 23 de Mayo al 21 de Junio	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA
Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Numero de Contrato: No.060/2016

CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
LINEA DE CONDUCCION 2.2.- EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	VOLUMEN: 76.40m x 0.70m x 1.00m= 53.48m3 46.90m x 0.70m x 1.00m= 32.83 m3	
		TOTAL	86.31

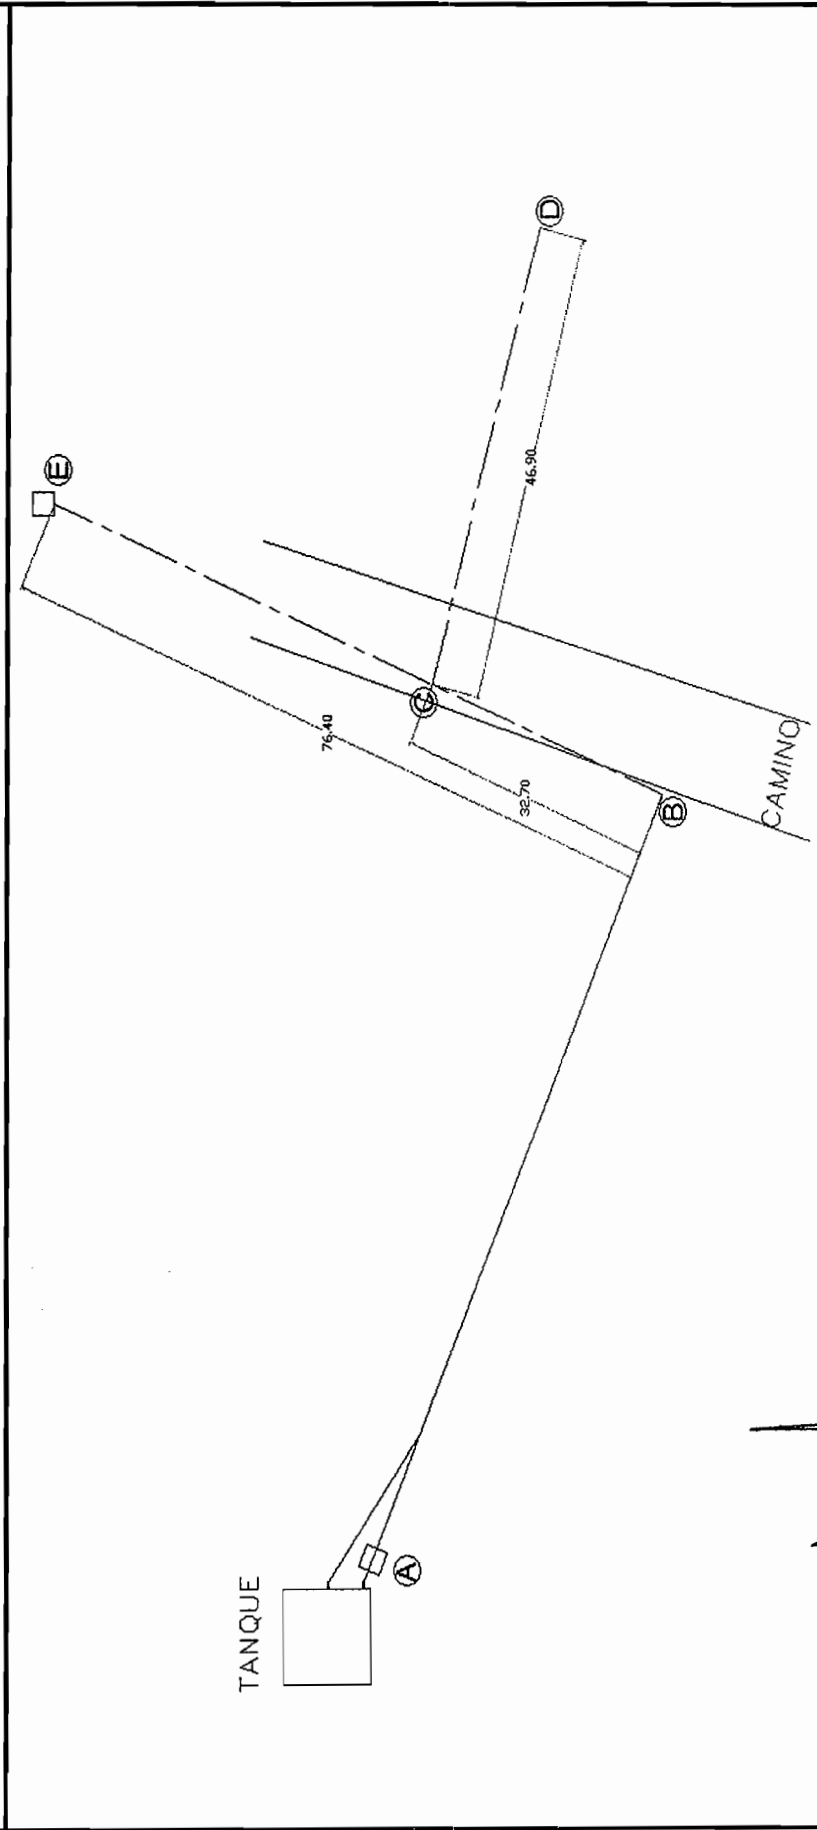
Elabó:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
VOLUMEN A PAGAR: 86.31 M3	REFERENCIA DE DOCUMENTACION:


[illegible]

	Fecha: 22/06/2016 No. De Estimacion.: 1 (UNO)	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016	Contratista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.															
Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA		CROQUIS																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>OPERACIONES ARITMETICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINIA DE CONDUCCION</td> <td>M3</td> <td>VOLUMEN:</td> </tr> <tr> <td>2.5.- RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL</td> <td>(B-E)</td> <td>76.40m x 0.70m x 0.50m= 26.74m3</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO DE LA EXCAVACION</td> <td>(C-D)</td> <td>46.90m x 0.70m x 0.50m= 16.42 m3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL 43.16</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	LINIA DE CONDUCCION	M3	VOLUMEN:	2.5.- RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL	(B-E)	76.40m x 0.70m x 0.50m= 26.74m3	PRODUCTO DE LA EXCAVACION	(C-D)	46.90m x 0.70m x 0.50m= 16.42 m3			TOTAL 43.16
CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS																
LINIA DE CONDUCCION	M3	VOLUMEN:																
2.5.- RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL	(B-E)	76.40m x 0.70m x 0.50m= 26.74m3																
PRODUCTO DE LA EXCAVACION	(C-D)	46.90m x 0.70m x 0.50m= 16.42 m3																
		TOTAL 43.16																
Elabó:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compania Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente																	
VOLUMEN A PAGAR: 43.16 M3		REFERENCIA DE DOCUMENTACION:																

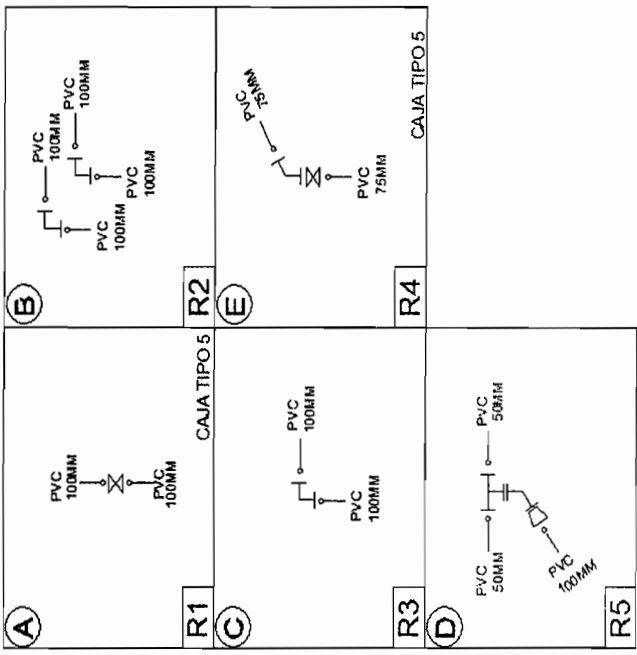
	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:
	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016	22/06/2016 No. De Estimacion.: 1 (UNO)
Obra:		Obra:	
EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA			


DOCUMENTO ANEXO "B"



Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente-Compañia Rio Florido Constructora	 Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016	Fecha: 22/06/2016
	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA		No. De Estimación.: 1 (UNO)

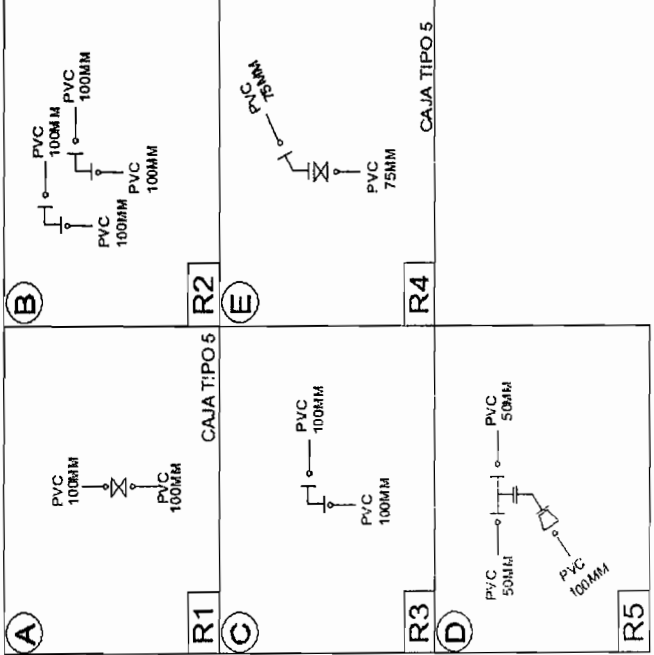
CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
LINEA DE CONDUCCION	PZA		
2.7.- SUMINISTRO DE CONTRAMARCOS, SENCILLOS		EN CRUCERO A: 1.00 PIEZA EN CRUCERO E: 1.00 PIEZA	
DE 1,10 MTS. CON CANAL DE 4", PUETSTO EN OBRA.			
			TOTAL 2.00


Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
---	---

VOLUMEN A PAGAR:	2.00 PZA
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

	Fecha: 22/06/2016												
Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA	No. De Estimacion. : 1 (UNO)												
Contratista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016												
CONCEPTO	UNIDAD												
OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS												
LINEA DE CONDUCCION 2.8.- INSTALACION DE CONTRAMARCOS, SENCILLOS DE 1,10 MTS. , CON CANAL DE 4" INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>OPERACIONES ARITMETICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EN CRUCERO A:</td> <td>PZA</td> <td>1.00 PIEZA</td> </tr> <tr> <td>EN CRUCERO E:</td> <td></td> <td>1.00 PIEZA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> TOTAL 2.00 </td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	EN CRUCERO A:	PZA	1.00 PIEZA	EN CRUCERO E:		1.00 PIEZA	TOTAL 2.00		
CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS											
EN CRUCERO A:	PZA	1.00 PIEZA											
EN CRUCERO E:		1.00 PIEZA											
TOTAL 2.00													
Elaboró: Ing. Guillermo Amador Lara Residente-Compania Rio Florido Constructora	Revisó: Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente												
VOLUMEN A PAGAR: 2.00 PZA	REFERENCIA DE DOCUMENTACION:												

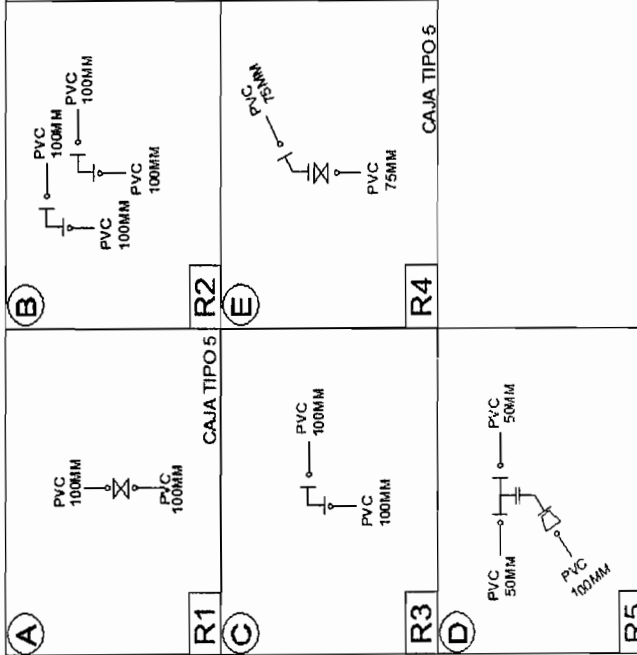
	Contratista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016	Fecha: 22/06/2016 No. De Estimacion.: 1 (UNO)
	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA		



CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
LINEA DE CONDUCCION	PZA		
2.9.- SUMINISTRO DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS. PUESTOS EN OBRA, MEDIANO CON PESO DE 97 KG.		EN CRUCERO A: 1.00 PIEZA EN CRUCERO E: 1.00 PIEZA	
TOTAL		2.00	

Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
---	---

VOLUMEN A PAGAR:	2.00 PZA
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

	Contratista: CONSTRUCTORA S.A. DE FLORIDO C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Período: 23 de Mayo al 21 de Junio	Fecha: 22/06/2016
	Numero de Contrato: No.060/2016	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA	No. De Estimación. : 1 (UNO)


CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
LINEA DE CONDUCCION	PZA		
2.10.- INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS. PUESTOS EN OBRA. MEDIANO CON PESO DE 97 KG.		EN CRUCERO A: 1.00 PIEZA EN CRUCERO E: 1.00 PIEZA	
TOTAL		2.00	

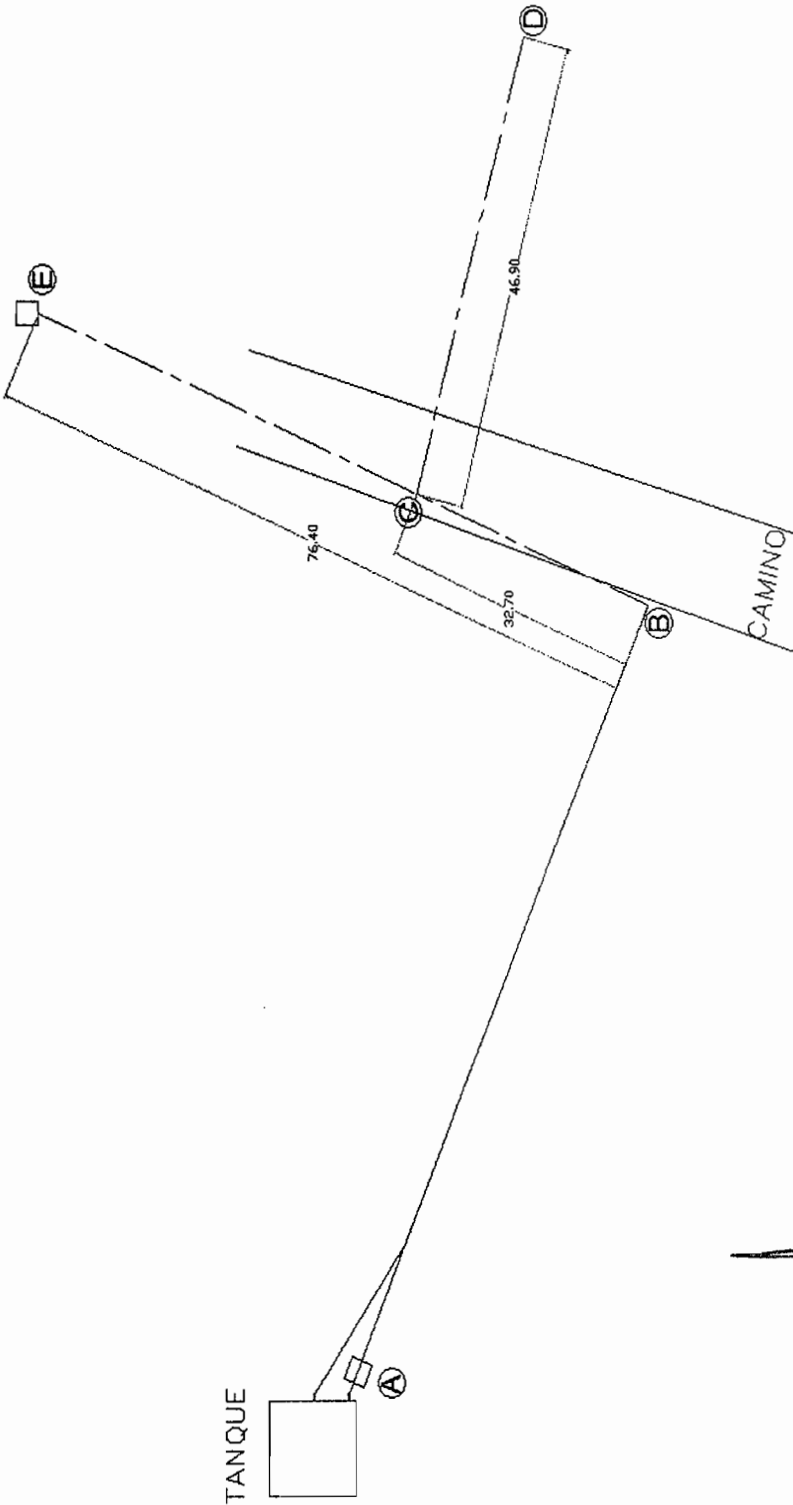


Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente-Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
---	---


VOLUMEN A PAGAR:	2.00 PZA
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

		Fecha: 22/06/2016	
Contralista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V		Localidad: CHIHUAHUA	
Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio		No. De Estimacion: 1 (UNO)	
Numero de Contrato: No.060/2016		Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA	


CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
LINEA DE CONDUCCION	KG		
2.11.- SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO DE 1/2" HASTA 12" DE DIAMETRO, PUESTAS EN EL LUGAR DE LA OBRA, DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-126 CLASE B, FY=2180 KG/CM2, TORNILLOS Y TUERCAS NORMA ASTM-325 Y EMPAQUES DE 1/4" NORMA ASTM C-564		EN CRUCERO B: 2 CODOS 90 X 4"= 18.00 KG X 2= 36KG	(A) (B) (C) (D) (E)
		EN CRUCERO C: 1 CODO 90 X 4"= 18.00KG	R1 R2 R3 R4 R5
		EN CRUCERO E: 1 CODO 45 X 4"= 16.00KG	
		EN CRUCERO D: 1 CODO 45 X 2"= 5.00 KG 1 TEE 2 X 2"= 10.00 KG 1 REDUCCION DE 4 X 2"= 11.00 KG	
		TOTAL 96.00	

Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
VOLUMEN A PAGAR: 96.00 KG	
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	


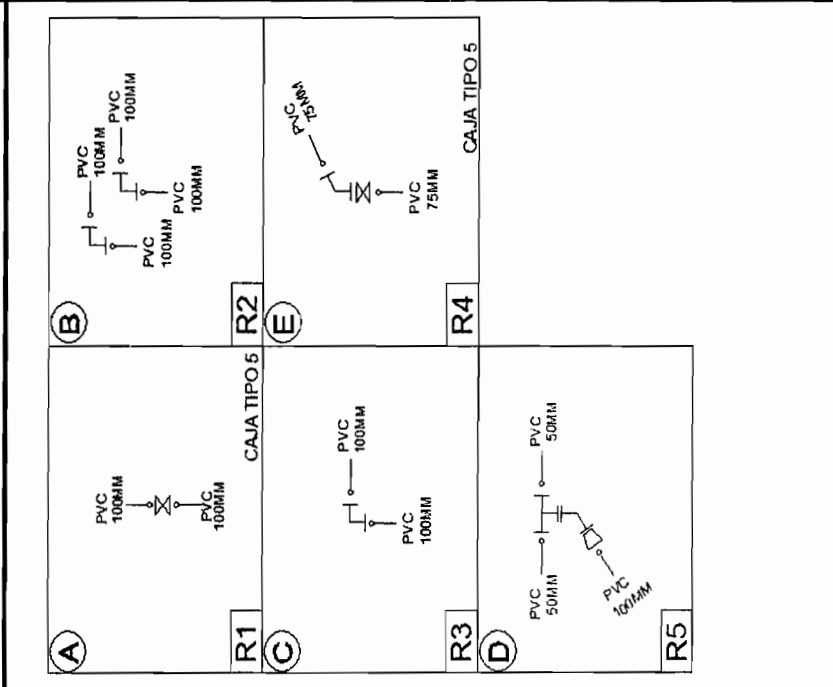
	Contratista:	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:	22/06/2016
	Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio		No. De Estimación. : 1 (UNO)		
Numero de Contrato:		No.060/2016	Obra:	EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA	
DOCUMENTO ANEXO "B"					
					
Elaboró:		Revisó:			
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Constructora		 Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente			


	Contratista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio	Fecha: 22/06/2016
	Numero de Contrato: No.060/2016	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA	No. De Estimacion: 1 (UNO)







CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS
LINEA DE CONDUCCION	KG	
2.12.- INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE TODAS LAS MANIOBRAS.		
		EN CRUCERO B:
		2 CODOS 90 X 4"=
		18.00 KG X 2= 36KG
		EN CRUCERO C:
		1 CODO 90 X 4"=
		18.00KG
		EN CRUCERO E:
		1 CODO 45 X 4"=
		16.00KG
		EN CRUCERO D:
		1 CODO 45 X 2"=
		5.00 KG
		1 TEE 2 X 2"=
		10.00 KG
		1 REDUCCION DE 4 X 2"=
		11.00 KG
TOTAL		96.00

Elaboró:  Ing. Guillermo Anador Lara Residente Compania Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
---	---

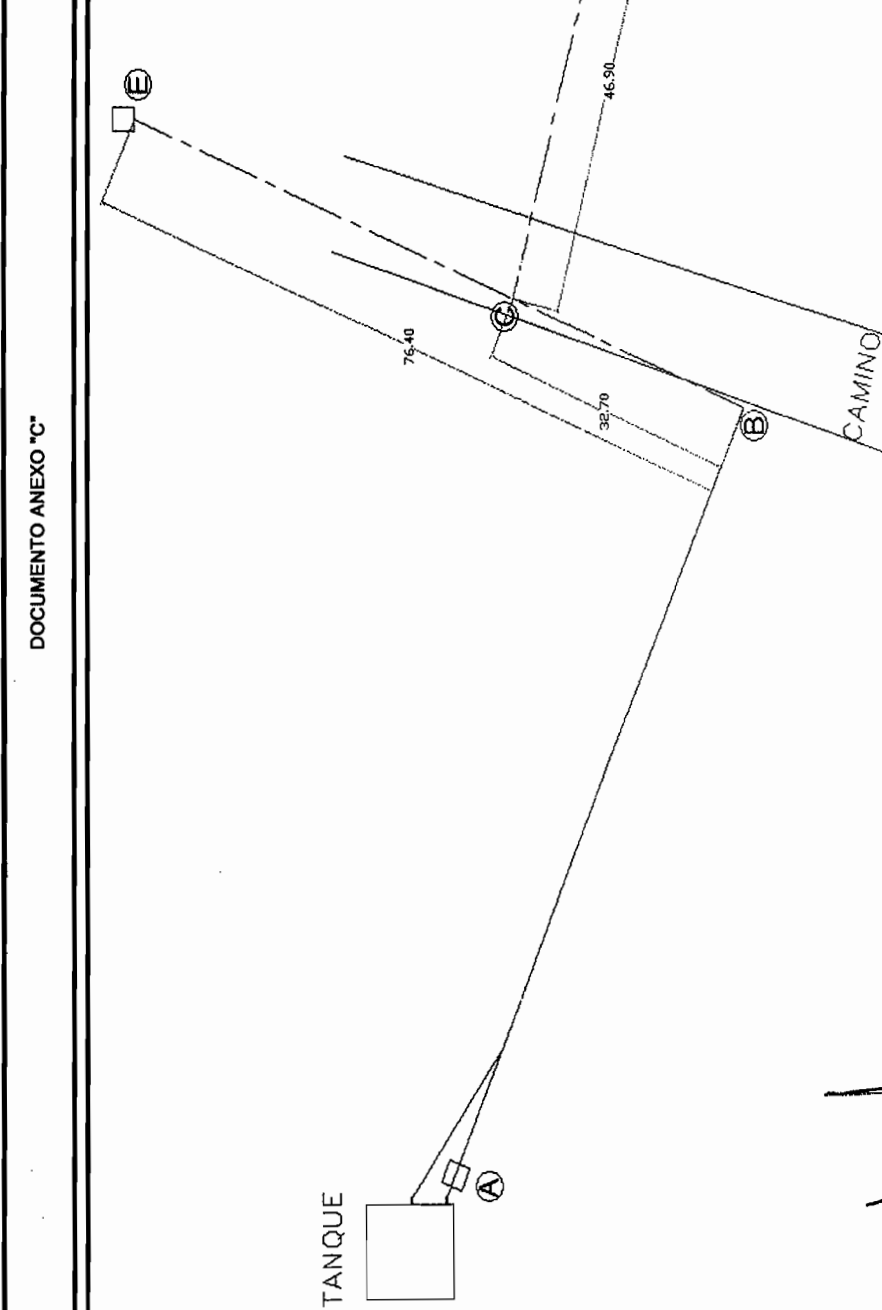

VOLUMEN A PAGAR:	96.00 KG
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

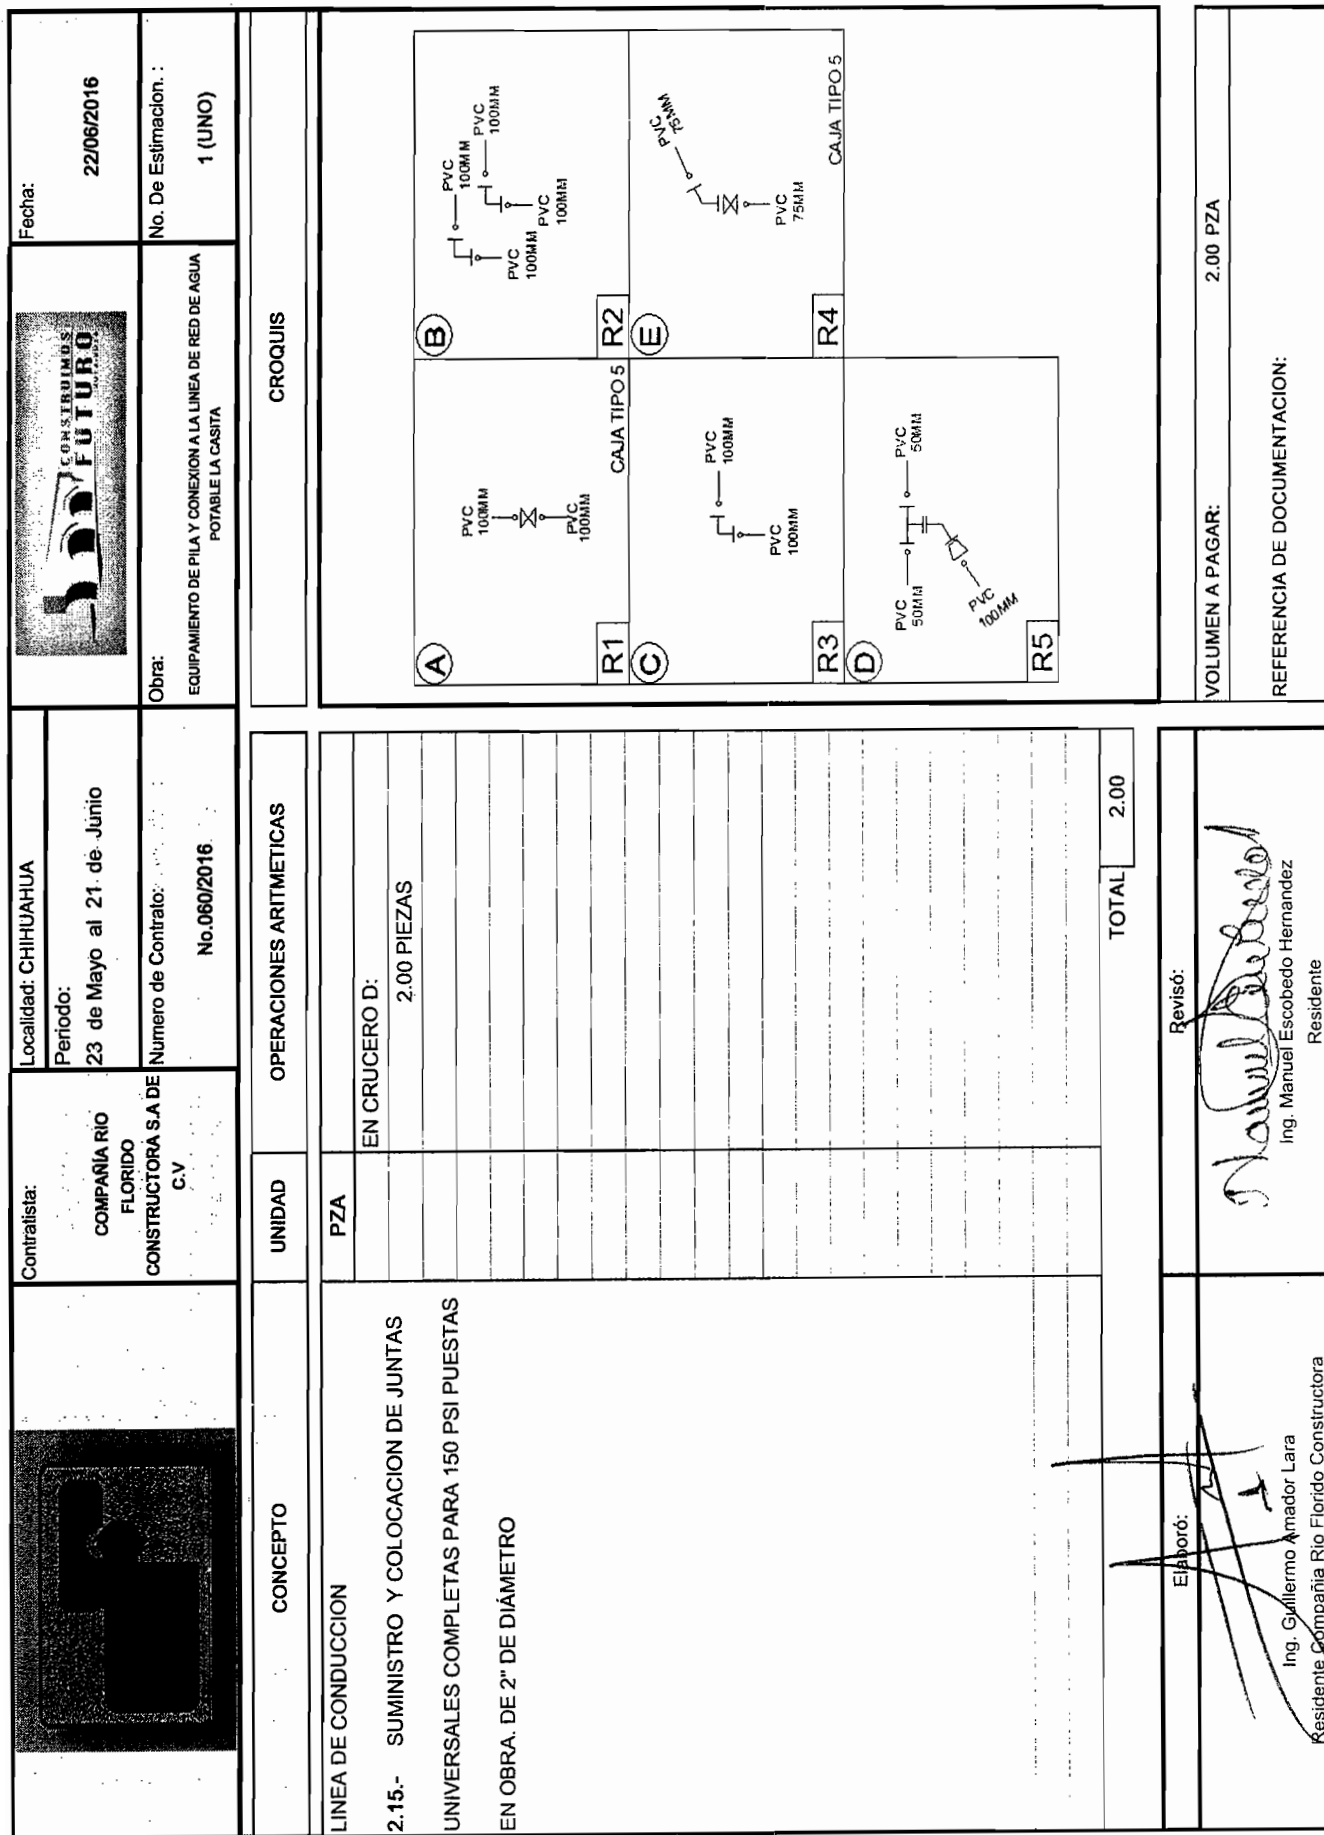
	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016	Fecha: 22/06/2016 No. De Estimacion.: 1 (UNO)																		
Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA		CROQUIS																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>OPERACIONES ARITMETICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINEA DE CONDUCCION</td> <td>PZA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.13.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BRIDAD, VASTAGO FIJO, CON CUÑA RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-508 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, LISTADO UL, ULC, FM, NSF-61. INCLUYE: CUERPO Y BONETE DE FIERRO FUNDIDO ASTM-A128 CLASE B BRIDA Y ESTOPERO DE FIERRO DUCTIL ASTM-A536, RECUBRIMIENTO RESINA EPOXICA ADHERIDA POR FUSION</td> <td></td> <td>EN CRUCERO A: 1.00 PIEZA</td> </tr> <tr> <td>ELECTROSTATICAMENTE APLICADA QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACION</td> <td></td> <td>EN CRUCERO E: 1.00 PIEZA</td> </tr> <tr> <td>HIERRO DUCTIL ASTM-536 VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F. ASTM A582, CUÑA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUÑA EN BROCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NUTRILLO BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VASTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA. DE 4" DE DIAMETRO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	LINEA DE CONDUCCION	PZA		2.13.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BRIDAD, VASTAGO FIJO, CON CUÑA RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-508 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, LISTADO UL, ULC, FM, NSF-61. INCLUYE: CUERPO Y BONETE DE FIERRO FUNDIDO ASTM-A128 CLASE B BRIDA Y ESTOPERO DE FIERRO DUCTIL ASTM-A536, RECUBRIMIENTO RESINA EPOXICA ADHERIDA POR FUSION		EN CRUCERO A: 1.00 PIEZA	ELECTROSTATICAMENTE APLICADA QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACION		EN CRUCERO E: 1.00 PIEZA	HIERRO DUCTIL ASTM-536 VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F. ASTM A582, CUÑA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUÑA EN BROCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NUTRILLO BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VASTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA. DE 4" DE DIAMETRO			TOTAL		2.00
CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS																			
LINEA DE CONDUCCION	PZA																				
2.13.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BRIDAD, VASTAGO FIJO, CON CUÑA RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA AWWA C-508 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125 PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI, LISTADO UL, ULC, FM, NSF-61. INCLUYE: CUERPO Y BONETE DE FIERRO FUNDIDO ASTM-A128 CLASE B BRIDA Y ESTOPERO DE FIERRO DUCTIL ASTM-A536, RECUBRIMIENTO RESINA EPOXICA ADHERIDA POR FUSION		EN CRUCERO A: 1.00 PIEZA																			
ELECTROSTATICAMENTE APLICADA QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACION		EN CRUCERO E: 1.00 PIEZA																			
HIERRO DUCTIL ASTM-536 VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F. ASTM A582, CUÑA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUÑA EN BROCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NUTRILLO BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VASTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA. DE 4" DE DIAMETRO																					
TOTAL		2.00																			
Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente																				
VOLUMEN A PAGAR: 2.00 PZA		REFERENCIA DE DOCUMENTACION:																			

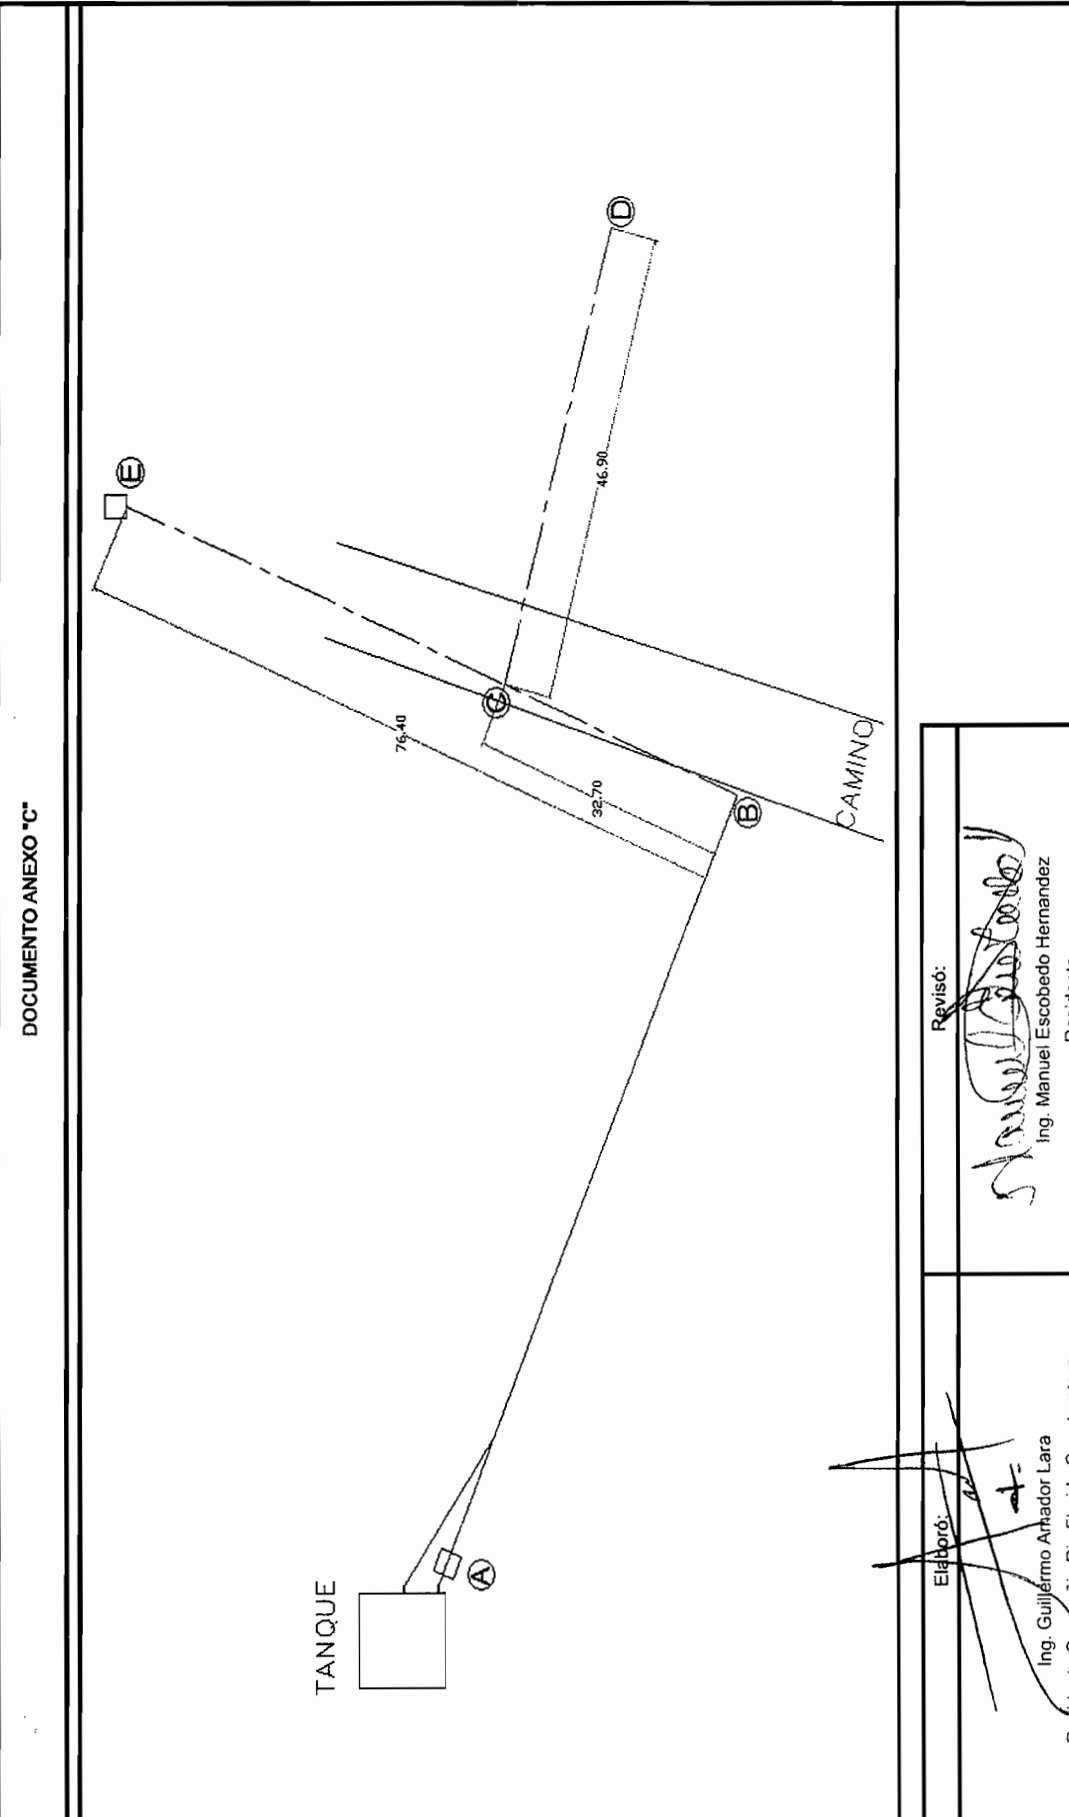



		Fecha: 22/06/2016	
		No. De Estimación.: 1 (UNO)	
Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA		Localidad: CHIHUAHUA	
Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio		Numero de Contrato: No.060/2016	
Contratista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV		Operaciones Aritmeticas	
CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	
LINEA DE CONDUCCION	PZA		
2.14.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS	EN CRUCERO A:	2.00 PIEZAS	
UNIVERSALES COMPLETAS PARA 150 PSI PUESTAS	EN CRUCERO B:	2.00 PIEZAS	
EN OBRA. DE 4" DE DIAMETRO	EN CRUCERO C:	2.00 PIEZAS	
	EN CRUCERO E:	2.00 PIEZAS	
	EN CRUCERO D:	1.00 PIEZAS	
TOTAL		9.00	
Elaboró: 		Revisó: 	
Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora		Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente	


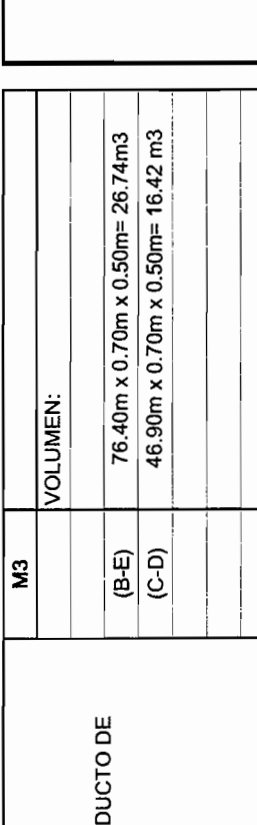
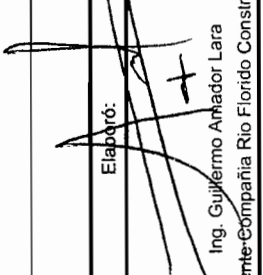
CROQUIS	
	
	
	

VOLUMEN A PAGAR:	9.00 PZA
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016	Fecha: 22/06/2016 No. De Estimación. : 1 (JUNO)
Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA			
DOCUMENTO ANEXO "C"			
			
Aprobó:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente		

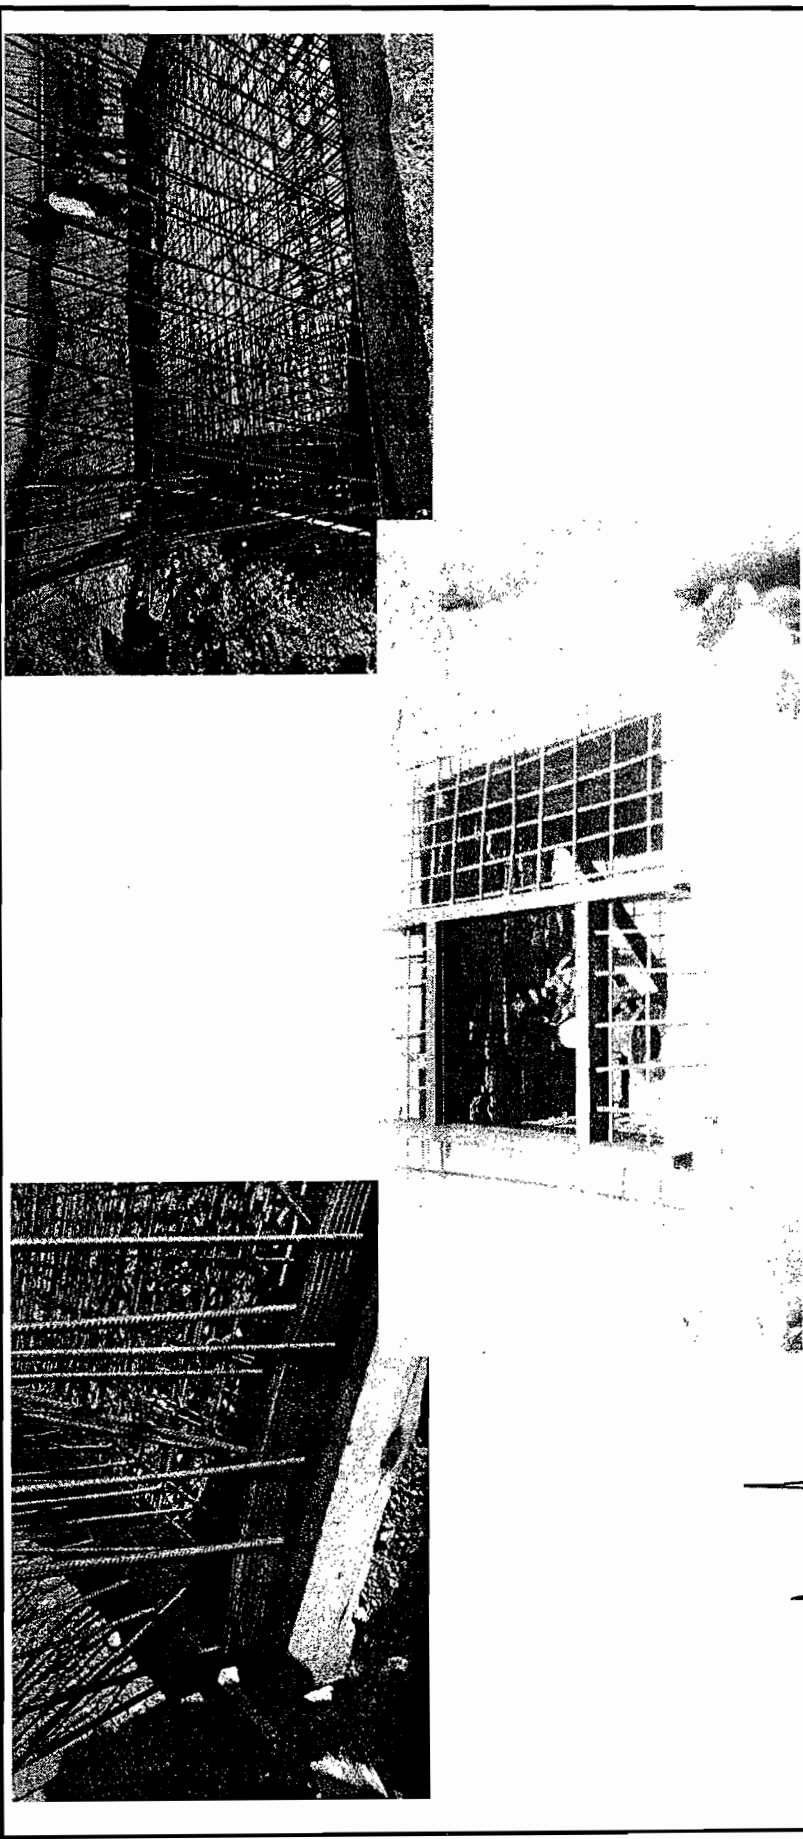


	Fecha: 22/06/2016		
Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio	No. De Estimación: 1 (UNO)		
Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA		
Numero de Contrato: No.060/2016			
DOCUMENTO ANEXO "C"			
TANQUE  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="341 180 487 892"> Elaboró:  Ing. Guillermo Arzador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora </td> <td data-bbox="487 180 633 892"> Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente </td> </tr> </table>		Elaboró:  Ing. Guillermo Arzador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
Elaboró:  Ing. Guillermo Arzador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente		





	Contralista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha: 22/06/2016
		Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio	
CONCEPTO LINEA DE CONDUCCION 2.17.- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA	UNIDAD M3	OPERACIONES ARITMETICAS	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA
			No. De Estimacion. : 1 (UNO)
CROQUIS			
			
VOLUMEN:		TOTAL 43.16	
Elaboró:  Ing. Guillermo Anador Lara Residente-Compañia Rio Florido Constructora		Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente	
VOLUMEN A PAGAR: 43.16 M3		REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio	Logo: CONSTRUCTORA S.A. DE FLORIDO	Fecha: 22/06/2016
	Numero de Contrato: No.060/2016	Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA	No. De Estimacion. : 1 (UNO)	

"FOTOGRAFIAS"



Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente
---	---

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 23 de Mayo al 21 de Junio Numero de Contrato: No.060/2016		Fecha: 22/06/2016
Obra: EQUIPAMIENTO DE PILA Y CONEXION A LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE LA CASITA		No. De Estimacion. : 1 (UNO)		
"FOTOGRAFIAS"				
				
Elaboró: Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora		Revisó:  Ing. Manuel Escobedo Hernandez Residente		
