

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua. México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

RFC: MCI651010V22

FACTURA**Folio Fiscal:**

D0803221-B192-4CEA-ADBA-68114ABE6CA5

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-06-27T11:06:05

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2016/06/27 T 11:06:05

Serie y Folio:

A228

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BANOS)"	1.00	\$44,211.22	\$44,211.22
		ESTIMACION NUMERO 1 SEGUN CONTRATO NUM. 074/2016			
		 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANJE DE LA ESTIMACION \$ 44,211.22 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO			
		0.2% I.C.I.C. \$ 88.42 0.2% DIF \$ 88.42 0.2% CMIC \$ 88.42 SUMA \$ 265.26 NETO A RECIBIR \$ 51,019.75			

**Total con letra:**

Cincuenta y un mil doscientos ochenta y cinco pesos 02/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:

No identificado

Número de Cuenta:

No Aplica

SUBTOTAL

\$44,211.22

IVA 16.00%

\$7,073.80

TOTAL

\$51,285.02

Sello digital del Emisor:QWw2whiPM/iINuG7rFBBt1DxdxcIP0gAlq6wcYmFPhP0qndwFyQSKepBGFrlYjifDCXgtdxll4QmSWem5x3YO7a4vIZmX6s3BBtrBfqSSvTxFAk27wGrAylwGRvjfrs5
cA9KLM77tFOOZ7X8n5/9bl+tc9GKQN54gong0kGQTpDUFWczcDyVpOdd1kJP7AR6CjOIRJ62oBLw0RvRvk5MjlgBvGpCzliZgagyruruf44A9wyNV7JhBg4ek2/tyc43
H+HePg8/PcVgR7kXpT7v2OIdmBQdLRRt+Y6yR828yl8eS50CYteajiVBcmdLeJRYbIZWcOmhrJtIMZ7JXBg==**Sello digital del SAT:**VfQLe5JtRblYz46tV0WCUFAMCcl/d5skAnTbkeEjg080CxlyrZk5kACaDoH++M3K45Jpp5YDV5Un4sdtxndBZyanRBSmxOrUukK71H78vDN7fimXxc0o01YdlxCLk6zre5
hYafIJYMaANJPjXWINYSiOCANoR3hz68sAJr3I9d8=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0||d0803221-b192-4cea-adba-68114abe6ca5|2016-06-27T11:06:05|QWw2whiPM/iINuG7rFBBt1DxdxcIP0gAlq6wcYmFPhP0qndwFyQSKepBGFrlYjifDCXgtdxll4QmSWem5x3YO7a4vIZmX6s3BBtrBfqSSvTxFAk27wGrAylwGRvjfrs5cA9KLM77tFOOZ7X8n5/9bl+tc9GKQN54gong0kGQTpDUFWczcDyVpOdd1kJP7AR6CjOIRJ62oBLw0RvRvk5MjlgBvGpCzliZgagyruruf44A9wyNV7JhBg4ek2/tyc43H+HePg8/PcVgR7kXpT7v2OIdmBQdLRRt+Y6yR828yl8eS50CYteajiVBcmdLeJRYbIZWcOmhrJtIMZ7JXBg==||00001000000301251152||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

HCO110712730

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

D0803221-B192-4CEA-ADBA-68114ABE6CA5

2016-06-27T11:06:05

2016-06-27T11:06:05

CFA110411FW5

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$51,285.02

Ingreso

Vigente

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 074/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 404,241.90 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016	
UBICACIÓN: EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 51,285.02 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 51,285.02 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 44,211.22	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 44,211.22	

--

DESCUENTOS		
0.1% Sancion por Retraso	\$	0.00
0.2% I.C.I.C.	\$	88.42
0.2% DIF.	\$	88.42
0.2% CMIC	\$	88.42
SUMA DESCUENTOS	\$	265.26
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	44,211.22
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	44,211.22
I.V.A.	\$	7,073.79
TOTAL	\$	51,285.01
(CON LETRA)		
(CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 1/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	265.26
SALDO NETO A RECIBIR	\$	51,019.75

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
RESIDENTE M.O.P.M.	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

13 DE JUNIO

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. LA CANTIDAD DE: \$ 51,019.76
(CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 074/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 404,241.90 INCLUYE CONVENIO
CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	44,211.22
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 44,211.22
	IVA	\$ 7,073.80
	TOTAL	\$ 51,285.02
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
SANCION POR RETRASO 0.5%	0	
C.M.I.C.. DEL 0.2%	88.42	
DIF 0.2%	88.42	
I.V.C.S 0.2%	88.42	
SUMA	265.26	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 404,241.90
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 51,285.02
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 51,285.02
POR EJERCER	\$ 352,956.88

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 571.14	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 88.42	\$ 293.03	\$ 88.42
ACUMULADO ACTUAL	\$ 88.42	\$ 864.17	\$ 88.42

R E C I B I M O S


HORMONTE CODONOR S.A. DE C.V.
HCO110712730



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"
MUNICIPIO: EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERÍODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1
No. CONTRATO: 074/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
	\$	44,211.22
<u>EXCEDENTES</u>		
	\$	-
<u>EXTRAS</u>		
	\$	-

SUBTOTAL \$	44,211.22
I.V.A. \$	7,073.79
TOTAL \$	51,285.01

POR EL CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION.

ING. RODOLFO MARTINEZ



CHIHUAHUA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
2016

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"

MUNICIPIO: EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)

CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

ESTIMACIÓN No. 1

No. CONTRATO: 07/4/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			

OBRA NORMAL

\$ 44,211.22

CIMENTACION Y PISO

\$ 44,211.22

1	1. Limpieza de Terreno. Incluye: Deshierbe y Acarreo a 20 Mts., La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	237.6	0	0	0	0	0	0
2	2. Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)	M2	57.69	62.82	0	62.82	4.45	279.55	279.55
3	3. Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad. Incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagan Sobre Anchos)	M3	31.32	17.33	0	17.33	86.05	1491.25	1491.25
4	4. Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2, T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor. Incluye: El suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	46.44	34.71	0	34.71	117.41	4075.3	4075.3
5	5. Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. de 0.60 x 0.15 mts. Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms. fy=200 kg/cvm2. , en el sentido Transversal. Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero. Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días. Cimbrado. Descimbrado y todo lo Necesario para su correcta Ejecución. Ver Plano.	ML	74.7	63.03	0	63.03	285.2	17976.16	17976.16
6	6. Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., Incluye: Suministro del material producto de banco. Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apisonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	27.54	20.29	0	20.29	134.9	2737.12	2737.12

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS "EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)"
MUNICIPIO: EN EJIDO ESTACION TERRAZAS (9 BAÑOS)
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No. 1
No. CONTRATO: 074/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
7	Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm.H en O., TMA 3/4" (19 mm), incluye: los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..	M2	44.55	25.44	0	25.44	185.2	4711.49	
8	Dado desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	77.4	0	0	60.5	213.89	12940.35	

POR EL CONTRATISTA

ARQ. BRIAN JAVIER LUGO PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING RODOLFO ORTIZ MARTINEZ

1000

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

17.33 M3

2.80

1.95

2.10

2.65

0.15

0.05

6.50

0.15

0.05

17.33 M3


Zapata Ref. 2004/01/01
1 va 25, 10 30 cms

RESIDENTE _____

CONTRATISTA

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016


RESIDENTE _____

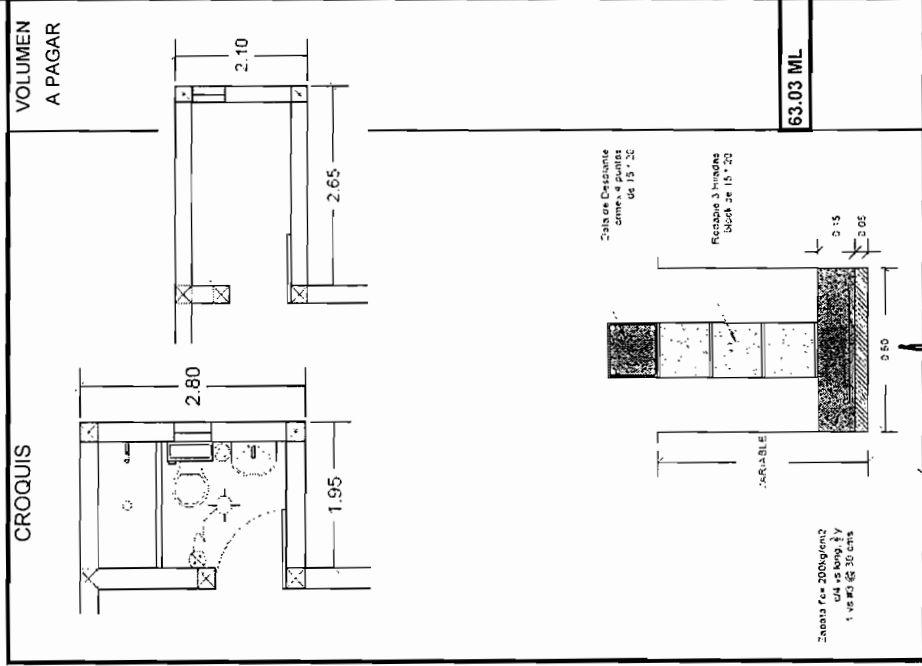

1000

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	6	OPERACIONES ARITMETICAS
CIMENTACION Y PISO		
Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producido de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la humedad óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		VOLUMEN DE EXCAVACION 17.33 M3
		VOLUMEN DE PLANTILLA 34.71 M2 X .05=1.74 M3
		VOLUMEN DE ZAPATA 63.03 ML X0.5 X .15=4.73 M3
		VOLUMEN DE RODAPIE 6.8 X .3=2.04 X .15= 306X 8 BAÑOS=2.448 M3
		6.1 X .3=1.83 X .15=0.275 M3
		TOTAL DIFERENCIA 17.33-1.74-4.73-2.448-0.275=-8.137 M3
		RELLENO DENTRO DE BAÑO 1.8X2.5=4.5 X .3=1.35 X 9 BAÑOS=12.15 M3
		TOTAL 20.29 M3

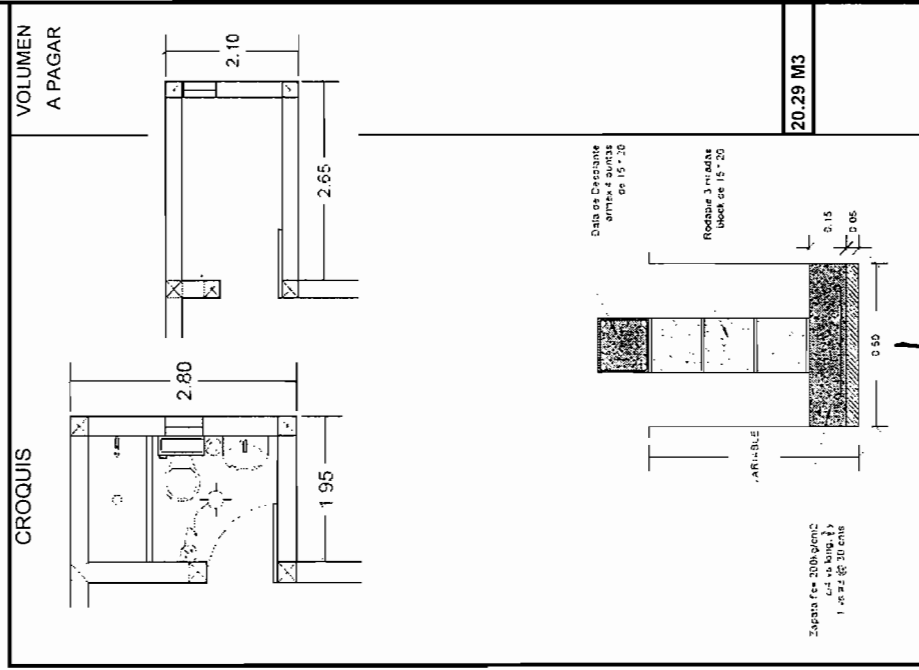


RESIDENTE

CONTRATISTA

--


No DE ESTIMACION:	1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
-------------------	--

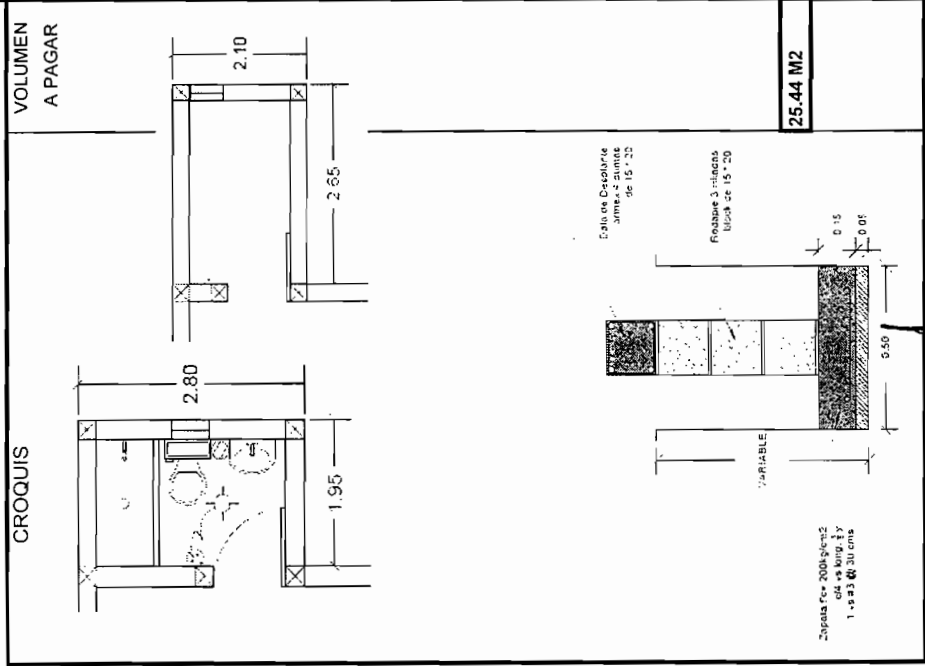[illegible]

RESIDENTE _____

1000

Nº DE ESTIMACION:	1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
-------------------	--

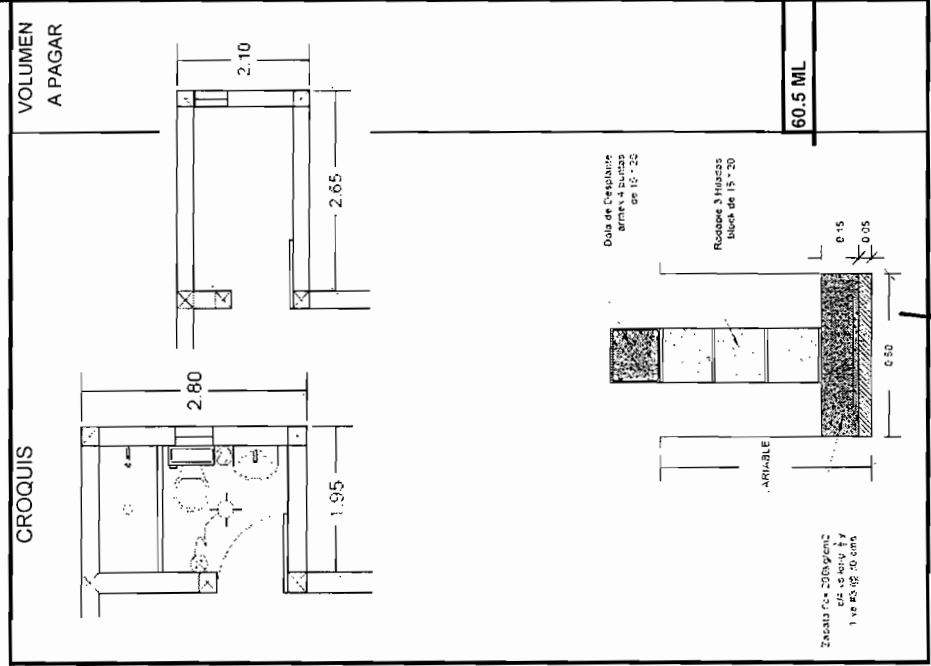[illegible]




RESIDENTE _____

[Signature]

~~CONTRATISTA~~

[Signature]

FOTOGRAFIAS

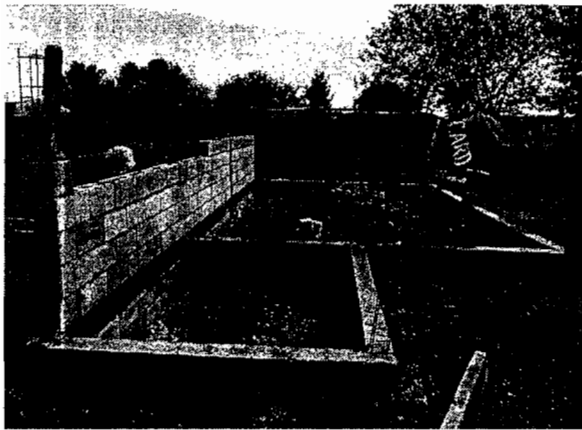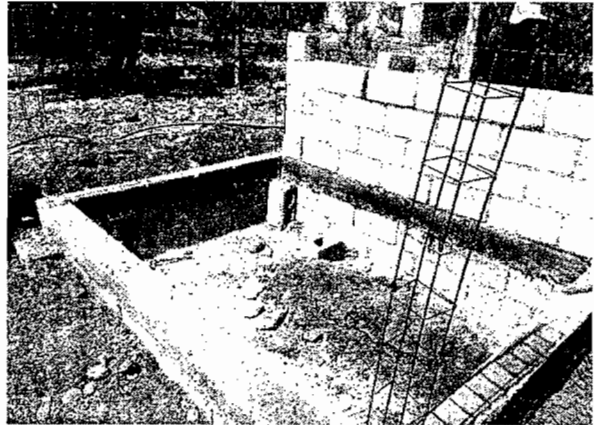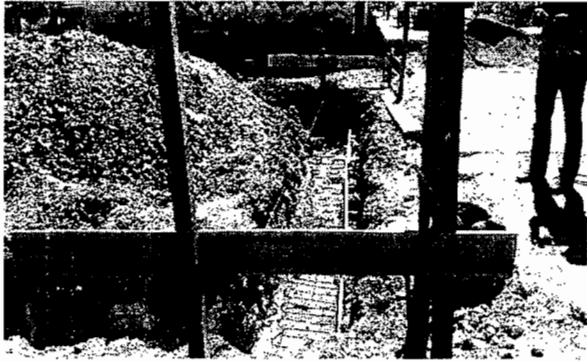

Calderon
