

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO C.P. 31000

RFC:MCI651010V22

FACTURA**Folio Fiscal:**

B411CA72-2FED-41C1-86D9-F3620FC15A2F

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-07-14T10:52:12

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2016/07/14 T 10:52:12

Serie y Folio:

A234

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS EN EJIDO ESTACION TERRAZAS	1.00	\$103,954.75	\$103,954.75

ESTIMACION NUMERO 1

SEGUN CONTRATO NUM. 075/2016

FIRMA DEL CONTRATISTA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 144,269.71

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 40,314.96

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% DIF \$ 288.54

0.2% CMIC \$ 288.54

0.2% ICIC \$ 288.54

SUMA \$ 865.62

NETO A RECIBIR \$ 119,721.89

**Total con letra:**

Ciento veinte mil quinientos ochenta y siete pesos 51/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:

No identificado

Número de Cuenta:

No Aplica

SUBTOTAL

\$103,954.75

IVA 16.00%

\$16,632.76

TOTAL

\$120,587.51

Sello digital del Emisor:

GS2/+RCZCYIXXiiPSY9XerQFpwpdJ7vVYmJJuIVqV7aitRRCm0wYxV+Sn1KJlg+zEzb66GXkvd8pLxWCu6LJYPLN1oBnWf5S48vrGbxwYncHNy6PHIVG/jzPc0OAIMPSOTZPII3qigjZPvsCIU3kbAEgzaZShXsvSF8IP28LGA9GKSHMPEBs/ut/uFwkBIK98GIOPqSj+GEoSqYox5/Fxn9lqkVj4vW+KlplfutRohN20dfhw9tuR2X5r3YwqojvUAgVWAv/pg7q4nYGfMGbHHY6rO6qn2saYX5iPgkiuFQVFgYq0RHvK5ddUJjTnJtz+2IRm3rcdGuHrQBIAmHq==

Sello digital del SAT:

G1htwS2dseSf/27l+/+rejVpotFbLzvXWZV5Q5uxPpvXw1NbxAuoxOVJuHXUIPvToPIZaqqMbal2FTOQSRzeMV7OCvAcNZQhZG4AICycVz2+85EUGJ4vcunv8rOFLU0weXOMBAbXO0GE8e25DUhTmw61NaStqEcfOh7fsWGWNI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b411ca72-2fed-41c1-86d9-f3620fc15a2f|2016-07-14T10:52:12|GS2/+RCZCYIXXiiPSY9XerQFpwpdJ7vVYmJJuIVqV7aitRRCm0wYxV+Sn1KJlg+zEzb66GXkvd8pLxWCu6LJYPLN1oBnWf5S48vrGbxwYncHNy6PHIVG/jzPc0OAIMPSOTZPII3qigjZPvsCIU3kbAEgzaZShXsvSF8IP28LGA9GKSHMPEBs/ut/uFwkBIK98GIOPqSj+GEoSqYox5/Fxn9lqkVj4vW+KlplfutRohN20dfhw9tuR2X5r3YwqojvUAgVWAv/pg7q4nYGfMGbHHY6rO6qn2saYX5iPgkiuFQVFgYq0RHvK5ddUJjTnJtz+2IRm3rcdGuHrQBIAmHq==|00001000000301251152||



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HCO110712730	HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
B411CA72-2FED-41C1-86D9-F3620FC15A2F	2016-07-14T10:52:12	2016-07-14T10:52:12	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$120,587.51	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 075/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS"EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 838,057.52 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016	
UBICACIÓN: EJIDO ESTACION TERRAZAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 167,352.86 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 167,352.86 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 118,710.56	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 25,559.15	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 144,269.71	

DESCUENTOS

0.1% Sancion por Retraso	\$ 0.00
0.2% I.C.I.C.	\$ 288.54
0.2% DIF.	\$ 288.54
0.2% CMIC	\$ 288.54
SUMA DESCUENTOS	\$ 865.62

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 144,269.71
AMORT ANTICIPO	\$ 40,314.96
SUB-TOTAL	\$ 103,954.75
I.V.A.	\$ 16,632.76
TOTAL	\$ 120,587.51

(CON LETRA)

(CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
51/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 865.62
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 119,721.89

AUTORIZO

ELABORO

ING. RODOLFO DE LA MARTINEZ
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO

SUBDIRECTOR DE OBRA
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo.

ING. ENRIQUE GUERRA ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO



CHIHUAHUA, CHIH.,

13 DE JUNIO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 119,721.89
(CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 89/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 075/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 838,057.52 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS"EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	144,269.71
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	40,314.96
		SUBTOTAL	\$ 103,954.75
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		IVA	\$ 16,632.76
SANCION POR RETRASO 0.5%	0	TOTAL	\$ 120,587.51
C.M.I.C. DEL 0.2%	288.54		
DIF 0.2%	288.54		
I.V.C.S 0.2%	288.54		
SUMA	865.62		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 838,057.52
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 167,352.86
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 167,352.86
POR EJERCER	\$ 670,704.66

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 251,417.26
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 46,765.35
ACUMULADO ACTUAL	\$ 46,765.35
POR AMORTIZAR	\$ 204,651.91

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 288.54	\$ 288.54	\$ 288.54
ACUMULADO ACTUAL	\$ 288.54	\$ 288.54	\$ 288.54

R E C I B I M O S

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
HCO110712730



 CHIHUAHUA ESTADO LIBRE Y SOBERANO		CONCEPTOS		VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL									
	OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MISTEN EJIDO ESTACION TERRAZAS								\$ 118,710.56
	MUNICIPIO: EJIDO ESTACION TERRAZAS								
	CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.								
	PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016								
	ESTIMACIÓN No. 1								
	No. CONTRATO: 07/5/2016								

CIMENTACION Y PISO						
2) Trazo y Nivelación del Terreno. (Área de Edificios)	M2	258.3	288.54	0	288.54	4.47
3) Anchos	M3	80.64	51.48	0	51.48	90.92
4) para su correcta ejecución.	M2	104.76	93.6	0	93.6	131.14
5) Todo lo Necesario para su correcta Ejecución. Ver Plano.	ML	104.76	104.76	0	104.76	304.5
6) necesario para su correcta ejecución.	M3	98.82	88.323	0	88.323	136.93
7) necesario para su correcta ejecución.	M2	109.98	73.89	0	73.89	198.06
						\$ 118,710.56

POR EL CONTRATISTA:
ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ROBERTO ORTIZ MARTINEZ



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MISEN EJIDO ESTACION TERRAZAS"
MUNICIPIO:	EJIDO ESTACION TERRAZAS
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No.	1
No. CONTRATO:	075/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	Dala desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) . Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en							
8	PLANTA BAJA.	ML	174.6	175.95	0	175.95	\$	41837.39

OBRA EXCEDENTE	\$	25,559.15
----------------	----	-----------

CIMENTACION Y PISO									
2	Trazo y Nivelacion del terreno. (Area de Edificios)	M2	258.3	288.54	258.3	30.24	4.47	135.17	
5	Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2, H. en O., de 0.60 x 0.15 mts. Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms., f'y=200 kg/cvm2., en el sentido Transversal. Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero. Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 dias, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecucion, Ver Plano.	ML	104.76	187.2	104.76	82.44	304.5	25102.98	
8	Dala desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.	ML	174.6	177.3	175.95	1.35	\$	237.78	321

POB EL CONTRATISTA:

ARG. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

FOR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

1000

No DE ESTIMACION:	1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
	CROQUIS
	VOLUMEN

Chapman




~~CONTRATISTA~~

--	--

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

John Doe

~~CONTRATISTA~~

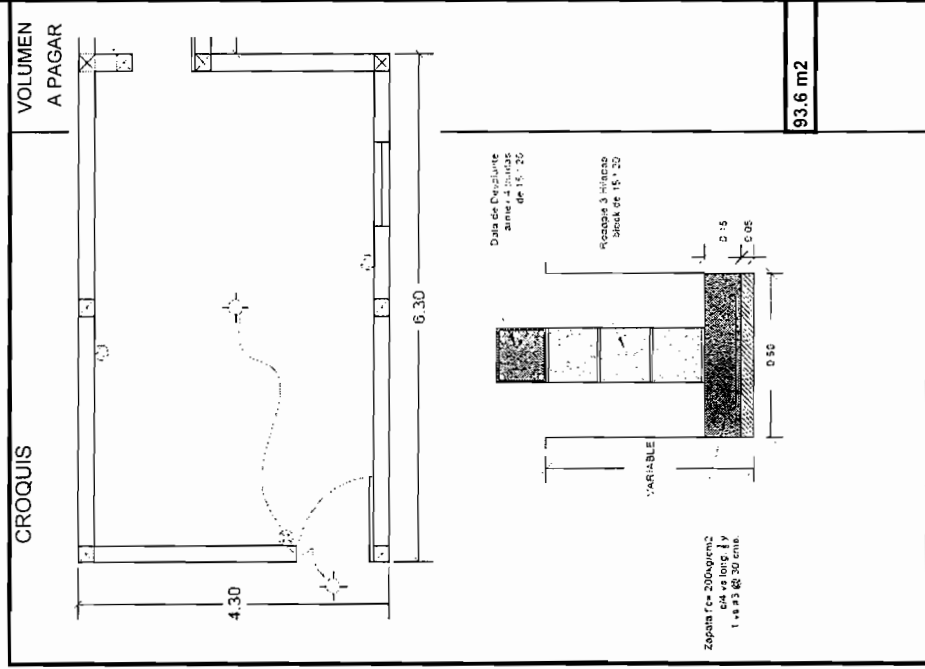


15 JULY 2004

No DE ESTIMACION:	1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
-------------------	--

Colleen Smith

~~CONTRATISTA~~

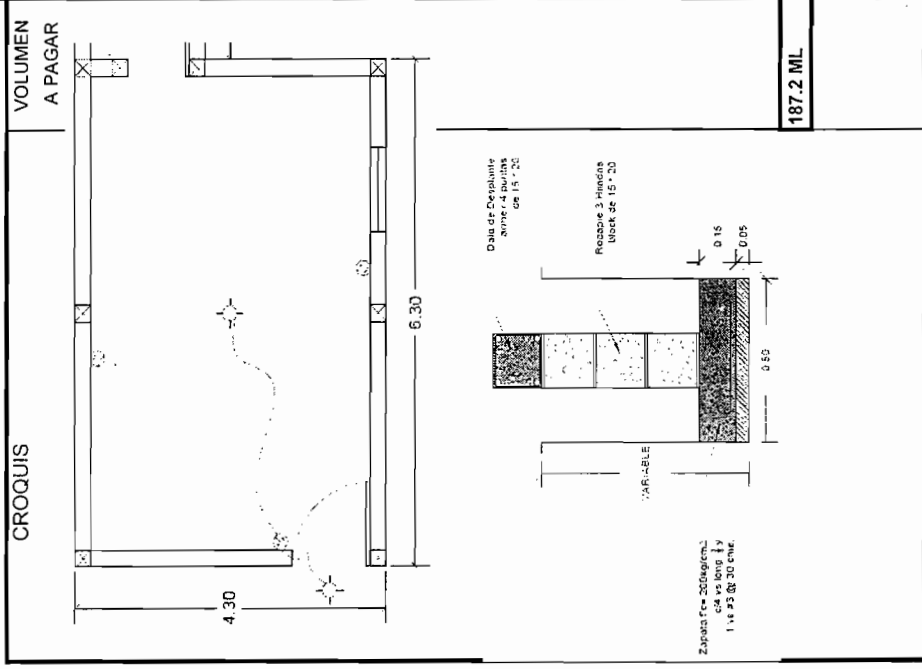


--	--

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

VOLUMEN

CONTRATISTA

1000

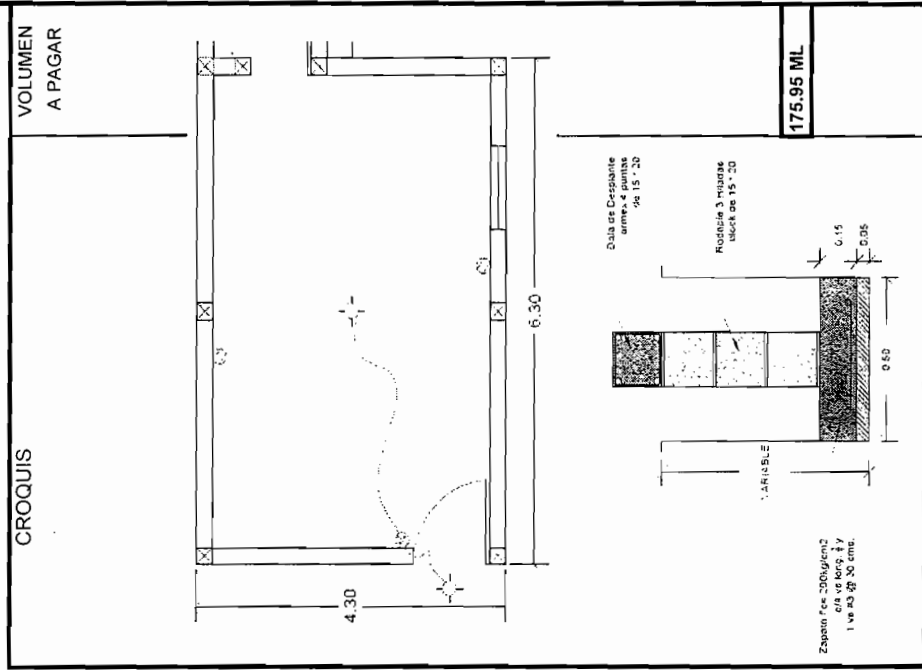[illegible]


RESIDENTE


CONTRATISTA

FOTOGRAFIAS

