

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua. México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO C.P. 31000

RFC:MCI651010V22

FACTURA**Folio Fiscal:**

B411CA72-2FED-41C1-86D9-F3620FC15A2F

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-07-14T10:52:12

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2016/07/14 T 10:52:12

Serie y Folio:

A234

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS EN EJIDO ESTACION TERRAZAS ESTIMACION NUMERO 1 SEGUN CONTRATO NUM. 075/2016  FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 144,269.71 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 40,314.96 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% DIF \$ 288.54 0.2% CMIC \$ 288.54 0.2% ICIC \$ 288.54 SUMA \$ 865.62 NETO A RECIBIR \$ 119,721.89	1.00	\$103,954.75	\$103,954.75
			Total con letra: Ciento veinte mil quinientos ochenta y siete pesos 51/100.-MXN Forma de Pago: Pago en una sola exhibición. Método de Pago: No identificado Número de Cuenta: No Aplica		
			SUBTOTAL \$103,954.75 IVA 16.00% \$16,632.76 TOTAL \$120,587.51		

Sello digital del Emisor:

GS2/+RCZCYIXXiiPSY9XerQFpwpdJ7vVYmJJuIVqV7aitRRcm0wYxv+Sn1KJlg+zEzb66GXkvd8pLxWCu6LJYPLN1oBnWf5S48vrGtxwYncHNy6PHIVG/jzPc0OAIMPSOTZPII3qigjZPvsCIU3kbAEgzaZShXsvSF8IP28LGA9GKSHMPEBs/ut/uFwkBIK98GIOPqSj+GEoSqYox5/Fxn9lqkVj4vW+KlplfutRohN20dfhw9tuR2X5r3YwqojvUAgVWAv/pg7q4nYGfMGbHHY6rO6qn2saYX5iPgkiuFQVFgYq0RHvK5ddUJijTnJtz+2IRm3rcdGuHrQBIAmHQ==

Sello digital del SAT:

G1htwS2dseSf/27l+/+rejVpotFxbLzvXWZV5Q5uxPpvXw1NbxAuoxOVJuHXUIPvToPiZaqqMbal2fTOQSRzeMV7OCvAcNZQhZG4AICycVz2+85EUGJ4vcunv8rOFLU0weXOmbAbXO0GE8e25DUhTmw61NaStqEcOh7fsWGWNI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b411ca72-2fed-41c1-86d9-f3620fc15a2f|2016-07-14T10:52:12|GS2/+RCZCYIXXiiPSY9XerQFpwpdJ7vVYmJJuIVqV7aitRRcm0wYxv+Sn1KJlg+zEzb66GXkvd8pLxWCu6LJYPLN1oBnWf5S48vrGtxwYncHNy6PHIVG/jzPc0OAIMPSOTZPII3qigjZPvsCIU3kbAEgzaZShXsvSF8IP28LGA9GKSHMPEBs/ut/uFwkBIK98GIOPqSj+GEoSqYox5/Fxn9lqkVj4vW+KlplfutRohN20dfhw9tuR2X5r3YwqojvUAgVWAv/pg7q4nYGfMGbHHY6rO6qn2saYX5iPgkiuFQVFgYq0RHvK5ddUJijTnJtz+2IRm3rcdGuHrQBIAmHQ==|00001000000301251152||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HCO110712730	HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
B411CA72-2FED-41C1-86D9-F3620FC15A2F	2016-07-14T10:52:12	2016-07-14T10:52:12	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$120,587.51	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 075/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS" EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 838,057.52 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016	
UBICACIÓN: EJIDO ESTACION TERRAZAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 167,352.86 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 167,352.86 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 118,710.56	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 25,559.15	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 144,269.71	

--

DESCUENTOS		
0.1% Sancion por Retraso	\$	0.00
0.2% I.C.I.C.	\$	288.54
0.2% DIF.	\$	288.54
0.2% CMIC	\$	288.54
SUMA DESCUENTOS	\$	865.62
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	144,269.71
AMORT ANTICIPO	\$	40,314.96
SUB-TOTAL	\$	103,954.75
I.V.A.	\$	16,632.76
TOTAL	\$	120,587.51
(CON LETRA)		
(CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	865.62
SALDO NETO A RECIBIR	\$	119,721.89

AUTORIZO	ELABORO
 <u>ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ</u> RESIDENTE D.O.P.M. Vo. Bo.	 <u>HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA REVISO
 <u>ING. XOCHITL PEREZ BLANCO</u> SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Vo. Bo.	 <u>ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN</u> JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
 <u>ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

13 DE JUNIO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 119,721.89
(CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 89/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 075/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 838,057.52 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS"EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	144,269.71
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$	40,314.96
	SUBTOTAL	\$	103,954.75
	IVA	\$	16,632.76
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		TOTAL	\$ 120,587.51
SANCION POR RETRASO 0.5%	0		
C.M.I.C.. DEL 0.2%	288.54		
DIF 0.2%	288.54		
I.V.C.S 0.2%	288.54		
SUMA	865.62		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 838,057.52
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 167,352.86
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 167,352.86
POR EJERCER	\$ 670,704.66


2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 251,417.26
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 46,765.35
ACUMULADO ACTUAL	\$ 46,765.35
POR AMORTIZAR	\$ 204,651.91

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 288.54	\$ 288.54	\$ 288.54
ACUMULADO ACTUAL	\$ 288.54	\$ 288.54	\$ 288.54

R E C I B I M O S


HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
HCO110712730



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MISTEN EJIDO ESTACION TERRAZAS			
MUNICIPIO:	EJIDO ESTACION TERRAZAS			
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.			
PERIODO:	30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016			
ESTIMACIÓN No.	1			
No. CONTRATO:	07/5/2016			

CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				
OBRA NORMAL										
\$ 118,710.56										

CIMENTACION Y PISO										
2	Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)	M2	258.3	258.54	0	258.54	4.47		1289.77	
3	Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad. Incluye: Aline de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre Anchos)	M3	80.64	51.48	0	51.48	90.92		4680.56	
4	Planilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2.T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor. Incluye:El suministro de materiales y sus desperdicios. La herramienta. El equipo, La mano de obra. El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	104.76	93.6	0	93.6	131.14		12274.7	
5	Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. de 0.60 x 0.15 mts.Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms..fy=200 kg/cvm2. en el sentido Transversal. Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero. Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días. Cimbrado, Descimbrado y todo lo necesario para su correcta Ejecución. Ver Plano.	ML	104.76	104.76	0	104.76	304.5		31899.42	
6	Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producto de banco. Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	98.82	88.323	0	88.323	136.93		12094.07	
7	Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm.H.en O., TMA 3/4"(19 mm), incluye:los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..	M2	109.98	73.89	0	73.89	198.06		14634.65	

POB-CONTRATISTA:

ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

ING. ROBERTO ORTIZ MARTINEZ

FOR LA OFICINA DE CONSTRUCCION



OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MIS'EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"
MUNICIPIO:	EJIDO ESTACION TERRAZAS
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016
ESTIMACIÓN No.	1
No. CONTRATO:	07/5/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
8	Dala desplante de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntos (10x16x4) , incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.	ML	174.6	175.95	0	175.95 \$	237.78	41837.39

OBRA EXCEDENTE		\$		\$ 25,559.15	
----------------	--	----	--	--------------	--

CIMENTACION Y PISO					\$	25,559.15	
2) Trazo y Nivelacion del terreno. (Area de Edificios)	M2	258.3	288.54	258.3	30.24	4.47	135.17
Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O., de 0.60 x 0.15 mts. Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms. f'y=200 kg/cvm2 , en el sentido Transversal. Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días. Cimbrado, Descimbrado y							
5) Todo lo Necesario para su correcta Ejecucion. Ver Plano.	ML	104.76	187.2	104.76	82.44	304.5	25102.98
Dala desplante de Concreto f'c=200 kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntos (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion en							
8) PLANTA BAJA.	ML	174.6	177.3	175.95	1.35	237.78	321

POB EL CONTRATISTA:

ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION


1000

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO 075/2016	TRAMO:	EJIDO ESTACION TERRAZAS
OBRA :	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS'EN EJIDO ESTACION TERRAZAS"	CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016		
CONCEPTO	5	OPERACIONES ARITMETICAS
CIMENTACION Y PISO		
Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. de 0.60 x 0.15 mts.Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms.,fy=200 kg/cvm2. , en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 dias, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecucion, Ver Plano.		
		CUARTO 1
		6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML
		CUARTO 2
		6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML
		CUARTO 3
		6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML
		CUARTO 4
		6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML
		CUARTO 5
		6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML
		CUARTO 6
		6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML
	CUARTO 7	
	6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML	
	CUARTO 8	
	6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML	
	CUARTO 9	
	6.75+6.75+3.65+3.65=20.8 ML	
	TOTAL	
	187.2 ML	

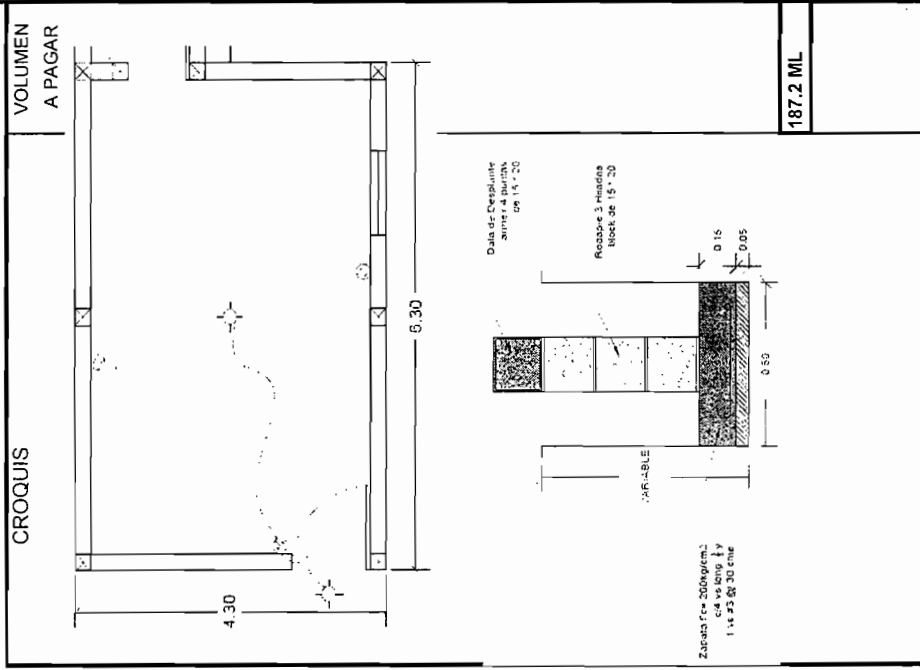


RESIDENTE

CONTRATISTA

--	--

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO: 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2016

CONTRATISTA

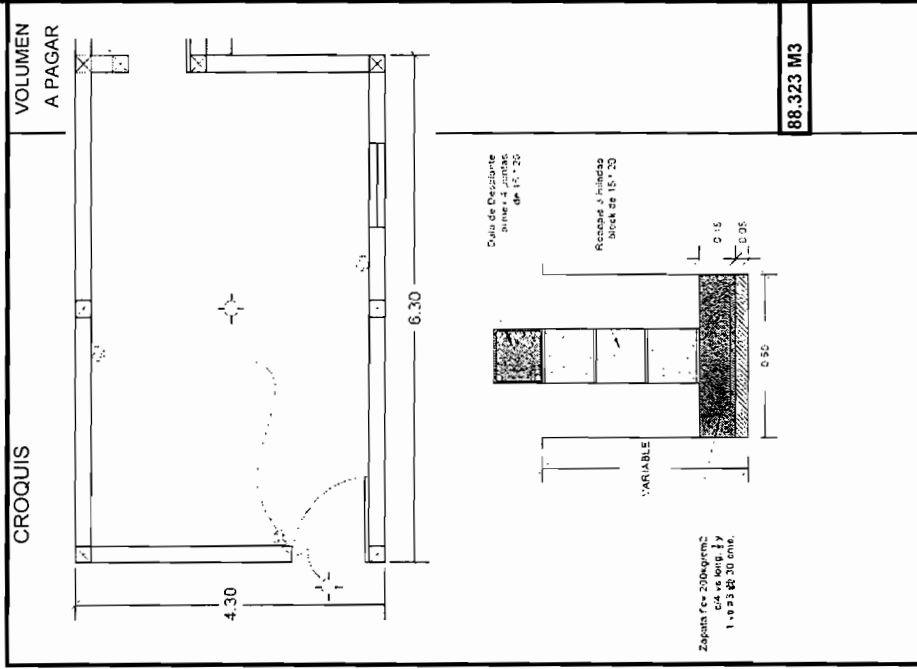

FOTOGRAFIAS

