

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GAFL670419GGA	JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
19150337-5993-40E7-9F2B-4396BE38B260	2016-06-22T14:54:18	2016-06-22T14:59:19	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$60,900.00	Ingreso	Vigente	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2016	CONTRATO No. 078/2016	CONTRATADOS
OBRA: PRUEBA DE AFORO EL FRESNO (EL TARIN)	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 60,900.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 27 DE MAYO AL 30 DE MAYO	
UBICACIÓN: SECCIÓN MUNICIPAL EL TARIN, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 60,900.00 CON IVA
CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC: GAFL670419GGA	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 60,900.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>PRUEBA DE AFORO EL FRESNO (EL TARIN)</u>	\$ 52,500.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 52,500.00

DESCUENTOS		
0.2% D.I.F.	\$	105.00
0.2% I.C.I.C.	\$	105.00
0.2% C.M.I.C.	\$	105.00
	\$	
SUMA DESCUENTOS	\$	315.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	52,500.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	52,500.00
I.V.A.	\$	8,400.00
TOTAL	\$	60,900.00
(CON LETRA)		
(SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 0/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	315.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	60,585.00

AUTORIZO	ELABORO
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ RESIDENTE D.O.P.M.	C. JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH., 26 DE MAYO DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 60,585.00
(SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NÚM.. 1 (UNO) CONTRATO No. 078/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 60,900.00
SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PRUEBA DE AFORO EL FRESNO (EL TARIN)

ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN		\$	52,500.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		\$	-
SUBTOTAL		\$	52,500.00
IVA		\$	8,400.00
TOTAL		\$	60,900.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
D.I.F. DEL 0.2%	105.00		
I.C.I.C. DEL 0.2%	105.00		
C.M.I.C. DEL 0.2%	105.00		
SUMA	315.00		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 60,900.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 60,900.00
ESTIMACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 60,900.00
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN	\$ 60,900.00
POR EJERCER	\$ 60,899.99

2.- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACIÓN	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00

R E C I B I M O S

JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ
GAFL670419GGA

No. CONTRATO: 078/2016

CONTRATISTA JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: 27 DE MAYO AL 30 DE MAYO

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

[illegible]

POR EL CONTARTISTA

JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ

POR EL DEPARTAMENTOM DE CONSTRUCCION

ING. SERIO DE LA O RUBIO

OBRA: PRUEBA DE AFORO EL FRESNO (EL TARIN)

MUNICIPIO: SECCIÓN MUNICIPAL EL TARIN, CHIH. No. CONTRATO: 078/2016

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ

PERIODO: 27 DE MAYO AL 30 DE MAYO

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLÚMENES ACUM. ANTERIOR		VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL				
1	AFORO DE POZO A 220 MTS DE PROFUNDIDAD, PRETENDIENDO EXTRAER 200 LPS							\$ 52,500.00
1.1	METODO Y EQUIPO A UTILIZAR PARA AFORO DE POZO EN LA COMUNIDAD EL TARIN, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA:							
1.1.1	BOMBA TIPO TURBINA DE 10 PASOS DE 6" LUBRICADA POR AGUA	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$18,519.59	\$ 18,519.59
1.1.2	COLUMNA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 220 MTS.	ml	220.00	0.00	0.00	220.00	\$78.90	\$ 17,358.00
1.1.3	SONDA NEUMÁTICA PARA DETECCIÓN DE NIVEL.	ml	220.00	0.00	0.00	220.00	\$17.47	\$ 3,843.40
1.1.4	CABEZAL DE 6" X 6".	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$1,345.50	\$ 1,345.50
1.1.5	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 150 HP CON CABEZAL DE ENGRANES PARA VELOCIDAD VARIABLE.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,885.19	\$ 5,885.19

José Luis Gallegos Fernández

OBRA: PRUEBA DE AFORO EL FRESNO (EL TARIN)

MUNICIPIO: SECCIÓN MUNICIPAL EL TARIN, CHIH. No. CONTRATO: 078/2016
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
PERIODO: 27 DE MAYO AL 30 DE MAYO

CONTRATISTA: JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLÚMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
1.1.6	EL AFORO SE DESARROLLARA DURANTE 8 HORAS DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO PRETENDIDO 2.00 LPS: 0 A 1/2 HORA ARRANQUE DE BOMBEO CON 100 RPM. 1/2 A 1 HORA AUMENTO DE VELOCIDAD A 200 RPM. 1 A 1 1/2 HORA AUMENTO DE VELOCIDAD A 400 RPM. 1 1/2 A 2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 600 RPM. 2 A 2 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 800 RPM. 2 1/2 A 3 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1000 RPM. 3 A 3 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1200 RPM. 3 1/2 A 4 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1400 RPM. 4 A 4 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1500 RPM. HASTA ESTE PUNTO SE SONDEARA EN CADA INCREMENTO DE VELOCIDAD PARA REGISTRAR EL ABASTECIMIENTO DEL POZO. 4 1/2 A 5 HORAS DESACELERACION A 1300 RPM, 5 A 5 1/2 HORAS DESACELERACION A 1100 RPM. 5 1/2 A 6 HORAS DESACELERACION A 900 RPM. 6 A 6 1/2 HORAS DESACELERACION A 700 RPM. 6 1/2 A 7 HORAS DESACELERACION A 500 RPM. 7 1/2 A 8 HORAS DESACELERACION A 100 RPM. HASTA ESTE PUNTO SE SONDEARA EN CADA CAMBIO DE VELOCIDAD A LA BAJA PARA REGISTRAR EL NIVEL DE RECUPERACION DEL POZO. POR ULTIMO SE ACELERARA HASTA LAS 1500 RPM PARA DETERMINAR EL NIVEL DINAMICO CON UN GASTO DE 2.00 LPS. NOTA: SI LOS NIVELES NO MUESTRAN ABATIMIENTO CON 2.00 LPS SE INCREMENTARA EL GASTO HASTA CONOCER EL MAXIMO DE APORTACION DEL POZO.	hr	8.00	0.00	0.00	\$693.54	\$ 5,548.32

Jesus m. Franco



Generadores de Obra para Estimación 1 - (Única)


Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
1.1.1	Bomba tipo turbina de 10 pasos de 6" lubricada por agua	1.00	pza
	1.00		
1.1.2	Columna de acero de 6" de diametro y una longitud de 220 mts	220.00	ml
	220.00		
1.1.3	Sonda neumatica para deteccion de nivel	220.00	ml
	220.00		
1.1.4	Cabezal de 6" x 6"	1.00	pza
	1.00		
1.1.5	Motor de combustion interna a diesel de 150 hp con cabezal de engranes para velocidad variable	1.00	pza
	1.00		
1.1.6	Desarrollo de aforo durante 8 horas	8.00	hr
	EL AFORO SE DESARROLLO DURANTE 8 HORAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 0 A 1/2 HORA ARRANQUE DE BOMBEO CON 100 RPM. 1/2 A 1 HORA AUMENTO DE VELOCIDAD A 200 RPM. 1 A 1 1/2 HORA AUMENTO DE VELOCIDAD A 400 RPM. 1 1/2 A 2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 600 RPM. 2 A 2 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 800 RPM. 2 1/2 A 3 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1000 RPM. 3 A 3 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1200 RPM. 3 1/2 A 4 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1400 RPM. 4 A 4 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1500 RPM. HASTA ESTE PUNTO SE MONITOREO EN CADA INCREMENTO DE VELOCIDAD PARA REGISTRAR EL ABATIMIENTO DEL POZO. 4 1/2 A 5 HORAS DESACELERACION A 1300 RPM. 5 A 5 1/2 HORAS DESACELERACION A 1100 RPM. 5 1/2 A 6 HORAS DESACELERACION A 900 RPM. 6 A 6 1/2 HORAS DESACELERACION A 700 RPM. 6 1/2 A 7 HORAS DESACELERACION A 500 RPM. 7 1/2 A 8 HORAS DESACELERACION A 100 RPM. HASTA ESTE PUNTO SE MONITOREO EN CADA CAMBIO DE VELOCIDAD A LA BAJA PARA REGISTRAR EL NIVEL DE RECUPERACION DEL POZO. POR ULTIMO SE ACELERO HASTA LAS 1500 RPM PARA DETERMINAR EL NIVEL DINAMICO EL CUAL ARROJO UN GASTO DE 2.00 LPS A UN NIVEL DINAMICO DE 134 MTS.	8.00	

Contratista:


José Luis Gallegos Fernández




Generadores de obra para Estimación 1




47




9

17

Jan

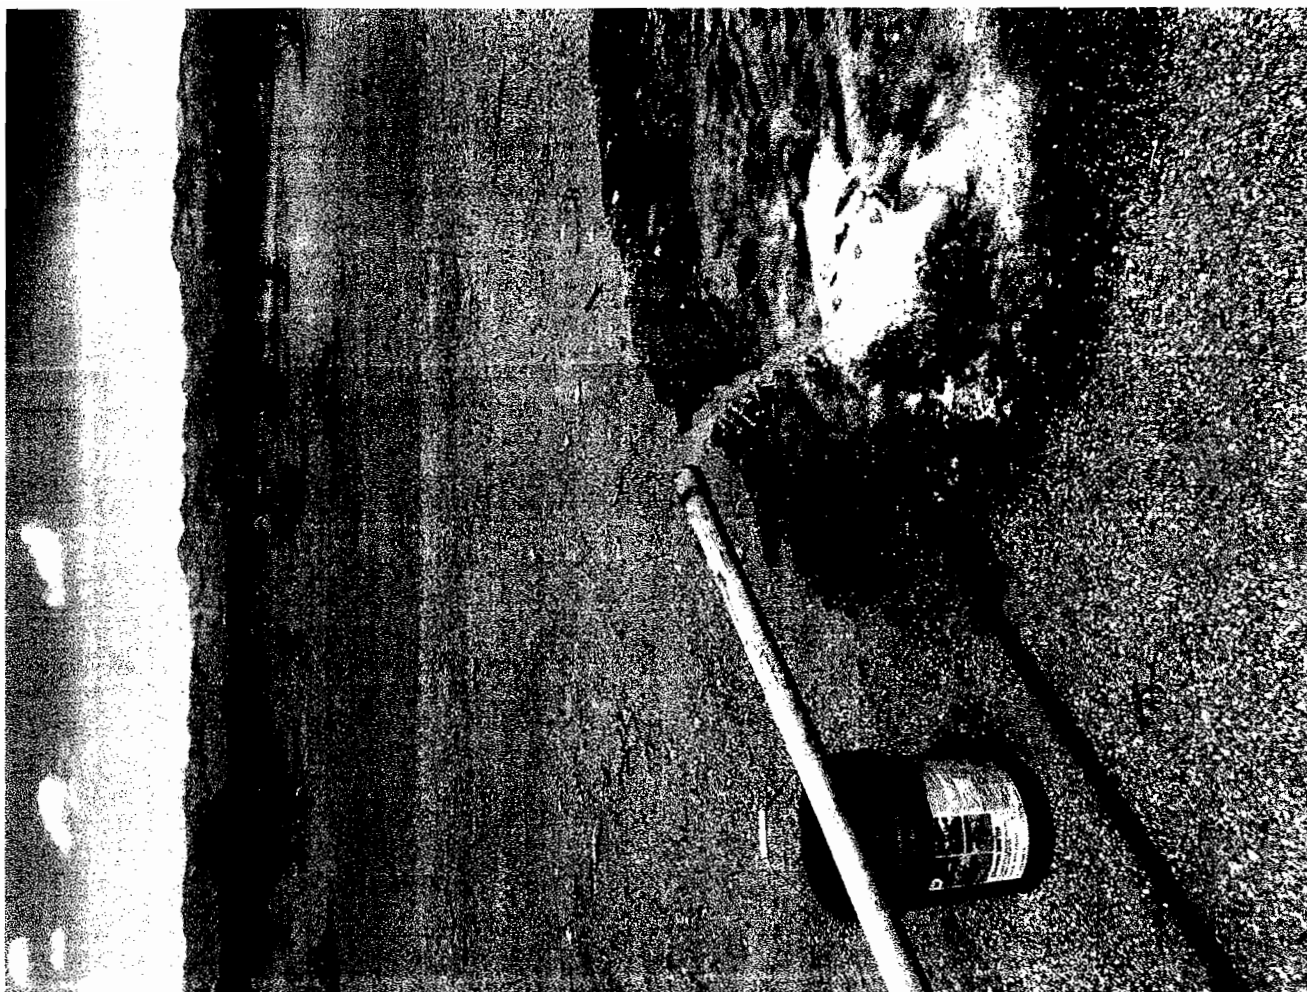


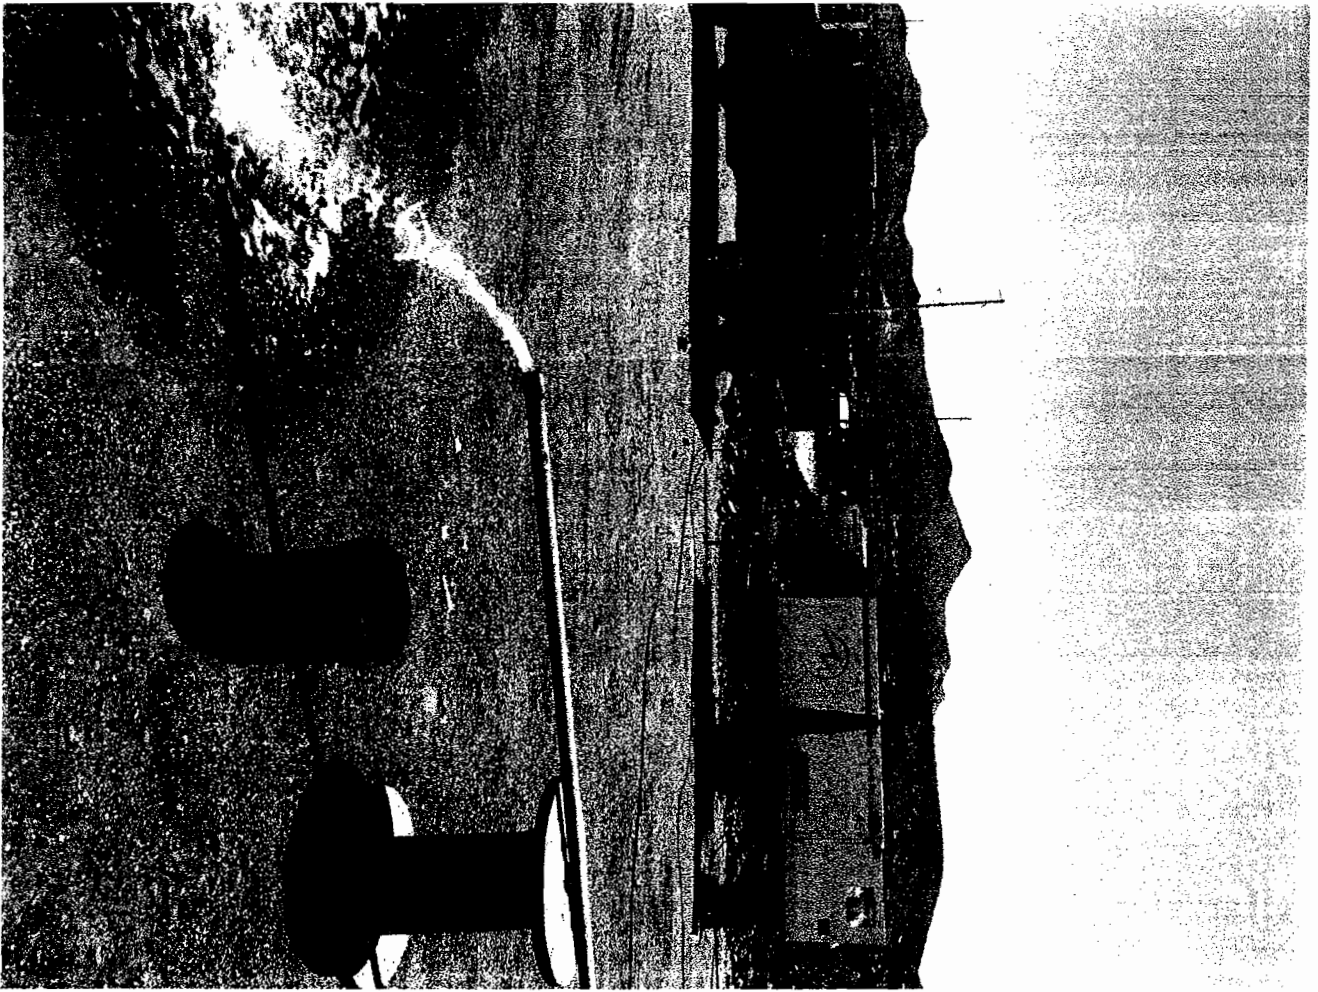

Je



AL

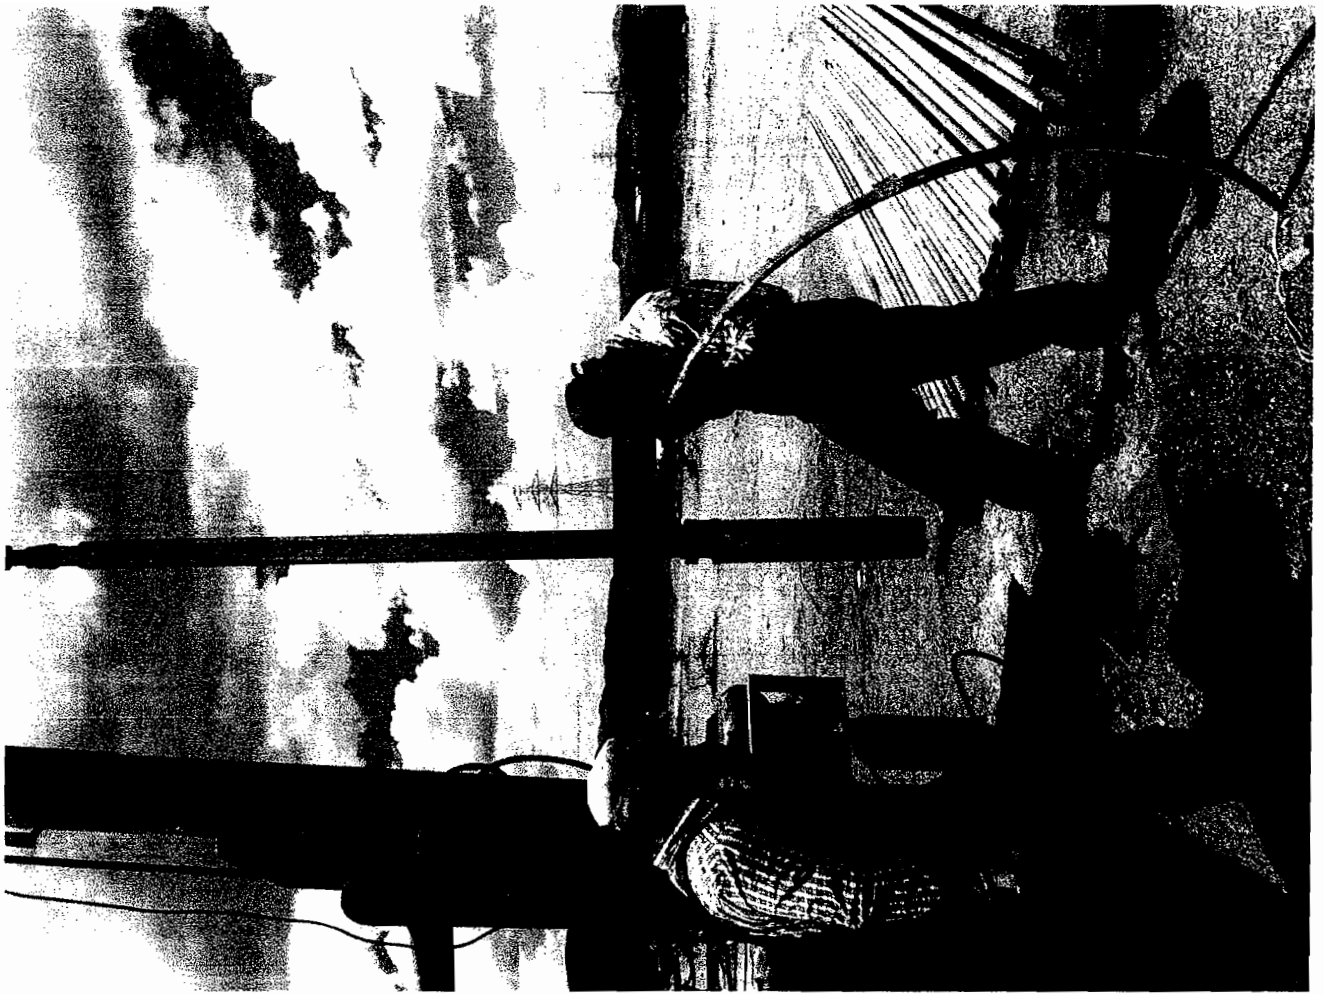


Je




14

4

Sp.

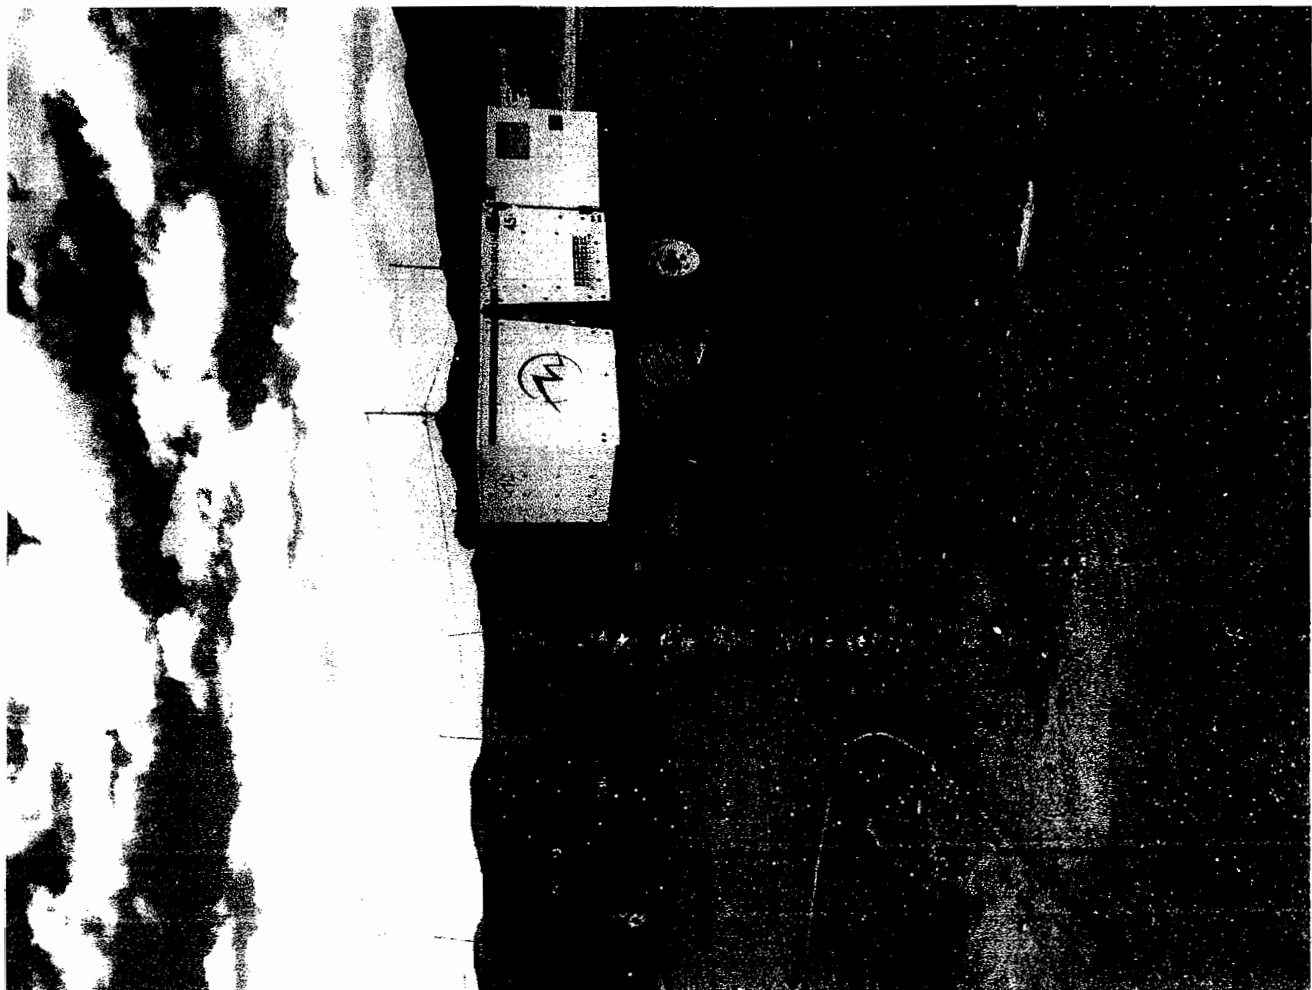

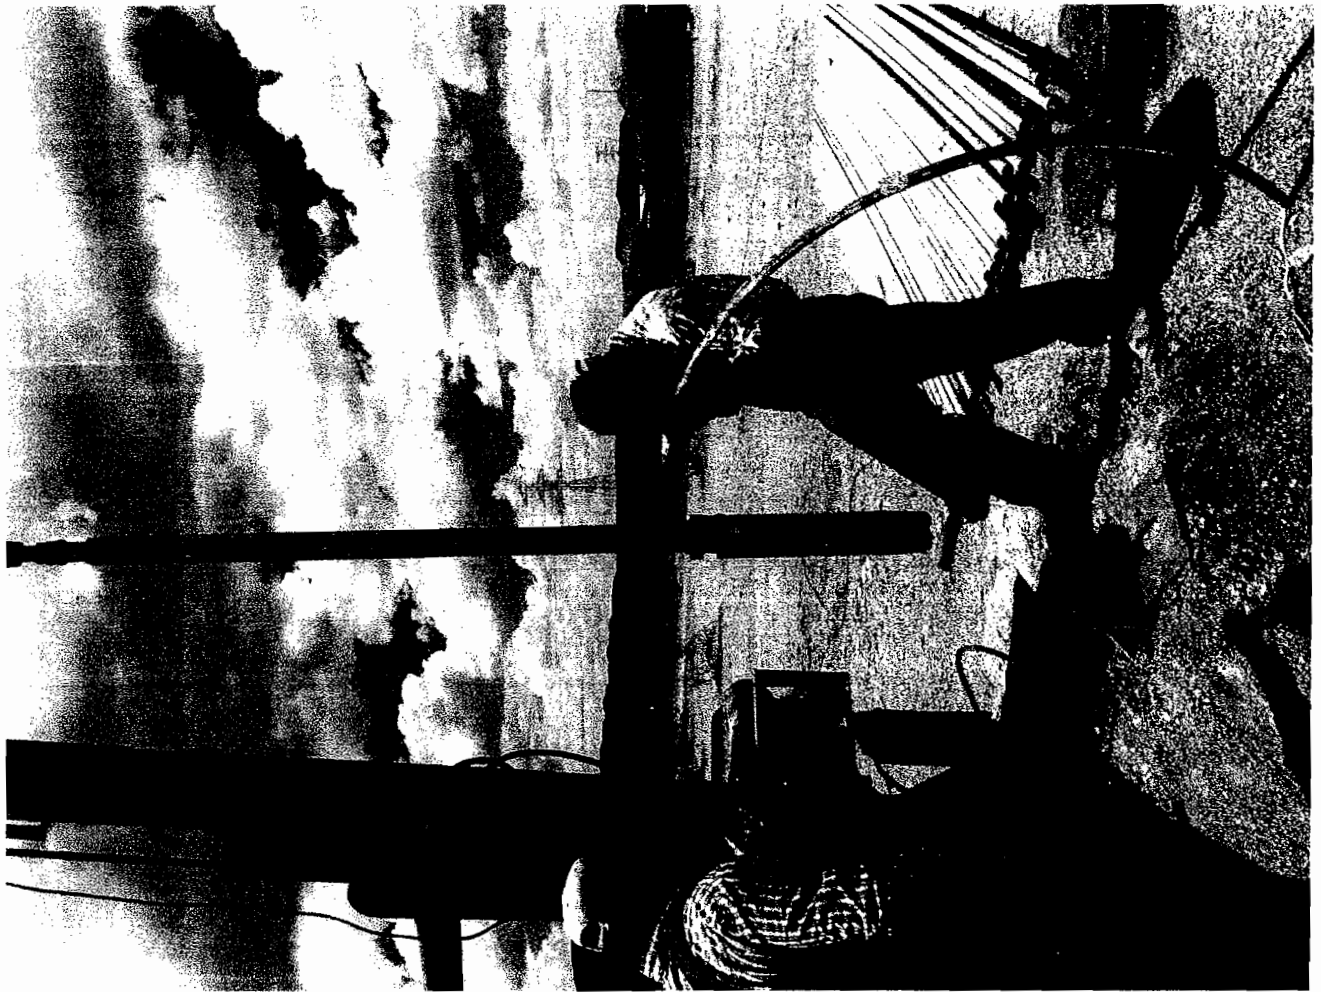

4



5
