

EDUARDO RAYNAL PRIETO

RFC Emisor : RAPE830726QF6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Guelatao de Juarez No. Exterior 2414 Colonia Margarita Maza de Juarez
Localidad Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua México CP.
31470

Sucursal :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

0B38292A-9960-42A3-9A95-943D20564080

No de Serie del CSD:

00001000000304971943

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-06-23T00:09:38

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

067 ERA

Régimen Fiscal:

Régimen de Actividad Empresarial y Profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		ESTIMACION 1 CONTRATO 094/2016, AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA "LOS MEZQUITES", ALCANCE DE LA ESTIMACION \$332,642.94, AMORTIZACION DE ANTICIPO \$99,792.88, RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO DIF 2% \$665.29, I.C.I.C. 2% \$665.29, CMIC 2% \$665.29 TOTAL DE RETENCIONES \$1,995.87 SALDO NETO A RECIBIR \$268,110.19	232850.05	232850.05

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 232,850.05

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 37,256.01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 270,106.06

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SEIS PESOS, 06/100 MN

Sello digital del CFDI:

PJ7QRPktun6XDwP1ZcgU1UgdhNH1U2SdeEVXdpMY7HoiKo04O7Z1BDsjBiaBFh7mc83QBeK48nAdgpxwM0kYmhYABduwgBrvG5cklWPtBXGzjFyoAJk1XfRvYY1fOmUCCy/UqwEI3a0+AS+ihcoAoGpOP1Gr5osVr9n9EYbs=

Sello del SAT:

oqpCLQDWAxClJwSU24voePCA+RKV/GBKxV1NTBPWEJpIP+K9QK3WdQFZ6WhgT79uplOp5ubM1PIYEWCCeEbyy2GTqZLzZPROx7K2WFZ5Cln4njZd+sKfhywjdgGfFeEcrUioJjsQdCVSIFPEPOAtit1Uenkn8qgGmmmqFSeV0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.010B38292A-9960-42A3-9A95-943D20564080|2016-06-23T00:14:18|
PJ7QRPktun6XDwP1ZcgU1UgdhNH1U2SdeEVXdpMY7HoiKo04O7Z1BDsjBiaBFh7mc83QBeK48nAdgpxwM0kYmhYABduwgBrvG5cklWPtBXGzjFyoAJk1XfRvYY1fOmUCCy/UqwEI3a0+AS+ihcoAoGpOP1Gr5osVr9n9EYbs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-23T00:14:18



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la Imagen





RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
RAPE830726QF6	EDUARDO RAYNAL PRIETO	MC1651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
0B38292A-9960-42A3-9A95-943D20564080	2016-06-23T00:09:38	2016-06-23T00:14:18	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$270,106.06	ingreso	Vigente	



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 094/2016	CONTRATADOS
OBRA: AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA "LOS MEZQUITES"	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 1,339,603.68 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA) \$	385,865.81 CON IVA
CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) \$	-
RFC RAPE-830726-QF6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA) \$	385,865.81 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>RED HIDRAULICA</u>	\$ 332,642.94	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 332,642.94	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 665.29
0.2% DIF	\$ 665.29
0.2% C.M.I.C.	\$ 665.29

SUMA DESCUENTOS \$ 1,995.87

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 332,642.94
AMORT ANTICIPO	\$ 99,792.88
SUB-TOTAL	\$ 232,850.05
I.V.A.	\$ 37,256.01
TOTAL	\$ 270,106.06

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SEIS PESOS 6/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,995.87
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 268,110.19

AUTORIZO

ELABORO

ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ
RESIDENTE D.O.P.M

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE M. AREAL ALEMÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

16 de junio de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 19/100 M.N.)

\$ 268,110.19
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 094/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,339,603.68
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 68/100M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA "LOS MEZQUITES"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 332,642.94

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 99,792.88

SUBTOTAL \$ 232,850.06

IVA \$ 37,256.01

TOTAL \$ 270,106.06

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 665.29

DIF. DEL 0.2% 665.29

C.M.I.C. DEL 0.2% 665.29

SUMA 1,995.87

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,339,603.68
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 385,865.81
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 385,865.81
POR EJERCER	\$ 953,737.87

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 401,881.11
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 115,759.74
ACUMULADO ACTUAL	\$ 115,759.74
POR AMORTIZAR	\$ 286,121.37

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% DIF.

0.20% I.C.I.C.

0.2% C.M.I.C.

	0.2% DIF.	0.20% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 665.29	\$ 665.29	\$ 665.29
ACUMULADO ACTUAL	\$ 665.29	\$ 665.29	\$ 665.29

R E C I B I M O S

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
RAPE-830726-QF6

OBRA: AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA "LOS MEZQUITES" CHIHUAHUA No. CONTRATO: 094/2016
 ESTIMACIÓN No. 1
 CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO PERÍODO: 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

RED HIDRAULICA \$ 332,642.94

SUBTOTAL	\$	332,642.94
I.V.A.	\$	53,222.87
TOTAL	\$	385,865.81

POR EL CONTRATISTA
 ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M.
 ING. RODOLFO ORTIZ MARTÍNEZ

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
CIMENTACION Y PISO								
1005.00	Limpieza y trazo de líneas de agua potable y alcantarillado....							
1005.01	En líneas de agua potable	m2	1672.12	0	0	493.98	\$ 6.12	\$ 3,023.16
1010.00	Excavacion a mano para zanjas en material comun, en seco, incluye: afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de platilla o taludes, remocion acarreo hasta 10 mts dentro de la misma y traspalearlos verticales para su extraccion....							
1010.02	Hasta 2.00 metros de profundidad	m3	87.37	0	0	24.45	\$ 123.82	\$ 3,027.40
1083.00	Excavacion por cualquier medio en zanjas en material "C" en seco, incluye: afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla o taludes, remocion acarreo hasta 10							
1083.01	De 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	m3	91.97	0	0	54.34	\$ 405.01	\$ 22,008.24
1100.00	Excavacion con equipo para zanjas en material "B", en seco incluye amacice o limpieza de plantillas y taludes....							
1100.02	En zona "B" de 0.00 a 6.00 metros de profundidad.	m3	1660	0	0	415.68	\$ 77.02	\$ 32,015.67
1130.00	Plantilla apisonada al 85% proctor en....							
1130.02	Con material de banco, incluye suministro del.	m3	167.21	0	0	49.40	\$ 203.62	\$ 10,058.83
1131.00	Relleno en zanjas...							
1131.01	A volteo con material producto de la excavación.	m3	1036.72	0	0	306.27	\$ 28.11	\$ 8,609.25
1131.06	Compactado al 90% con material de banco incluye, suministro de materiales	m3	635.41	0	0	187.71	\$ 202.04	\$ 37,924.93
2040.00	Instalacion y prueba de tuberia de P.V.C. (hidraulico o sanitario) con cople Integral Incluye todas las maniobras de....							
2040.13	De 76 mm de diametro.	ml	2786.87	0	0	823.30	\$ 20.87	\$ 17,182.27
8004.00	Suministro de tuberia P.V.C. Hidraulica sistema Ingles, L.A.B. Obra							
8004.05	Tubo Duralon hidraulico anger RD-26 de 75mm.	ml	2786.87	0	0	2784.00	\$ 67.69	\$ 188,448.96
F.C. 011	Carga y acarreo de material sobrante, producto de la excavacion a una distancia promedio de 5 km al destino indicado por la supervision, medido suelto.	m3	1043.4	0	0	244.66	\$ 42.28	\$ 10,344.22

CONTRATISTA

Arq. Eduardo Raynal Prieto


POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M.

Pag 1 de 1

ING. RODOLFO MARTÍNEZ

OBRA:				CONTRATISTA:				GENERADOR	
09/2016				ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO					
PERIODO DE EJECUCION									
01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2016									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD TOTAL		
1005.00	Limpieza y trazo de líneas de agua potable y alcantarillado....	M2	7.-44	0.60			67.20		
1005.01	En líneas de agua potable		44.-42	0.60			202.20		
			42.-30	0.60			32.58		
			31.-12	0.60			192.00		
							493.98		
1010.00	Excavación a mano para zanjas en material "B" en seco, incluye: afloje y extracción de material con amacice o limpieza de planillas o taludes, remoción acarreo hasta 10 metros dentro de la misma y traspaños verticales para su extracción.	M3	7.-44	0.60	1.10	(90) 5%	3.33		
1010.02	Hasta 2.00 metros de profundidad.		44.-42	0.60	1.10	(90) 5%	10.01		
			42.-30	0.60	1.10	(90) 5%	1.61		
			31.-12	0.60	1.10	(90) 5%	9.50		
							24.45		
1082.00	Excavación por cualquier medio en zanjas en material "C" en seco incluye: amacice y/o limpieza de planillas o taludes.	M3	7.-44	0.60	1.10	10%	7.39		
1083.01	De 0.00 a 2.00 metros de profundidad.		44.-42	0.60	1.10	10%	22.24		
			42.-30	0.60	1.10	10%	3.58		
			31.-12	0.60	1.10	10%	21.12		
							54.34		
1100.00	Excavación con equipo para zanjas en material "B" en seco, incluye amacice o limpieza de planillas y taludes ...	M3	7.-44	0.60	1.10	(90) 85%	56.55		
1100.02	En zona "B" de 0.00 a 6.00 metros de profundidad.		44.-42	0.60	1.10	(90) 85%	170.15		
			42.-30	0.60	1.10	(90) 85%	27.42		
			31.-12	0.60	1.10	(90) 85%	161.57		
							415.68		
1130.00	Plantilla apizonada al 85% proctor...	M3	7.-44	0.60	0.10		6.72		
1130.02	Con material producto de banco, incluye suministro del material.		44.-42	0.60	0.10		20.22		
			42.-30	0.60	0.10		3.26		
			31.-12	0.60	0.10		19.20		
							49.40		
1131.00	Relleno de zanjas...	M3	7.-44	0.60	0.62		41.66		
1131.01	A volteo con material producto de la excavación.		44.-42	0.60	0.62		125.36		
			42.-30	0.60	0.62		20.20		
			31.-12	0.60	0.62		119.04		
							306.27		
				CONTRATISTA				RESIDENCIE DE OBRA	
				ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO				ING. RODOLFO ORTIZ MARTÍNEZ	

	OBRA:		GENERADOR	
	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA "LOS MEZQUITES"			
	09/02/2016	PERIODO DE EJECUCION		CONTRATISTA:
	01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2016	ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO		1

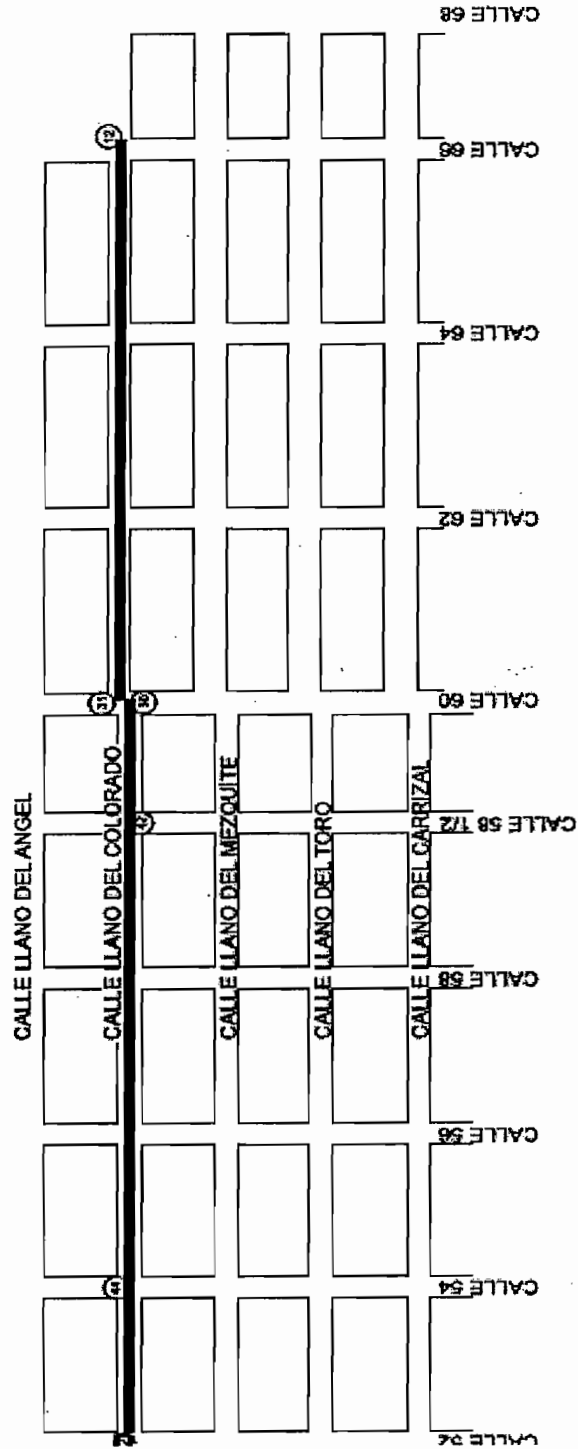



CONTRATISTA
ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO



RESIDENTE DE OBRA
ING. RODOLFO FORTIZ MARTINEZ

LOS MEZQUITES

