

CONSTRUCTORA NORTE SUR SA DE CV
CNS9104023W0
Domicilio Fiscal
RIO DE JANEIRO 312 A
Col. PANAMERICANA 31210
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144261702

Factura No: 217
FOLIO FISCAL (UUID):
6D118267-CF6A-4824-A009-796DF5AE2813
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202160334
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-03T19:43:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-08-03T19:38:48

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Fecha de Expedición: 03 agosto 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 6667

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AV. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AV. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. ESTIMACION NUMERO 2 (ULTIMA) SEGUN CONTRATO NUM. 096/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 199,461.69 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 66,883.47 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO I.C.I.C DEL 0.2% \$ 398.92 D.I.F DEL 0.2% \$ 398.92 C.M.I.C DEL 0.2% \$ 398.92 SUMA \$ 1,196.76 NETO A RECIBIR \$ 152,593.97	\$ 132,578.22	\$ 132,578.22

COPIA

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS, 73/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 132,578.22
IVA(IVA 16.00%): \$ 21,212.51
TOTAL: \$ 153,790.73

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pD6vqPTe4z57+mbzANQMdMR4+Qhaji0akdJ1lmp2PWdqTY5xSgvyXj7DXTIINRFW8O038/rbR4gC4lr5k01xRwxOzhMz7jnZVbEIRuRb97ap697bsJDFZTVVd8vni8l+BPSmXRETfWpVswYluAFFS7XzXsQjVBcs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UZGUAcs4k3YEOSCjp048ukICV7yeXu2Q602PIUVRk8jMosna7Fb89GicBwnsLk1sugBcGYaySAsPR3C1nVT6In7bydlrSlxFSj4vgjAAW02N9-cvbA0bYOT6mbu+c3aneVhcc6qCBXSz4YUgHPuClHrQeY5BRcg5nuF89f=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6D118267-CF6A-4824-A009-796DF5AE2813|2016-08-03T19:43:48|pD6vqPTe4z57+mbzANQMdMR4+Qhaji0akdJ1lmp2PWdqTY5xSgvyXj7DXTIINRFW8O038/rbR4gC4lr5k01xRwxOzhMz7jnZVbEIRuRb97ap697bsJDFZTVVd8vni8l+BPSmXRETfWpVswYluAFFS7XzXsQjVBcs=|00001000000203495276||



www.foliosdigitales.com
Los complementos fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2013

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


14

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

4 0000000000000000



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

CNS9104023W0

CONSTRUCTORA NORTE SUR SA DE CV

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

6D118267-CF6A-4824-A009-796DF5AE2813

2016-08-03T19:38:48

2016-08-03T19:43:48

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$153,790.73

ingreso

Vigente

Impreso



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 096/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No. 2 (ULTIMA)	\$ 1,689,281.68 CON IVA
UBICACIÓN: Chihuahua, Chih.	PERÍODO EJEC. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,430,665.74 CON IVA
RFC CNS-910402-3W0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,662,041.30 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMAL</u>	\$ 182,611.00	
<u>EXCEDENTE</u>	\$ 16,850.69	
<u>EXTRA</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 199,461.69	

DESCUENTOS			
0.2% I.C.I.C.	\$	398.92	
0.2% D.I.F	\$	398.92	
0.2% C.M.I.C	\$	398.92	
SUMA DESCUENTOS	\$	1,196.76	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	199,461.69	
AMORT ANTICIPO	\$	66,883.47	
SUB-TOTAL	\$	132,578.22	
I.V.A.	\$	21,212.51	
TOTAL	\$	153,790.73	
(CON LETRA)			
(CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	1,196.76	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	152,593.97	

AUTORIZO	ELABORA
ING. FRANCISCO MORALES RESIDENTE S.O.P.M	CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. RAMON B. RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

RECIBIMOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 152,593.97
 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 2 (ULTIMA) CONTRATO No. 096/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,689,281.88
 SON UN MILLON SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 88/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE
 CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	199,461.69
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$	66,883.47

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%	398.92
D.I.F. 0.2 %	398.92
C.M.I.C 0.2%	398.92
SUMA	1,196.76

SUBTOTAL	\$	132,578.22
IVA	\$	21,212.51
TOTAL	\$	153,790.73

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO	\$	1,689,281.88	CON IVA
	\$		
	\$	1,430,665.74	CON IVA
	\$	231,375.56	CON IVA
	\$	1,662,041.30	CON IVA
	\$	27,240.58	CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO	\$	506,784.55	CON IVA
	\$	429,199.72	CON IVA
	\$	77,584.83	CON IVA
	\$	506,784.55	CON IVA
	\$	(0.00)	CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2 % I.C.I.C	0.2 % C.M.I.C	0.2% D.I.F
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,466.67	\$ 2,466.67	\$ 2,466.67
ESTA ESTIMACION	\$ 398.92	\$ 398.92	\$ 398.92
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,865.59	\$ 2,865.59	\$ 2,865.59

RECIBIMOS



CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.
 CNS-910402-3W0

OBRA:

CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRETERA LATERAL EN AVE.
LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE.
WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

UBICACIÓN Chihuahua, Chih.

No. CONTRATO: 096/2016

ESTIMACIÓN No.

2 (ULTIMA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.

PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
		199,461.69
	<u>NORMALES</u>	182,611.00
2	<u>TERRACERIAS</u>	43,750.93
3	<u>TRABAJOS DIVERSOS</u>	118,237.61
5	<u>SEÑALAMIENTO</u>	20,622.46
	<u>EXCEDENTES</u>	16,850.69
2	<u>TERRACERIAS</u>	660.68
5	<u>SEÑALAMIENTO</u>	16,190.01
	<u>EXTRAS</u>	0.00
SUBTOTAL		199,461.69
I.V.A.		31,913.87
TOTAL		231,375.56

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. FRANCISCO MORALES

OBRA: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

UBICACIÓN Chihuahua, Chih.

No. CONTRATO: 096/2016

ESTIMACIÓN No. 2 (ULTIMA)

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
							\$	199,461.69
<u>OBRA NORMAL</u>							\$	182,611.00
2 <u>TERRACERIAS</u>							\$	43,750.93
2.5	Relleno para banquetas con material de banco cribado que elija el contratista, para un grado de compactacion del 90%, incluye la preparacion previa de la superficie, humectacion, acarreos y todas la maniobras necesarias para su ejecucion y preparacion para recibir concreto.	m3	230.45	230.45	0.00	230.45	\$ 189.85	\$ 43,750.93
3 <u>TRABAJOS DIVERSOS</u>							\$	118,237.61
3.1	Suministro y colocación de concreto hidraulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de fc= 150 Kg/cm2, utilizado en BANQUETAS de 8 cm de espesor según proyecto. Incluye: protección de paramentos, corte de módulos de 1.50 m con cortadora de disco, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1000.00	649.80	0.00	649.80	\$ 181.96	\$ 118,237.61
5 <u>SEÑALAMIENTO</u>							\$	20,622.46
5.2	Raya blanca separadora de carriles raya blanca de 10 cm de ancho.	m	1000.00	486.81	0.00	486.81	\$ 5.83	\$ 2,838.10
5.3	Pintura amarilla de tráfico sobre guarnición.	m2	170.00	170.00	0.00	170.00	\$ 88.33	\$ 15,016.10
5.4	Marcas en el Pavimento Flechas, leyendas, marcas y achurados sobre el pavimento(EP-EOD10)	m2	50.00	31.34	0.00	31.34	\$ 88.33	\$ 2,768.26
<u>OBRA EXCEDENTE</u>							\$	16,850.69
2 <u>TERRACERIAS</u>							\$	660.68
2.5	Relleno para banquetas con material de banco cribado que elija el contratista, para un grado de compactacion del 90%, incluye la preparacion previa de la superficie, humectacion, acarreos y todas la maniobras necesarias para su ejecucion y preparacion para recibir concreto.	m3	230.45	233.93	230.45	3.48	\$ 189.85	\$ 660.68
5 <u>SEÑALAMIENTO</u>							\$	16,190.01
5.3	Pintura amarilla de tráfico sobre guarnición.	m2	170.00	353.29	170.00	183.29	\$ 88.33	\$ 16,190.01


 POR EL CONTRATISTA
 CONSTRUCTORA NORTE SUR S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


 ING. FRANCISCO MORALES

GENERADOR

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.


FECHA: 31/07/2016
PERIODO: 01/07/16 AL 31/07/16
No. CONTRATO: 096/2016
No. ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
2.5	Relleno para banquetas con material de banco cribado que elija el contratista, para un grado de compactacion del 90%, incluye la preparacion previa de la superficie, humectacion, acarreo y todas la maniobras necesarias para su ejecucion y preparacion para recibir concreto.	233.93	M3

TERRACERIAS

LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
433.20	1.80	0.30	233.93

CANTERA

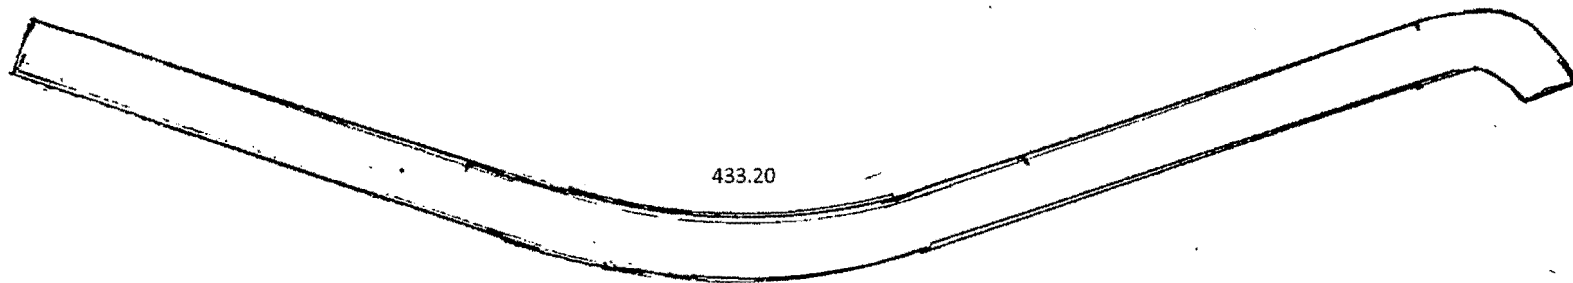

RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS

GENERADOR

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

FECHA: 31/07/2016

PERIODO: 01/07/16 AL 31/07/16

No. CONTRATO: 096/2016

No. ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
3.1	Suministro y colocación de concreto hidraulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en BANQUETAS de 8 cm de espesor según proyecto. Incluye: protección de paramentos, corte de módulos de 1.50 m con cortadora de disco, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	649.80	M2

PAVIMENTOS

LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN
433.20	1.50	649.80

CANTERA

433.20

WASHINGTON

RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS

GENERADOR

**CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

OBRA: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

FECHA: 31/07/2016
PERIODO: 01/07/16 AL 31/07/16
No. CONTRATO: 096/2016
No. ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
5.2	Raya blanca separadora de carriles raya blanca de 10 cm de ancho.	486.81 M

OBRAS PRELIMINARES

LONGITUD PROMEDIO	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	LONGITUD PINTURA
290.30	2.00	580.60	290.30
71.30	2.00	142.60	142.60
17.97	3.00	53.91	53.91
		486.81	

5.00 MTS

5.00 MTS

5.00 MTS

5.00 MTS

5.00 MTS

CROQUIS DEL A. LA CANTERA

RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS

GENERADOR

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

FECHA: 31/07/2016
PERIODO: 01/07/16 AL 31/07/16
No. CONTRATO: 096/2016
No. ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
5.3	Pintura amarilla de tráfico sobre guarnición.	353.29 M2


OBRAS PRELIMINARES

LONGITUD PROMEDIO	ANCHO	AREA PINTURA
308.80	0.35	108.08
370.50	0.10	37.05
384.10	0.10	38.41
485.00	0.35	169.75
		353.29

1
3
4
2

GUARNICION
LINEA LATERAL
LINEA LATERAL
GUARNICION

Chicoris Lm. Av. La Cantena



RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS

GENERADOR

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

FECHA: 31/07/2016

PERIODO: 01/07/16 AL 31/07/16


No. CONTRATO: 096/2016

No. ESTIMACION: 2


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
5.4	Marcas en el Pavimento Flechas, leyendas, marcas y achurados sobre el pavimento(EP-EOD10)	31.34 M2

OBRAS PRELIMINARES


FIGURA	CANTIDAD	AREA	AREA PINTURA
RAYA PEATONAL	14.00	1.50	21.00
RAYA FRENADO	1.00	5.60	5.60
FLECHA	4.00	1.185	4.74
		31.34	




RAYA PEATONAL



RAYA FRENADO



Cnocos Las Al La Cantena



RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE.
WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

FECHA: 31/07/2016
PERIODO: 01/07/16 AL 31/07/16
No. CONTRATO: 096/2016
No. ESTIMACION: 2



RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE.
WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

FECHA:



31/07/2016

PERIODO:

01/07/16 AL 31/07/16

No. CONTRATO: 096/2016

No. ESTIMACION: 2

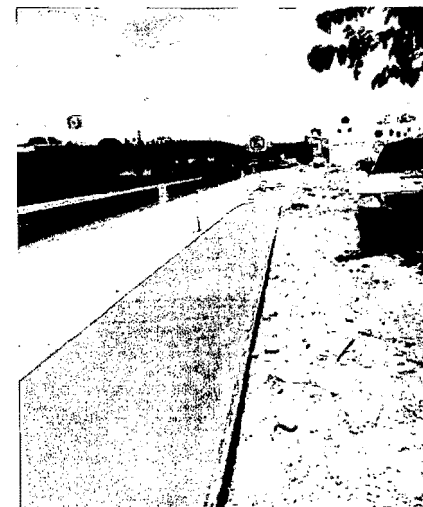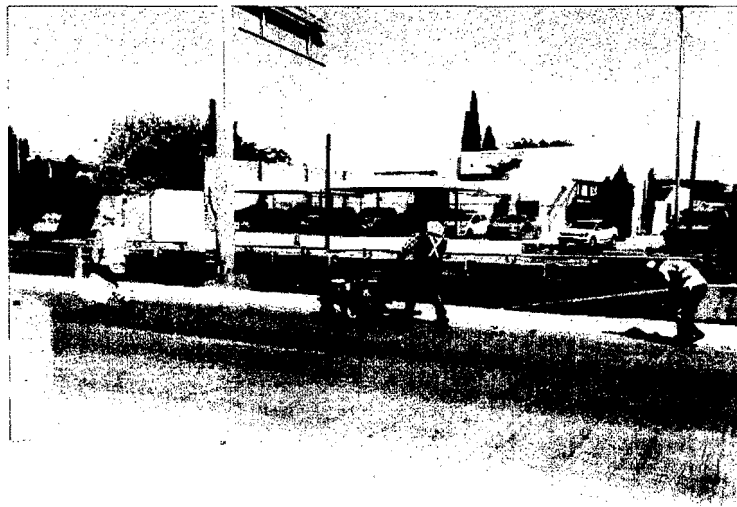

RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS

TESTIGO FOTOGRAFICO

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE CARRIL LATERAL EN AVE. LA CANTERA ENTRE CALLE ING. ENRIQUE RUBIO Y AVE. WASHINGTON, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

FECHA:




31/07/2016

PERIODO:

01/07/16 AL 31/07/16

No. CONTRATO: 096/2016

No. ESTIMACION: 2

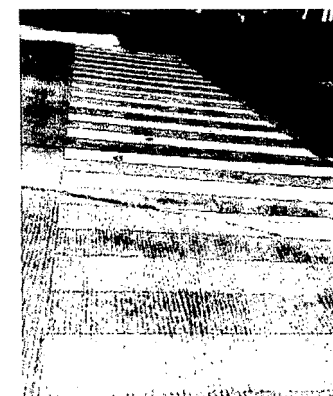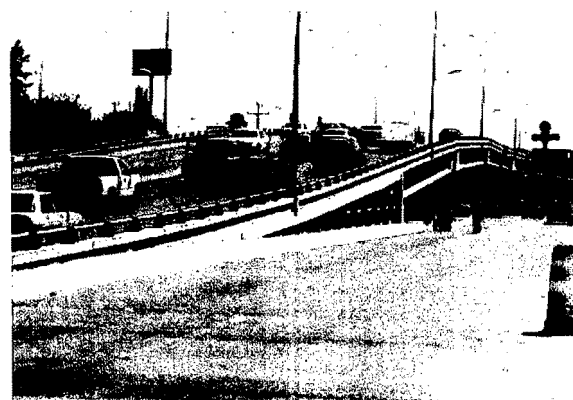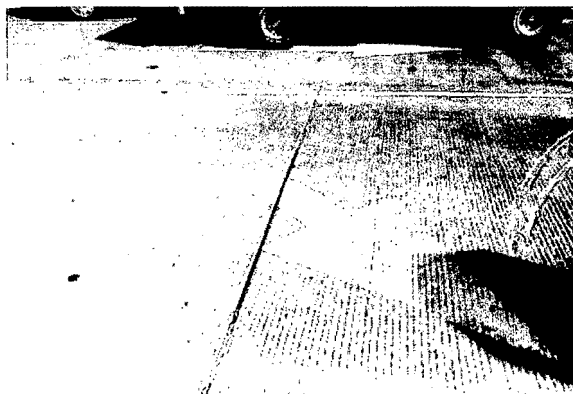

RESIDENTE DE OBRA
ING. FRANCISCO MORALES

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.
ING. SALVADOR COVARRUBIAS
