

CANO constructores

JUAN CARLOS CANO DEL VAL
CAVJ610125KQ4
ROMA 2204
MIRADOR CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31205
Rég. Fiscal: ACT. EMPRESARIAL

FACTURA

Lugar y Fecha de certificación

México Distrito Federal, 2016-08-08T09:38:56

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

REC del Cliente

MCI651010V22

Dirección del Cliente

MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANT.	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica		CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA	\$ 208,935.42	\$ 208,935.42
ESTIMACION NO. 1 SEGUN CONTRATO NUM 101/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 208,935.42 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO CMIC DEL 0.2 % \$ 417.87 I.C.I.C. DWEL 0.2 % \$ 417.87 D.I.F. DEL 0.2 % \$ 417.87 SUMA \$ 1,253.61 NETO A RECIBIR \$ 241,111.47					

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dAbFe0Y1oJXhrbCwFOB50PMIKuksuq7+4P4vjIC7GQJrK1Ry7I5aFvIKySOJ9jeCs2wQzKU8nCW0wHFTm1xZ3wlHJmtuNCBsrJi+dYbEb3L
P1sqvT/POROe06Ud4l3n5sb3jFsgotPLnu0FRsIVDsHVIMuc0SraJAcAhmyzE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

awYkwBbsG9vaqznI0kYjfi3N+20w9RWKGzqjq8FDqChmauW4M8wgz+kghMS79M+97Q9uRjewgsrq17JLx2GDZyhp5TggYWq5icajFITER9T5cO
/giuc12Rmn+VOKQTj27S8ew88yGuVpm1vNYQObEhJwLYrH04ehy13r1yRT+bs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[11.0]8cdde295-6dbd-48e5-acf8-9fd2662ef69e|2016-08-08T09:38:56|dAbFe0Y1oJXhrbCwFOB50PMIKuksuq7+4P4vjIC7GQJrK1Ry7I5aFvIKySOJ9jeCs2wQzKU8nCW0wHFTm1xZ3wlHJmtuNCBsrJi+dYbEb3L|P1sqvT/POROe06Ud4l3n5sb3jFsgotPLnu0FRsIVDsHVIMuc0SraJAcAhmyzE=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 02

Condiciones de Pago: CONTADO

Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO

SUB-TOTAL	\$ 208,935.42
Total de Impuestos Trasladados	\$ 33,429.67
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 33,429.67
TOTAL	\$ 242,365.09



Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

CAVJ610125KQ4

Nombre o Razón Social del Emisor

JUAN CARLOS CANO DEL VAL

RFC del Receptor

MCI651010V22

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

8CDDE295-6DBD-48E5-ACF8-9FD2662EF69E

Fecha de Expedición

2016-08-08T08:38:52

Fecha Certificación SAT

2016-08-08T09:38:56

PAC que Certificó

AUR100128NN3

Total del CFDI

\$242,365.09

Efecto del Comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

Firma



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 101/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 432,459.38 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 10 de junio de 2016 al 9 de julio de 2016	
UBICACIÓN: EJIDO LA ESPERANZA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 242,365.08 CON IVA
CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC CAVJ-610125-KQ4	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 242,365.08 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 186,586.66	
<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ 8,001.51	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 14,347.25	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 208,935.42	

--

DESCUENTOS

0.2% CMIC	\$ 417.87
0.2% I.C.I.C.	\$ 417.87
0.2% DIF	\$ 417.87
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,253.61

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 208,935.42
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 208,935.42
I.V.A.	\$ 33,429.67
TOTAL	\$ 242,365.08

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 8/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,253.61
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 241,111.47

AUTORIZO

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
RESIDENTE D.O.P.M.

Vo. Bo.

ELABORO

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL
CONTRATISTA

REVISO

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO

SUBDIRECTORA DE

OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

11 de julio de 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 241,111.47

(DOSCIENTOS CUARENTA Y UNMILCIENTO ONCE PESOS 47/100 M.N.)

COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 1

CONTRATO No. 101/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 432,459.38

0.00

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 208,935.42

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

			SUBTOTAL	\$ 208,935.42
			IVA	\$ 33,429.67
			TOTAL	\$ 242,365.08
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
DIF DEL 0.2%	417.87			
I.C.I.C. DEL 0.2%	417.87			
CMIC DEL 0.2%	417.87			
SUMA	1,253.61			

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

		CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$	432,459.38
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	242,365.08
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	242,365.08
POR EJERCER	\$	190,094.30

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

		CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

		0.2% DIF		0.2% I.C.I.C.		0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-	\$	-	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	417.87	\$	417.87	\$	417.87
ACUMULADO ACTUAL	\$	417.87	\$	417.87	\$	417.87

R E C I B I M O S

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL
CAVJ-610125-KQ4

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
OBRA NORMAL		
1	CIMENTACIÓN	33,264.75
2	ESTRUCTURA	87,968.03
3	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	65,353.88
		186,586.66
OBRA EXCEDENTE		
1	CIMENTACIÓN	2,916.99
3	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	5,084.52
		8,001.51
OBRA EXTRAORDINARIA		
		14,347.25
SUBTOTAL		208,935.42
I.V.A.		33,429.67
TOTAL		242,365.08

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFR. URBANA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO			VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			

OBRA NORMAL**AULA****EDIFICIOS**

1	CIMENTACIÓN								
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y Trazos con calhídra.	M2	68.64	50.55	0.00	50.55	\$	16.95	\$ 856.82
1.2	DESALME DE TERRENO HASTA 20 CM ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO AL 90% DE SU P.V.S.M DEL AREA DESPALMADA, INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, Y DESALOJO DEL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL.	M2	68.64	50.55	0.00	50.55	\$	27.95	\$ 1,412.87
1.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE(INO SE PAGARAN SOBREAÑCHOS).	M3	1.57	1.57	0.00	1.57	\$	264.46	\$ 415.20
1.5	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO.	M2	31.35	16.80	0.00	16.80	\$	160.03	\$ 2,688.50
1.6	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	29.26	7.08	0.00	7.08	\$	162.84	\$ 1,152.91
1.7	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS, DE ESPESOR, CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA DE PROCTOR, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	51.41	20.73	0.00	20.73	\$	227.83	\$ 4,722.92
1.8	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:3, INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS, CON PROPORCION DE 1.5 LTS/M2, CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C =100 KG/M2.	M2	56.63	21.17	0.00	21.17	\$	236.20	\$ 5,000.35
1.11	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=2400 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 2.	KG	72.40	23.81	0.00	23.81	\$	32.41	\$ 771.68
1.12	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 3.	KG	222.65	90.29	0.00	90.29	\$	32.41	\$ 2,926.30

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFR. URBANA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

Pag 1 de 3

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

EJIDO LA ESPERANZA

Nº CONTRATO:

10/2016

UBICACIÓN

ESTIMACIÓN No.

1

10 de junio de 2016 al 9 de julio de 2016

PERIODO:

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO UNIDAD	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	
1.13	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 4.	KG	116.15	111.33	0.00	111.33 \$	3,608.21
1.14	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE: VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	M3	5.17	3.70	0.00	3.70 \$	9,708.99
2	ESTRUCTURA						87,968.03
2.1	TRABE T-1 DE 20X40CMS. CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON ACERO FY=4200 KG/CM2, 3 VARILLAS #4 LECHO INFERIOR Y 2 VAR. #4 EN EL LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES #4 EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA LONGITUD SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CRUCES DE VARILLAS, CHAPLAN A BASE DE TUINO DE 1 PULGADA, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	ML	13.26	13.02	0.00	13.02 \$	11,327.40
2.2	TRABE T-2 TRAPEZOIDAL DE 50CMS. DE ANCHO AHOGADA EN CUMBRERA, CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS #4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS No.2 @ 20 CMS SEGUN PLANO. INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	ML	6.60	6.60	0.00	6.60 \$	7,751.63
2.3	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=250 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS ARMADA SEGUN PLANO. INCLUYE: DESCONTAR CONCRETO DE TRABES, CIMBRADO, DESCIMBRADO HABILITADO DE ACERO, BASTONES, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO, DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 DE CONCRETO, A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	M2	63.32	63.32	0.00	63.32 \$	68,888.99
3	ALBANILERIA Y ACABADOS						65,353.88
3.2	CADENA CD-2 DE REPISON DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 30CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	23.04	16.70	0	16.70 \$	5,082.98
3.4	CADENA CD-3 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #4 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	11.84	11.84	0.00	11.84 \$	4,543.96
3.5	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.58	40.58	0.00	40.58 \$	11,861.94

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFR. URBANA


ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ


ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

CONTRATISTA:

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

UBICACIÓN
EJIDO LA ESPERANZA
ESTIMACIÓN No.
10 de junio de 2016 al 9 de julio de 2016

10/12/2016

No. CONTRATO

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO			VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
3.7	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA DE ACERO 6X6-10-10, ACABADO PULIDO, CON JUNTAS FRÍAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, DISTRIBUIDAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA APARENTE, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.63	45.51	0.00	45.51	\$	301.98	\$ 13,743.11
3.8	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA O CASETON DE POLIESTIRENO, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS DE CANCELERIA Y PUERTAS.	M2	106.47	106.47	0.00	106.47	\$	157.38	\$ 16,756.25
3.14	IMPERMEABILIZACIÓN APARENTE CON SELLADOR ASFALTICO 0.2/LM2 + 3 APLICACIONES DE ASFALTO OXIDADO #12 EN CALIENTE, 4 KG/M2 ALTERNADO CON DOS CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO ASFALTICA 0.6 KG/CM2, MAS 1 CAPA PAPEL MINERALIZADO #90 ACABADO DE GRAVILLA COLOR ROJO, MARCA PROTEXA O SIMILAR EN CALIDAD, DEBIENDO PRESENTAR GARANTIA POR 5 AÑOS.	M2	69.27	69.27	0.00	69.27	\$	192.95	\$ 13,365.65
OBRA EXCEDENTE									
1	CIMENTACIÓN								
1.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE(INO SE PAGARAN SOBRECARGOS).	M3	1.57	12.60	0.00	11.03	\$	264.46	\$ 2,916.99
3	ALBANILERIA Y ACABADOS								
3.4	CADENA CD-3 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #4 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	11.84	15.32	0.00	3.48	\$	383.78	\$ 1,335.55
3.5	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.58	52.70	0.00	12.12	\$	292.31	\$ 3,542.80
3.8	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA O CASETON DE POLIESTIRENO, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS DE CANCELERIA Y PUERTAS.	M2	106.47	107.78	0.00	1.31	\$	157.38	\$ 206.17
EX-01	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 28 X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #4 FY= 4200 KG/CM2 , ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	0.00	35.94	0.00	35.94	\$	395.20	\$ 14,347.25
OBRA EXTRAORDINARIA									
									\$ 14,347.25

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFR. URBANA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

Pag 3 de 3

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 1.1

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.

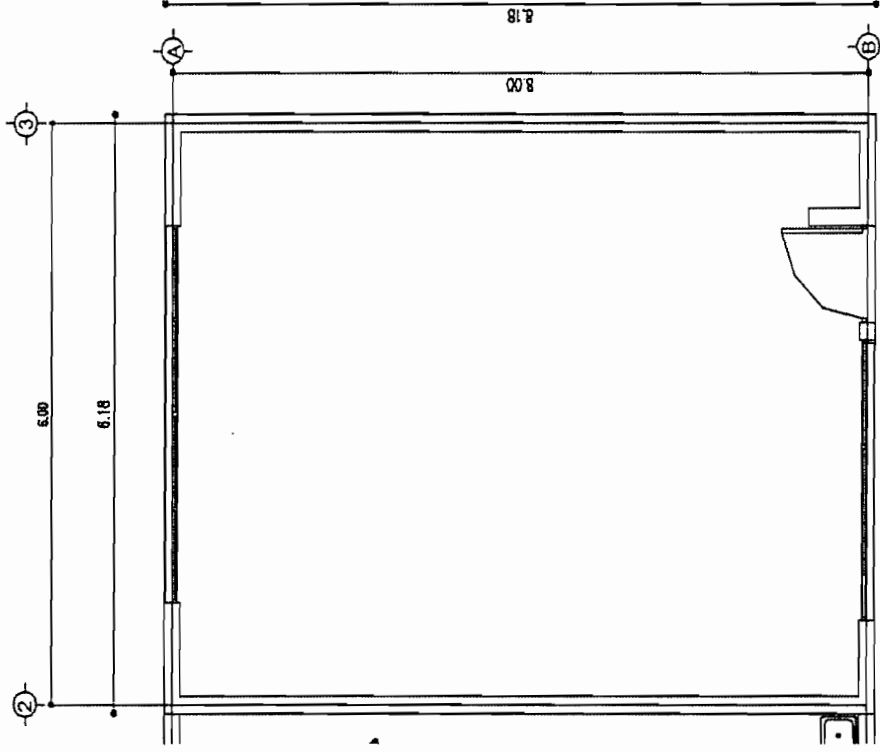

LARGO(M)	ANCHO(M)	TOTAL(M2)
6.18	8.18	50.55

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIJO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 1.2

DESPALME DE TERRENO HASTA 20 CM ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO AL 90% DE SU P.V.S.M DEL AREA DESPALMADA. INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, Y DESALOJO DEL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL.

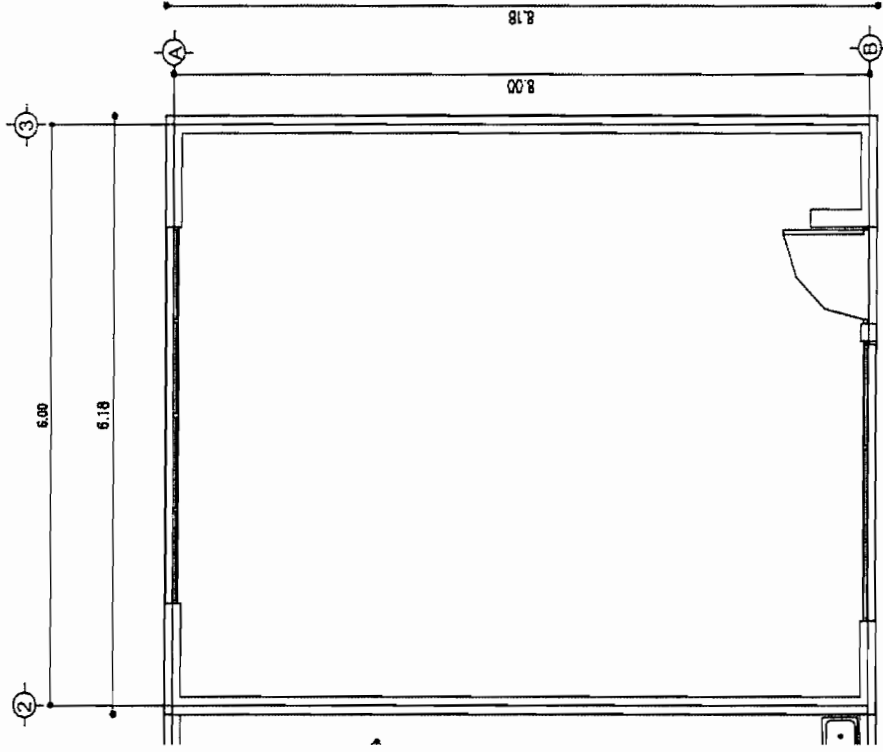

LARGO(M)	ANCHO(M)	TOTAL(M2)
6.18	8.18	50.55

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B"; HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE(NO SE PAGARAN SOBREAÑCHOS).

CLAVE: 1.3

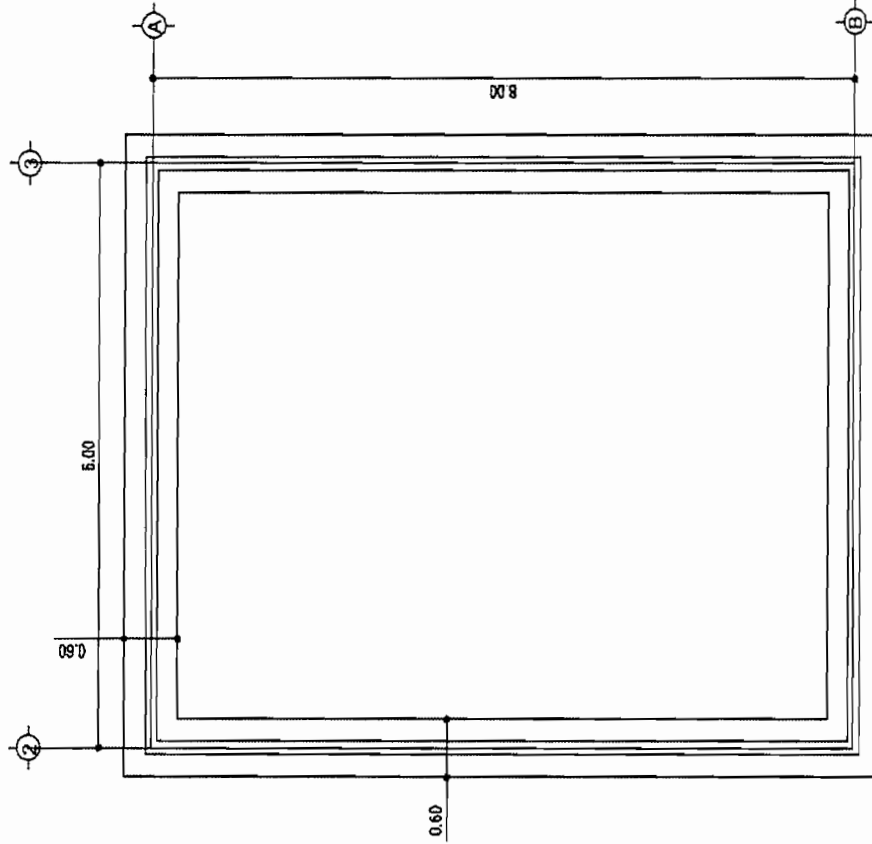

LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO(M)	VOLUMEN (M3)
6.00	0.60	0.75	2.70
6.00	0.60	0.75	2.70
8.00	0.60	0.75	3.60
8.00	0.60	0.75	3.60
TOTAL			12.60

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 1.5

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO.

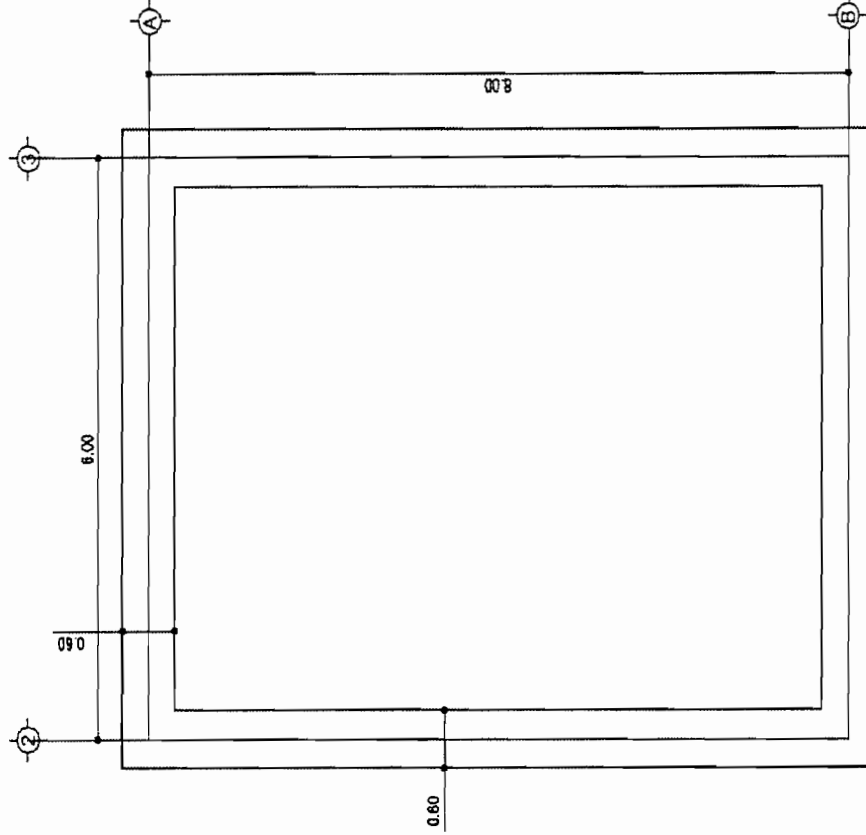

LARGO (M)	ANCHO (M)	ÁREA (M2)
6.00	0.60	3.60
6.00	0.60	3.60
8.00	0.60	4.80
8.00	0.60	4.80
TOTAL		16.80

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.

CLAVE: 1.6

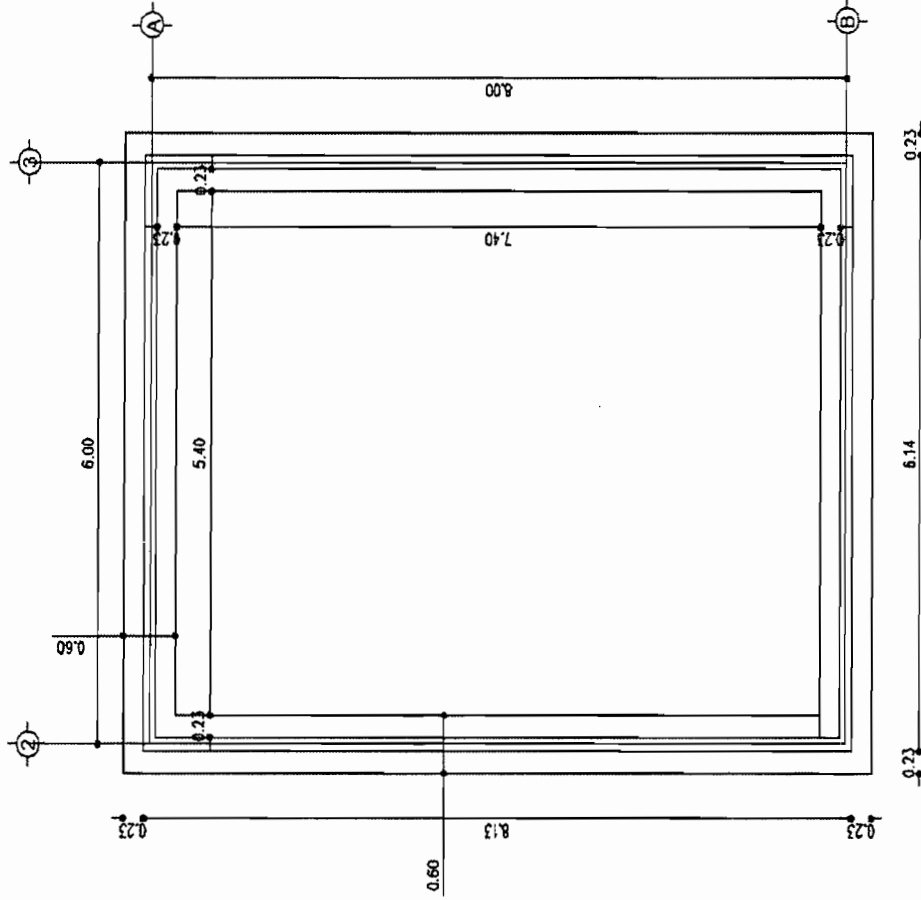

LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)
8.59	0.23	0.55	1.09
8.59	0.23	0.55	1.09
6.14	0.23	0.55	0.78
6.14	0.23	0.55	0.78
7.86	0.23	0.55	0.99
7.86	0.23	0.55	0.99
5.40	0.23	0.55	0.68
5.40	0.23	0.55	0.68
TOTAL			7.08

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 1.8

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:5. INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS. CON PROPORCION DE 1.5 LTS/M2. CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C = 100 KG/M2.

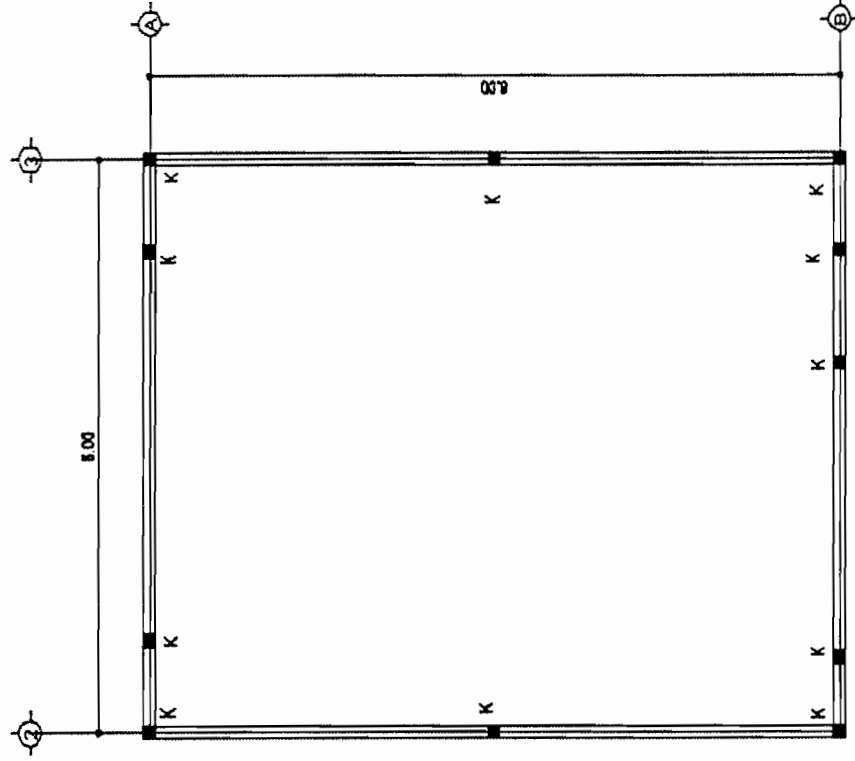

LARGO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)
6.00	0.80	4.80
6.00	0.80	4.80
8.00	0.80	6.40
8.00	0.80	6.40
0.14	0.80	-1.232
TOTAL		21.17

CANT -11
CASTILLOS (K)

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL


No. CONTRATO: 101/2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 1.11

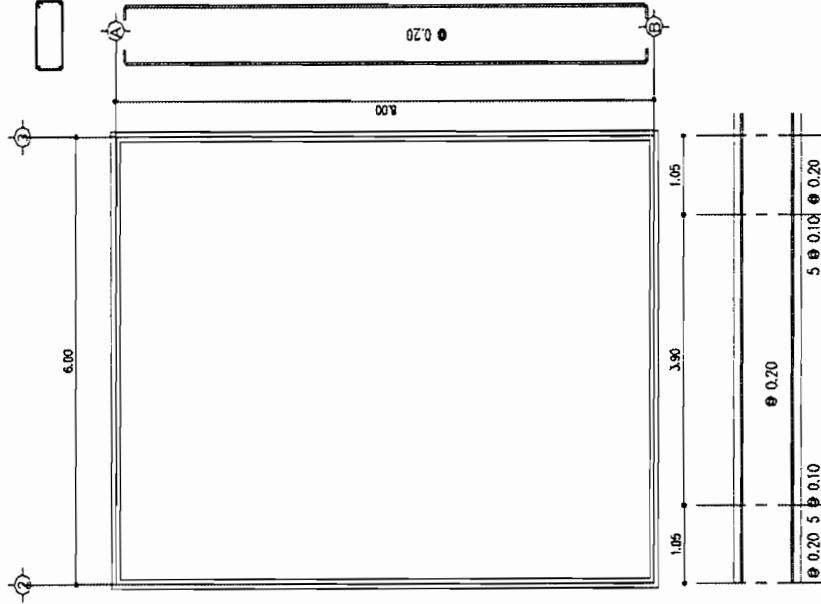

DATA CD-1 14X30 CMS

SOBRE EJE	ENTRE EJES	SEPARACIÓN@	LARGO SEGMENTO (M)	MTS POR ESTRIBO	# ESTRIBOS	MIS TOTALES
2	A Y B	0.20	8.00	0.64	40.00	25.60
3	A Y B	0.20	8.00	0.64	40.00	25.60
A	2 Y 3	0.20	0.80	0.64	4.00	2.56
A	2 Y 3	0.10	0.50	0.64	5.00	3.20
A	2 Y 3	0.20	3.40	0.64	17.00	10.88
A	2 Y 3	0.1	0.50	0.64	5.00	3.20
A	2 Y 3	0.2	0.80	0.64	4.00	2.56
B	2 Y 3	0.2	0.80	0.64	4.00	2.56
B	2 Y 3	0.1	0.50	0.64	5.00	3.20
B	2 Y 3	0.2	3.40	0.64	17.00	10.88
B	2 Y 3	0.1	0.50	0.64	5.00	3.20
B	2 Y 3	0.2	0.80	0.64	4.00	2.56
TOTAL M LARGO						96.00

TOTAL M VS	96.00
KG/M2 VS #2	0.248
KG TOTAL	23.81

RESIDENTE DE OBRA DEL
MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA
ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL


No. CONTRATO: 101/2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 1.12

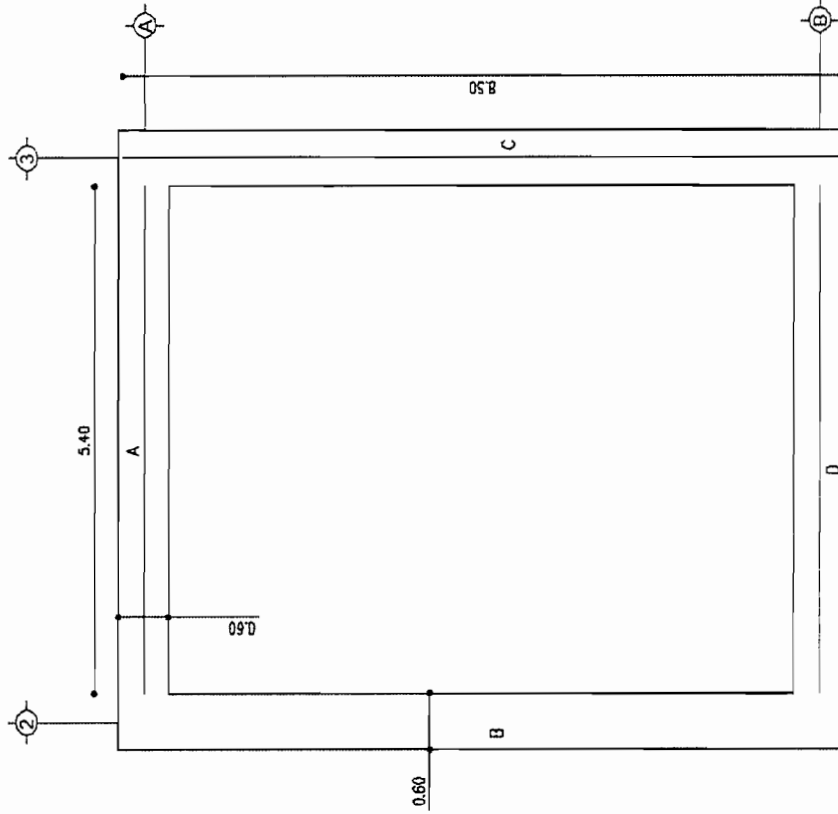

TRAMO	LARGO VS (M)	# VS LARGO	M VS TOTAL LARGO
A	5.40	3.00	16.20
B	8.50	3.00	25.50
C	8.50	3.00	25.50
D	5.40	3.00	16.20
TOTAL M LARGO			83.40

TRAMO	# BASTONES CORTO	LONG. BASTON (M)	M VS BASTONES
A	21.6	0.7	15.12
B	34	0.7	23.8
C	34	0.7	23.8
D	21.6	0.7	15.12
TOTAL M BASTONES			77.84

TOTAL M VS	161.24
KG/M2 VS #3	0.56
KG TOTAL	90.29

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE:	1.13
--------	------

SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. No. 4.

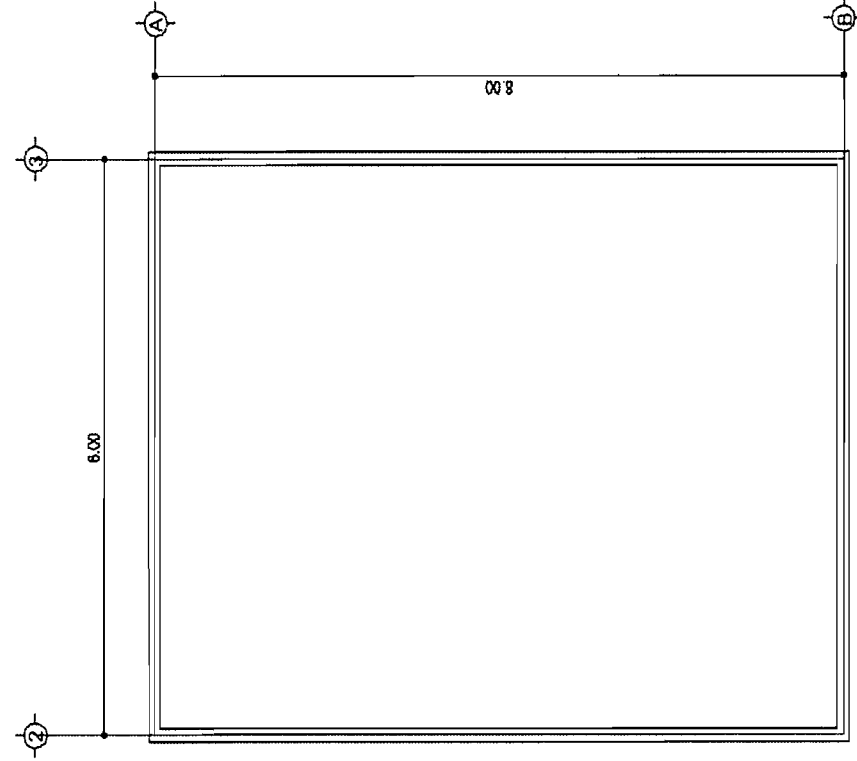

DALA CD-1

LARGO VS (M)	# VS	M VS TOTAL LARGO
6.00	4.00	24.00
6.00	4.00	24.00
8.00	4.00	32.00
8.00	4.00	32.00
TOTAL M LARGO		112.00

TOTAL M VS	112.00
KG/M2 VS # 4	0.994
KG TOTAL	111.33

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 1.14

SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE: VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.

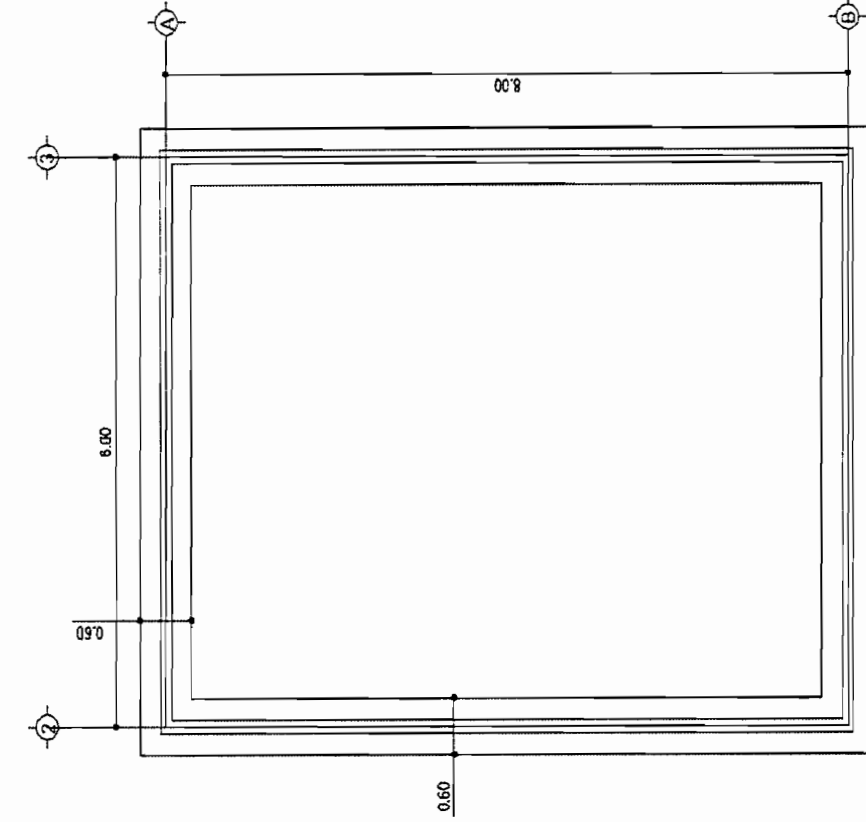

ZAPATAS Z3

LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)
6.00	0.60	0.15	0.54
6.00	0.60	0.15	0.54
8.00	0.60	0.15	0.72
8.00	0.60	0.15	0.72
TOTAL			2.52

DALA CD-1

LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)
6.00	0.14	0.30	0.25
6.00	0.14	0.30	0.25
8.00	0.14	0.30	0.34
8.00	0.14	0.30	0.34
TOTAL			1.18

TOTAL CONCRETO (M3)	3.70
---------------------	------

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA


FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 2.1

IRABE T-1 DE 20X40CMS. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. ARMADA CON ACERO F'Y=4200 KG/CM2. 3 VARILLAS #4 LECHO INFERIOR Y 2 VAR. #4 EN EL LECHO SUPERIOR. 2 BASTONES #4 EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA LONGITUD SEGUN PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4". 4 USOS. CRUCES DE VARILLAS. CHAFLAN A BASE DE TUINO DE 1 PULGADA. HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD. ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.

SOBRE EJE	LARGO (M)
A	6.51
B	6.51
TOTAL	13.02

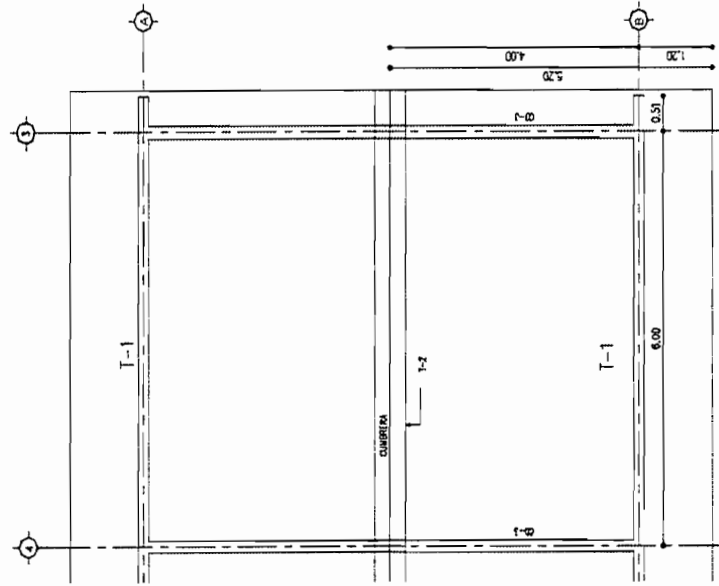

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESUS MANUEL FRANCIS MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

TRABE T-2 TRAPEZOIDAL DE 50CMS. DE ANCHO AHOGADA EN CUMBRERA, CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS #4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTIBOS No.2 @ 20 CMS SEGUN PLANO. INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FETER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7,14 Y 28 DIAS.

CLAVE: 2.2

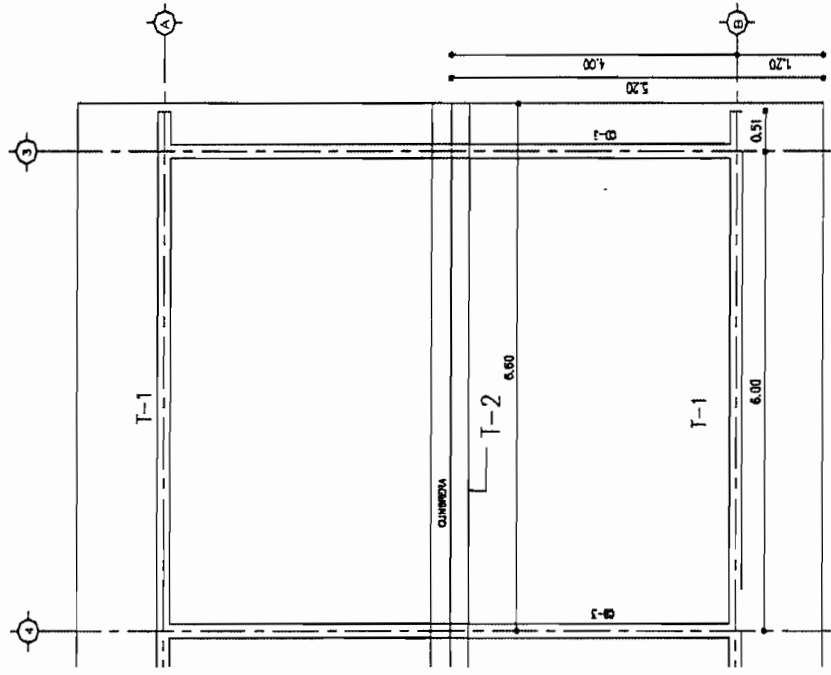

ENTRE EJE	LARGO (M)
A Y B	6.60
TOTAL	6.60

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

[Signature]

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA


[Signature]

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

2.3

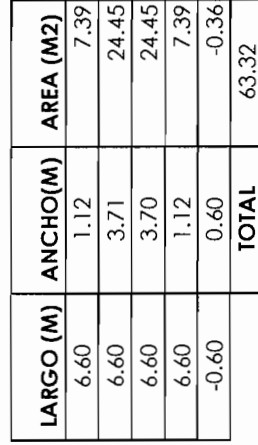

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016


QUIS DE LOCALIZACION.

CADENA CD-2 DE REPISON DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 30CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.

CLAVE: 3.2

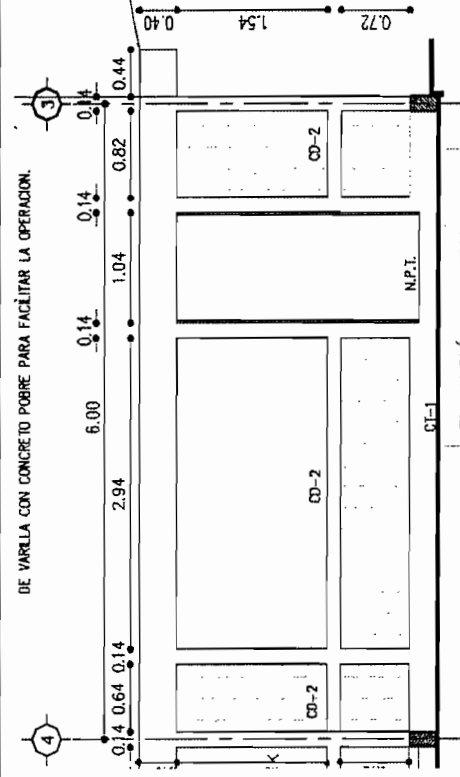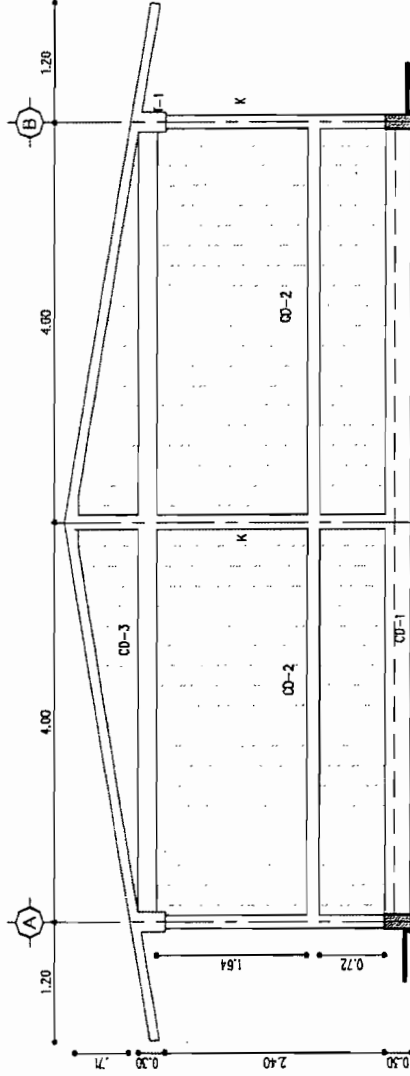

ELEVACIÓN LATERAL

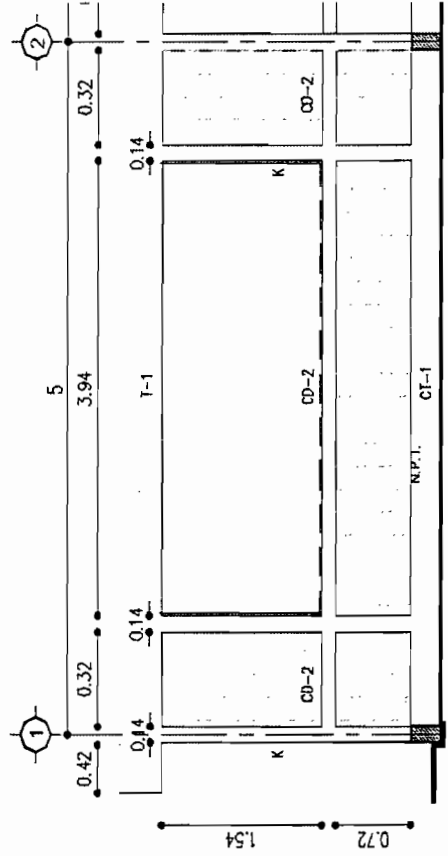

ELEVACIÓN FRONTAL

LARGO (M)	
ELEVACIÓN LATERAL	3.86
ELEVACIÓN FRONTAL	3.86
ELEVACIÓN POSTERIOR	0.64
	2.94
	0.82
	0.32
	3.94
	0.32
TOTAL (M)	16.70

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACIÓN No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA


FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

AS DE LOCALIZACION.


CADENA CD-3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #4 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CLAVE:

3-4

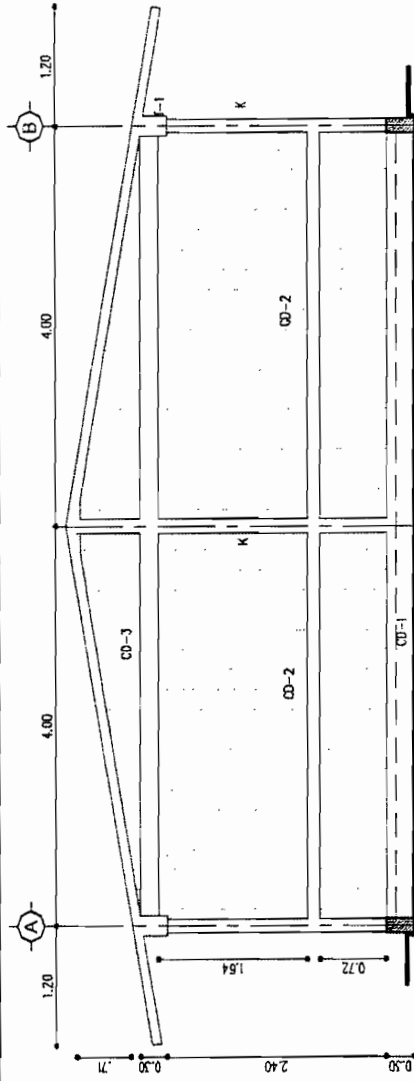

ELEVACIÓN LATERAL

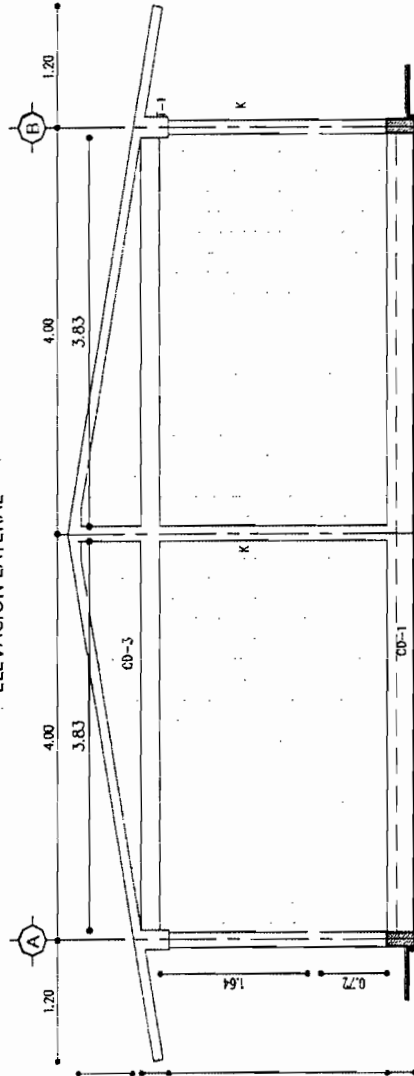

ELEVACIÓN LATERAL INTERIOR

	LARGO (M)
ELEVACIÓN LATERAL	3.83
ELEVACIÓN LATERAL INTERIOR	3.83
TOTAL (M)	15.32

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA
ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

DE LOCALIZACION.


MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VE: 3.5

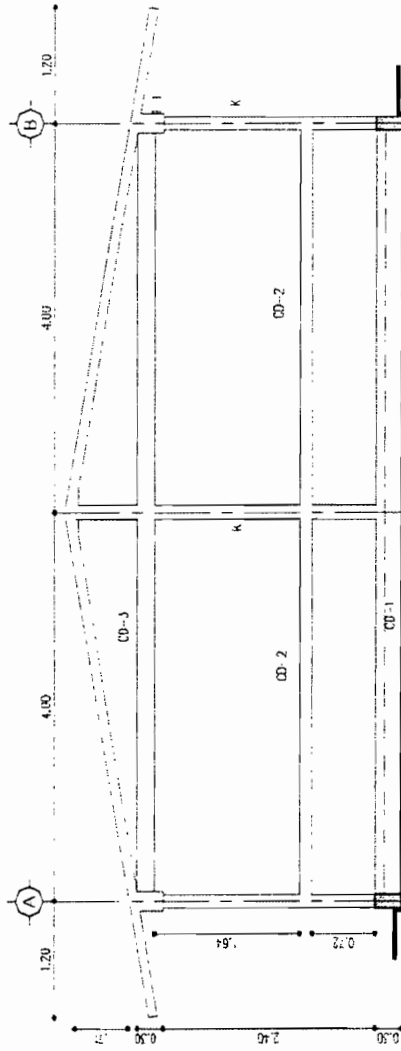


ELEVACIÓN LATERAL Y LATERAL INTERIOR

LA ELEVACION INTERIOR NO LLEVA DALA CD-2 POR LO QUE SE AGREGARÁ A EL AREA DE MUROS

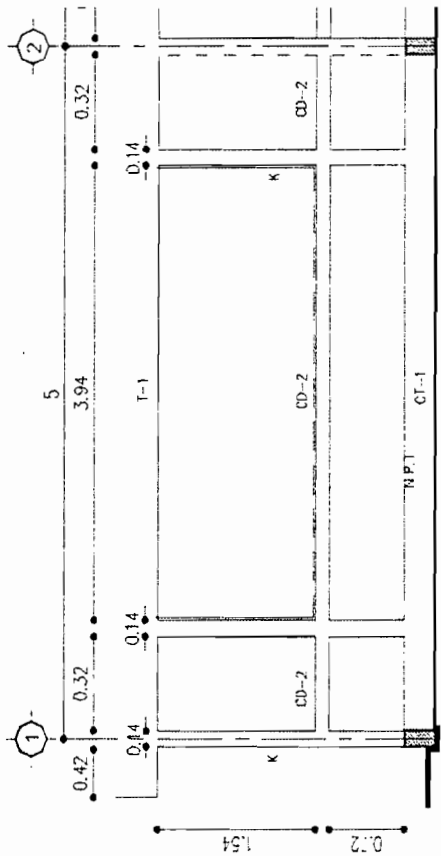

ELEVACIÓN POSTERIOR

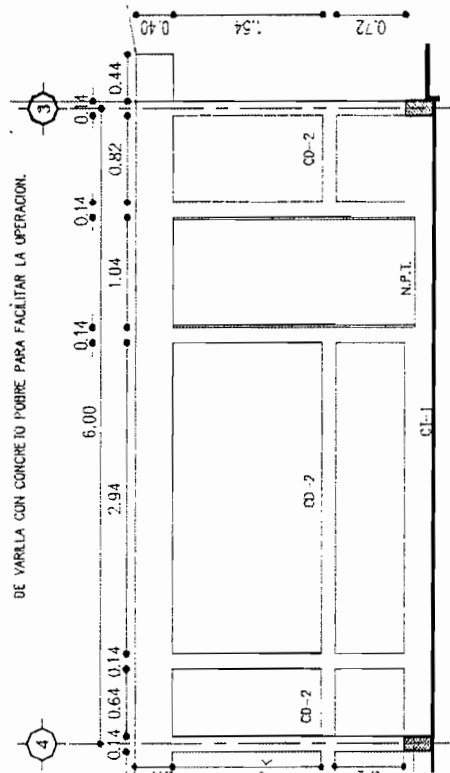

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN LATERAL	ALTO (M)	ÁREAS IGUALES	ÁREA (M2)
LARGO (M)	3.86	0.72	4
	3.86	1.64	4
	3.86	0.71	2
	3.86	0.14	2
ELEVACIÓN FRONTAL			
	0.64	1.54	1
	0.64	0.72	1
	2.94	0.72	1
	0.82	1.54	1
	0.82	0.72	1
ELEVACIÓN POSTERIOR			
	0.32	1.54	2
	0.32	0.72	2
	3.94	0.72	1
SUMA			52.7

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA DE ACERO 6X6-10-10, ACABADO PULIDO, CON JUNTAS FRÍAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX- 1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD; DISTRIBUIDAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA APARENTE, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CLAVE: 3.7

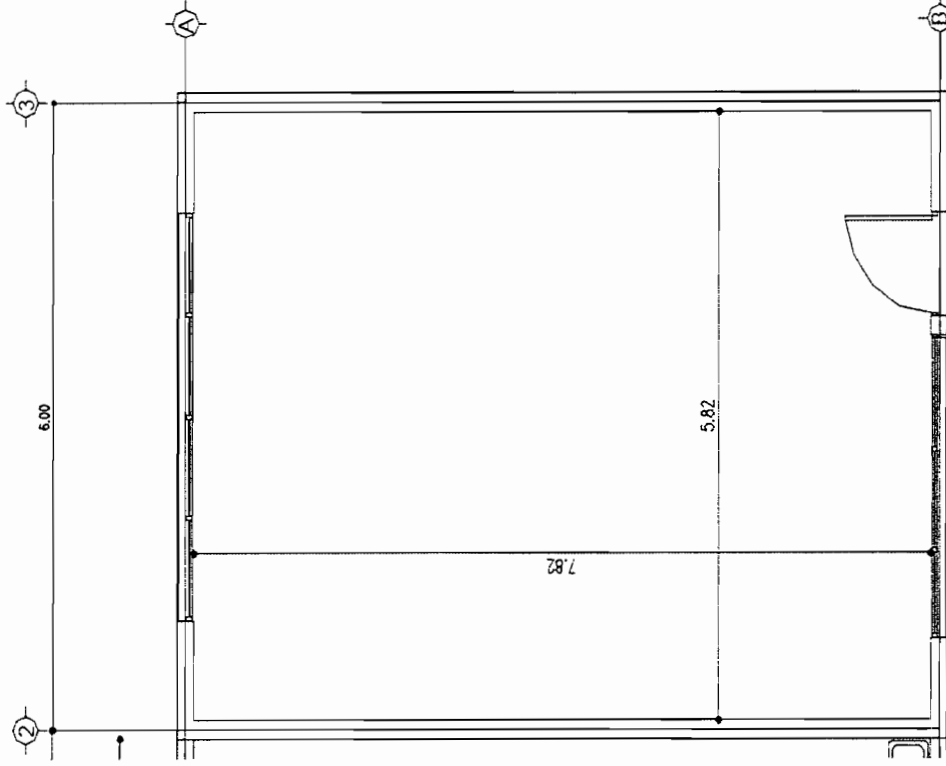

LARGO (M)	ANCHO (M)	AREA(M2)
7.82	5.82	45.51

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACIÓN No. 1

PERÍODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACIÓN: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.


APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTADO ARENA 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA O CASETON DE POLIESTIRENO, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS DE CANCELERIA Y PUERTAS.

CLAVE: 3.8

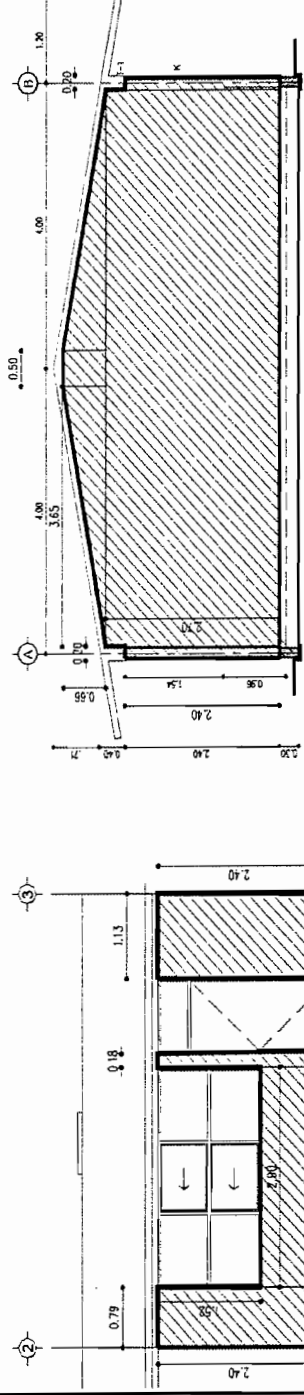

FACHADA FRONTAL

FACHADA LATERAL E INTERMEDIA

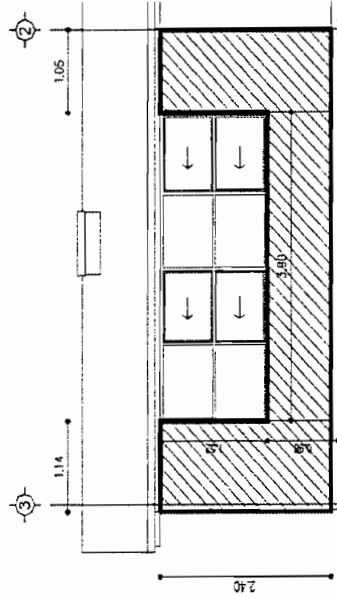

FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL

FACHADA POSTERIOR

DESCUENTO DE ANCHO DE MUROS INTERIORES			
ANCHO	ALTO	SUPERFICIE	X2
FACHADA FRONTAL	0.14	2.4	0.34
FACHADA POSTERIOR	0.14	2.4	0.34
FACHADA INTERMEDIA	0.14	2.4	0.34
FACHADA LATERAL	0.14	2.4	0.34
TOTAL			2.69

LARGO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)
0.79	2.4	1.90
2.9	1.52	4.41
1.13	2.4	2.71
SUPERFICIE EXTERIOR		9.02
SUPERFICIE INTERIOR		9.02

1.14	2.4	2.74
3.9	0.98	3.82
1.05	2.4	2.52
SUPERFICIE EXTERIOR		9.08
SUPERFICIE INTERIOR		9.08

0.2	2.4	0.48
7.8	2.7	21.06
0.2	2.4	0.48
3.65	0.66	2.409
0.5	0.66	0.33
SUPERFICIE EXTERIOR		24.76
SUPERFICIE INTERIOR		49.52

DESCUENTO DE ANCHO DE MUROS INTERIORES X2
SUPERFICIE TOTAL 107.78

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL TRAFICO MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL


No. CONTRATO: 101/2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016


CROQUIS DE LOCALIZACION.

CLAVE: 3.14

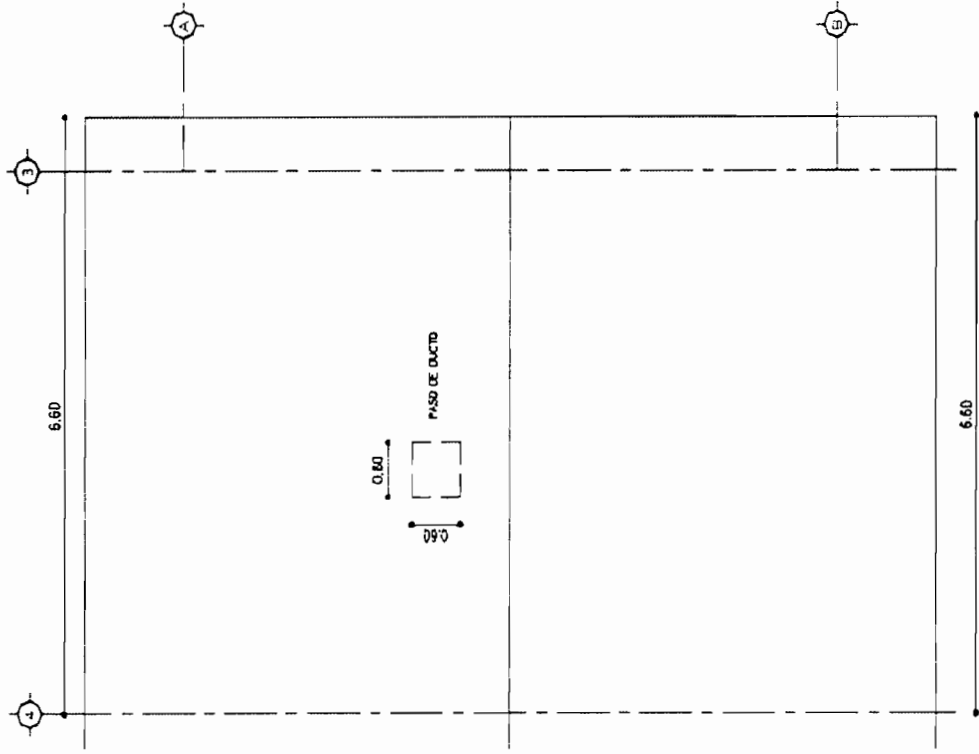

DUCTO

LARGO (M)	ANCHO (M)	AREA(M2)
6.6	10.55	69.63
-0.6	0.6	-0.36
TOTAL		69.27

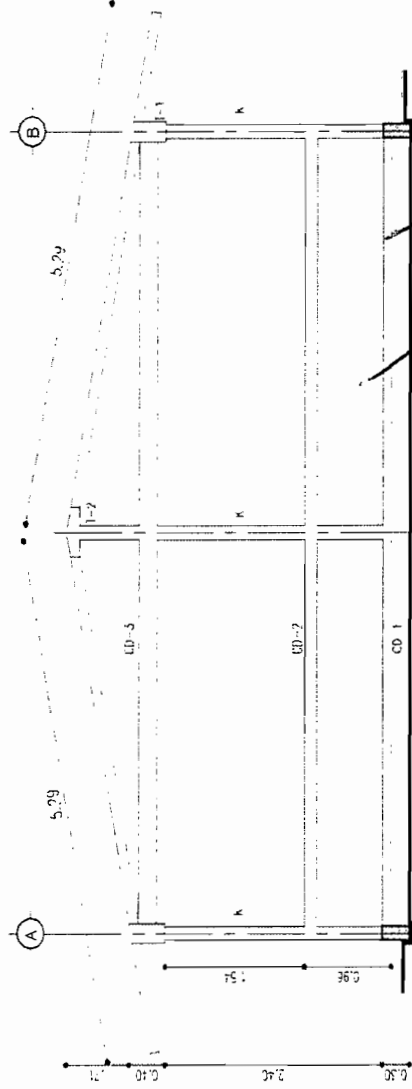

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



ESTIMACION No. 1

PERIODO: 10 DE JUNIO DE 2016 AL 9 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

No. CONTRATO: 101/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

FECHA ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2016

CROQUIS DE LOCALIZACION.

CASTILLOSCADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 28 X 14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 , ESIRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.

CLAVE: EXT-01

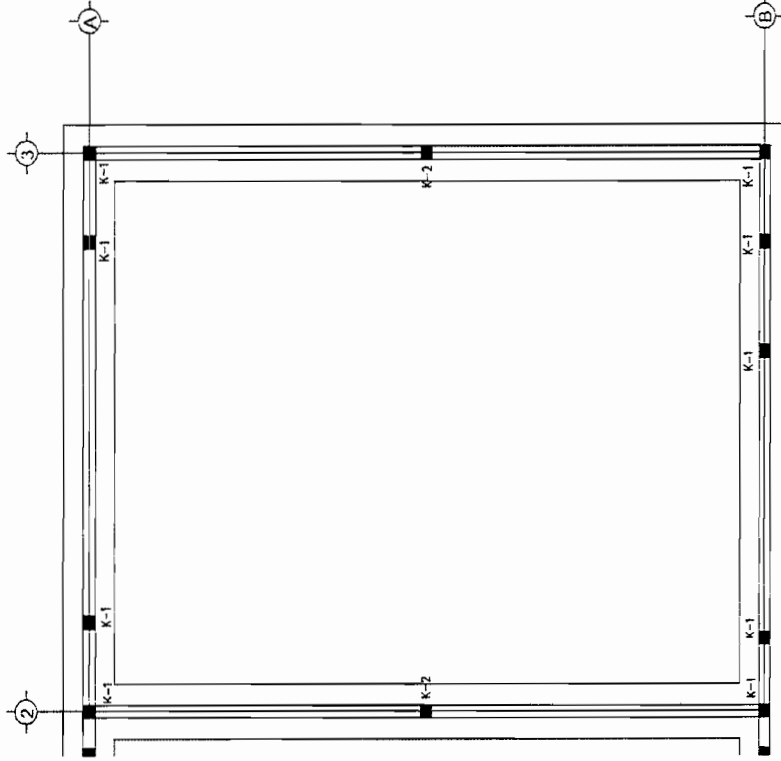

CASTILLO	# CASTILLOS	LONGITUD (M)	TOTAL (M)
K-1	9	3.46	31.14
K-2	2	2.40	4.80
TOTAL			35.94

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CHIH.

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA		FECHA DE RECIBO	01-jul-16
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA		FECHA DE INFORME	08-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.					
MUESTRA No.	25				
TOMADA DE.	LOSA DE PISO				

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

f_c (kg/cm ²)	250				
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2				
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO				MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-109-ONNCCE-2013 NMX-C-156-ONNCCE-2010 NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-2013
ADITIVO					

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	REVOLVEDORA DE 1 SAGO
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLEADO
CEMENTO	CHIHUAHUA CPC 30-R
CAMION No.	
REMISION No.	
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1
HORA	
REVENIMIENTO (cm)	11.0

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.0				
SECCION (cm ²)	176.7				
FECHA DE COLADO	01-jul-16				
FECHA DE RUPTURA	08-jul-16				
EDAD (DÍAS)	7				

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL				
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO				
CARGA DE RUPTURA (kg)	29710				
RESISTENCIA (kg/cm ²)	168.1				
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	67.3				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD,
SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA		
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA	FECHA DE RECIBO	01-jul-16
		FECHA DE INFORME	29-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.						
MUESTRA No.	25	25				
TOMADA DE.	LOSA DE PISO					

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

fc(kg/cm ²)	250	250				
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2	10±2				
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO					MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-109-ONNCCE-2013 NMX-C-156-ONNCCE-2010 NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-2013
ADITIVO						

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	REVOLVEDORA DE 1 SACO					
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLEADO					
CEMENTO	CHIHUAHUA CPC 30-R					
CAMION No.						
REMISION No.						
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1					
HORA						
REVENIMIENTO (cm)	11.0	11.0				

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.1	15.0				
SECCION (cm ²)	179.1	176.7				
FECHA DE COLADO	01-jul-16					
FECHA DE RUPTURA	29-jul-16					
EDAD (DIAS)	28	28				

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL					
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO					
CARGA DE RUPTURA (kg)	45020	45720				
RESISTENCIA (kg/cm ²)	251.4	258.7				
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	100.5	103.5				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD,
CUMPLE CON LA DE PROYECTO.

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO

AUTORIZO

C. FAUSTO CHÁVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA	FECHA DE RECIBO	24-jun-16
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME	22-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.						
MUESTRA No.	23	23				
TOMADA DE.		CIMENTACION				

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

f_c (kg/cm ²)	250	250				
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2	10±2				
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO					METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-109-ONNCCE-2013 NMX-C-156-ONNCCE-2010 NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-2013
ADITIVO						

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.						
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REVOLVEDORA DE 1 SACO					
CEMENTO	REGLEADO					
	CHIHUAHUA CPC 30-R					
CAMION No.						
REMISION No.						
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1					
HORA						
REVENIMIENTO (cm)	12.0	12.0				

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.1	15.1				
SECCION (cm ²)						
FECHA DE COLADO	179.1	179.1				
FECHA DE RUPTURA	24-jun-16					
	22-jul-16					
EDAD (DIAS)	28	28				

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL					
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO					
CARGA DE RUPTURA (kg)	46710	45710				
RESISTENCIA (kg/cm ²)	260.8	255.2				
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	104.3	102.1				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD,

CUMPLE CON LA DE PROYECTO

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA	FECHA DE RECIBO	24-jun-16
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME	01-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.					
MUESTRA No.	23				
TOMADA DE.	CIMENTACION				

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

f_c (kg/cm ²)	250				
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2				
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO	MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-109-ONNCCE-2013 NMX-C-156-ONNCCE-2010 NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-2013			
ADITIVO					

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	REVOLVEDORA DE 1 SAGO
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLEADO
CEMENTO	CHIHUAHUA CPC 30-R
CAMION No.	
REMISION No.	
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1
HORA	
REVENIMIENTO (cm)	12.0

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.1				
SECCION (cm ²)	179.1				
FECHA DE COLADO	24-jun-16				
FECHA DE RUPTURA	01-jul-16				
EDAD (DIAS)	7				

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL				
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO				
CARGA DE RUPTURA (kg)	32620				
RESISTENCIA (kg/cm ²)	182.1				
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	72.9				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD,
SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO

AUTORIZO

[Firma]

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA	FECHA DE RECIBO	27-jun-16
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME	04-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.						
MUESTRA No.	17					
TOMADA DE.	TRABES					

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

f_c (kg/cm ²)	250					
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2					
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-109-ONNCCE-2013 NMX-C-156-ONNCCE-2010 NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-2013				
ADITIVO						

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	REVOLVEDORA DE 1 SACO
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLEADO
CEMENTO	CHIHUAHUA CPC 30-R
CAMION No.	
REMISION No.	
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1
HORA	
REVENIMIENTO (cm)	10.5

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.1					
SECCION (cm ²)	179.1					
FECHA DE COLADO	27-jun-16					
FECHA DE RUPTURA	04-jul-16					
EDAD (DIAS)	7					

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL					
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO					
CARGA DE RUPTURA (kg)	30110					
RESISTENCIA (kg/cm ²)	168.1					
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	67.2					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD,
SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA		FECHA DE RECIBO	27-jun-16
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA		FECHA DE INFORME	25-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.						
MUESTRA No.	17	17				
TOMADA DE.	TRABES					

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

f_c (kg/cm ²)	250	250				
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2	10±2				
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO					MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-109-ONNCCE-2013 NMX-C-156-ONNCCE-2010 NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-2013
ADITIVO						

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	REVOLVEDORA DE 1 SAGO
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLEADO
CEMENTO	CHIHUAHUA CPC 30-R
CAMION No.	
REMISION No.	
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1
HORA	
REVENIMIENTO (cm)	10.5 10.5

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.1	15.1				
SECCION (cm ²)	179.1	179.1				
FECHA DE COLADO	27-jun-16					
FECHA DE RUPTURA	25-jul-16					
EDAD (DIAS)	28	28				

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL					
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO					
CARGA DE RUPTURA (kg)	45000	45220				
RESISTENCIA (kg/cm ²)	251.3	252.5				
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	100.5	101.0				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD

CUMPLE CON LA DE PROYECTO.

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO

AUTORIZO

[Firma]

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA	FECHA DE RECIBO	28-jun-16
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME	05-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.					
MUESTRA No.	18				
TOMADA DE.	CASTILLOS				

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

f_c (kg/cm ²)	250				
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2				
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO				
ADITIVO					

MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS:

NMX-C-083-ONNCCE-2002
NMX-C-109-ONNCCE-2013
NMX-C-156-ONNCCE-2010
NMX-C-160-ONNCCE-2004
NMX-C-161-ONNCCE-2013

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	REVOLVEDORA DE 1 SACO
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLEADO
CEMENTO	CHIHUAHUA CPC 30-R
CAMION No.	
REMISION No.	
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1
HORA	
REVENIMIENTO (cm)	12.0

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.1				
SECCION (cm ²)	179.1				
FECHA DE COLADO	28-jun-16				
FECHA DE RUPTURA	05-jul-16				
EDAD (DIAS)	7				

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL					
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO					
CARGA DE RUPTURA (kg)	31220					
RESISTENCIA (kg/cm²)	174.3					
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	69.7					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD,
SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA	AULA TELESECUNDARIA	FECHA DE RECIBO	28-jun-16
LOCALIZACION	EJIDO LA ESPERANZA MPIO. DE CHIHUAHUA	FECHA DE INFORME	26-jul-16

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

ENSAYE No.						
MUESTRA No.	18	18				
TOMADA DE.	CASTILLOS					

DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

$f_c(kg/cm^2)$	250	250				
REVENIMIENTO PROY. (cm)	10±2	10±2				
TEMPERATURA AMBIENTE	TEMP. CONCRETO					METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-109-ONNCCE-2013 NMX-C-156-ONNCCE-2010 NMX-C-160-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-2013
ADITIVO						

DATOS DE LA OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	REVOLVEDORA DE 1 SACO					
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	REGLEADO					
CEMENTO	CHIHUAHUA CPC 30-R					
CAMION No.						
REMISION No.						
TIPO DE FALLA	TIPO DE FALLA 1					
HORA						
REVENIMIENTO (cm)	12.0	12.0				

DATOS DEL ESPECIMEN

DIAMETRO (cm)	15.1	15.1				
SECCION (cm ²)	179.1	179.1				
FECHA DE COLADO	28-jun-16					
FECHA DE RUPTURA	26-jul-16					
EDAD (DIAS)	28	28				

DATOS DEL ENSAYE

TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL					
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO					
CARGA DE RUPTURA (kg)	46120	47030				
RESISTENCIA (kg/cm ²)	257.5	262.6				
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	103.0	105.0				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD,
CUMPLE CON LA DE PROYECTO.

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDAZ 1811 COL. SANTA RITA C.P.31020 TEL. 4 10 60 32 CHIHUAHUA CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

REPORTE DE ACERO DE REFUERZO POR VALORES

VARILLAS CORRUGADAS DE ACERO PARA REFUERZO		FECHA DE		ENSAYE	
MUESTREADAS EN:		MUESTREO		26-jun-16	
ENVIADAS POR:		RECIBO		28-jun-16	
OBRA:		REPORTE		04-jul-16	
AULA TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPRANZA MPIO. DE CHIHUAHUA		CORRUGACION		ATAQUE	
IDENTIFICACION		S		mm	
AREA		A		mm	
Cm2		C		mm	
ESFUERZO MAXIMO		I		o	
Kg/Cm2		%		METALURGICO	
LIMITE ELASTICO		DOBLADO			
Kg/Cm2		20 Cm			
MIN		MAX			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			
MIN		MIN			
2300		4000			
3000		5000			
4200		6300			
4000		5000			



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDÁZ 1811 COL. SANTA RITA C.P.31020 TEL. 4 10 60 32 CHIHUAHUA CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

REPORTE DE ACERO DE REFUERZO POR VALORES

VARILLAS CORRUGADAS DE ACERO PARA REFUERZO		FECHA DE MUESTREO		ENSAYE							
MUESTREADAS EN:		RECIBO		HOJA 1 DE 1							
ENVIADAS POR:		REPORTE									
OBRA:		DOBLADO		ATAQUE METALURGICO							
IDENTIFICACION		ESFUERZO ALARGANDO		CORRUGACION							
		AREA	MAXIMO	S	A	C	I	O			
		Cm2	Kg/Cm2	20 Cm	mm	mm	mm	mm			
			%								
VALORES PROMEDIO DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS											
ENSAYE		1.25	4409	6900	16.5	ACEPTABLE	7.9	0.8	4.4	70	ACEPTABLE
DIAMETRO NOMINAL											
MARCA											
NUMERO DE MUESTRA											
GRADO DEL LOTE											
CONCLUSIONES											
EL LOTE CORRESPONDIENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS, CUMPLE											
ESPECIFICACIONES PARA EL GRADO 42											
OBSERVACIONES:											
PARA EMPLEARSE EN AULA											
ESPECIFICACIONES											
CLAVE	GRADO	MIN.	MIN	MIN	MIN	DEBE PASAR	MAX.	MIN	MAX	DEBE PASAR	
E	VALORES ESTRUCTURAL		2300	4000	18					70-90	
I	INTERMEDIO		3000	5000	16					70-90	
AR	ALTA RESISTENCIA	1.19	4200	6300	9	180° 4d	8.9	0.5	5.0	45-70	
TOR	TORCIDO EN FRIJO		4000	5000	8					35-45	
	OTRAS										

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA

FECHA

15-jun-16

LOCALIZACION: TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA
MUNICIPIO CHIHUAHUA

COMPACTACION DE PROYECTO

95%

ESPESOR DE PROYECTO

30 CMS

REPORTE DE COMPACTACION DE:

CAPA DE MATERIAL PARA DESPLANTE DE FIRMES
PARA PISOS EN LA CONSTRUCCION DE AULA

ING. OMAR PINTO

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m ³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
		DER	30	1950	1972	1881	10.0	6.5	96
		CEN	30	1950	1980	1884	10.0	7.0	96
		IZQ	30	1950	1985	1860	10.0	7.2	95

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES: LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

15-jun-16

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
OFICIO No. D-2948/2016

02 de agosto de 2016

**ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL
P R E S E N T E.-**

Con relación a su solicitud mediante escrito **S/N** de fecha 26 de julio del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA TELESECUNDARIA, EJIDO LA ESPERANZA"**, que al amparo del contrato No. **102/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	VOL	PU	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Cadena o castillo de concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm ² de 28 x 14 cm, armado con cuatro varillas # 3, $f_y=4200$ kg/cm ² , estribos del No. 2 @ 15 cm. Incluye: Cimbra común, descimbrado y cruces de varilla.	35.94	m	\$399.20

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$14,347.25 SIN IVA

A T E N T A M E N T E

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco -Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Jesús Manuel Franco Martínez -Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/gcn*




Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51







Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx









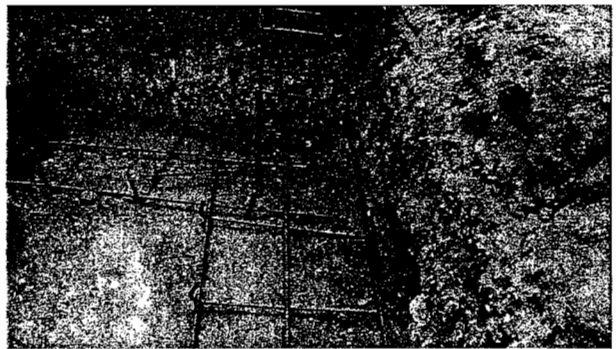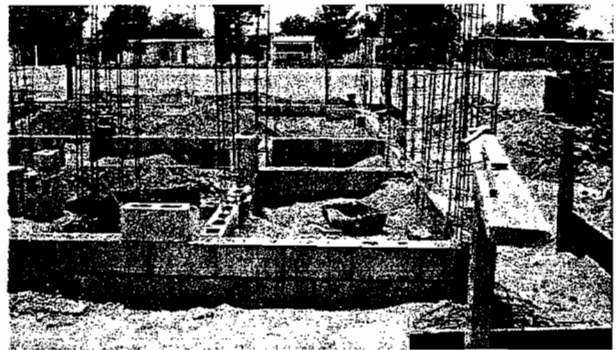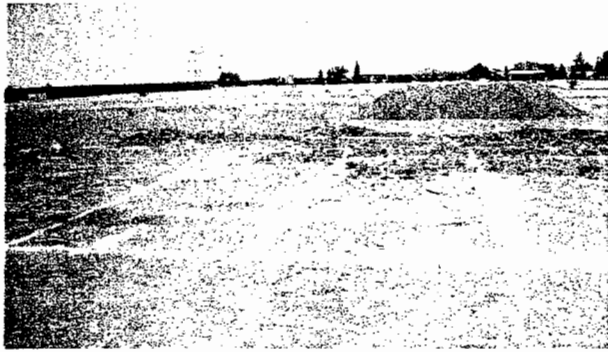

Jc.

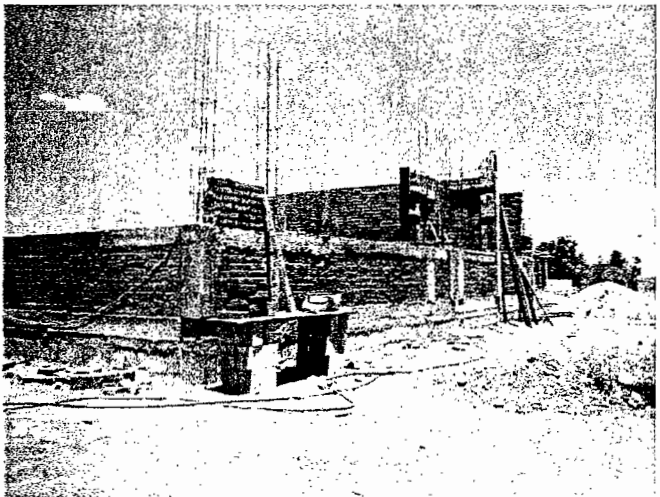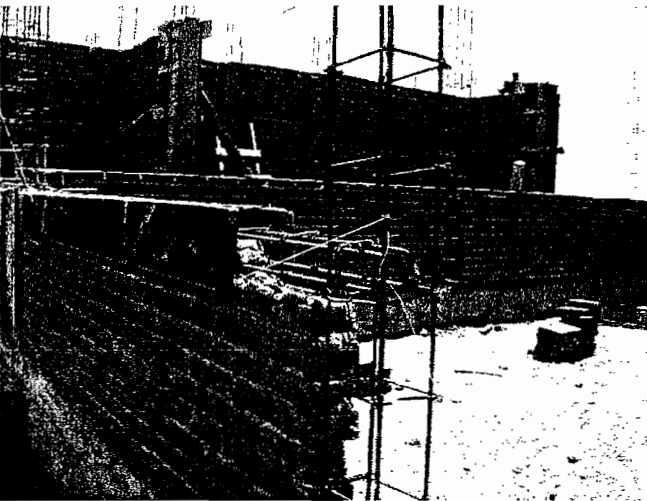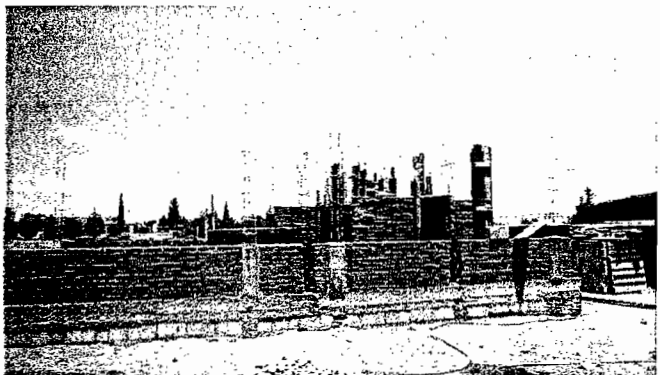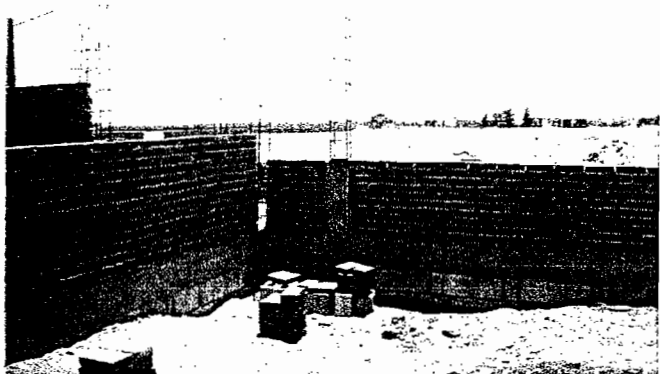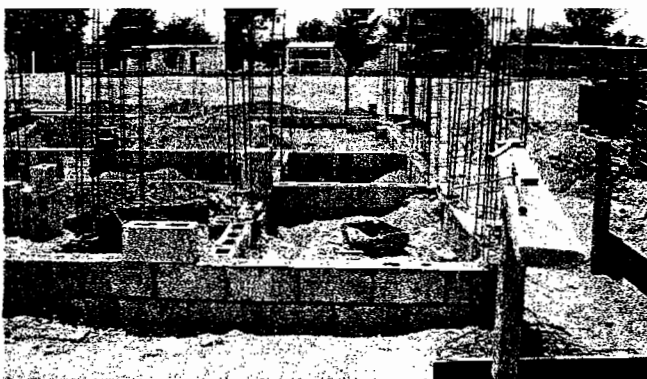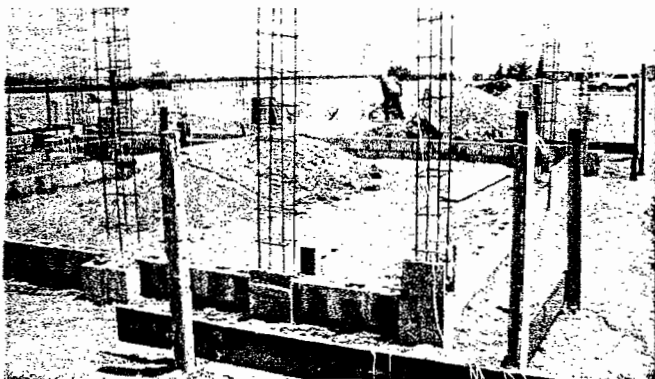

Jo.

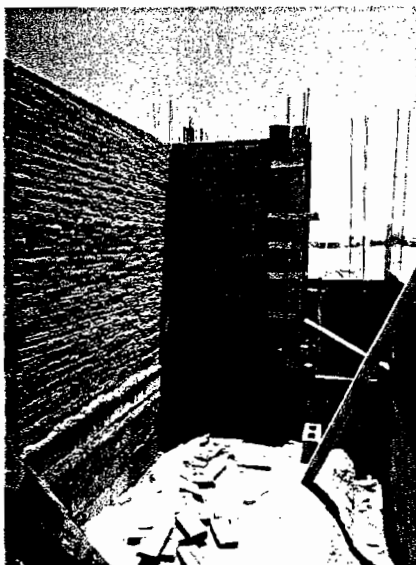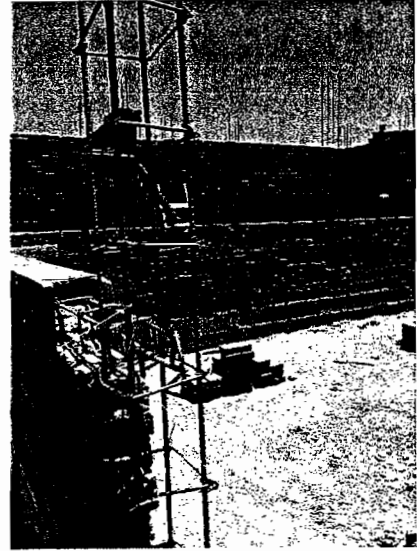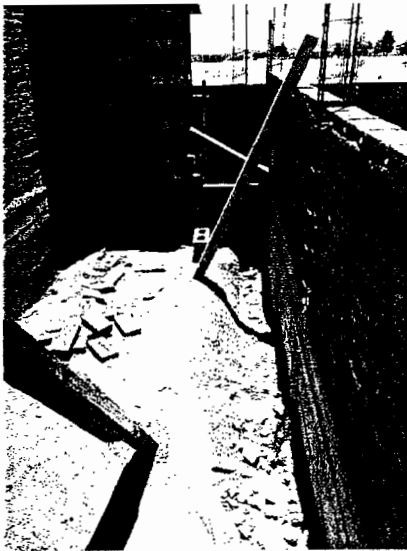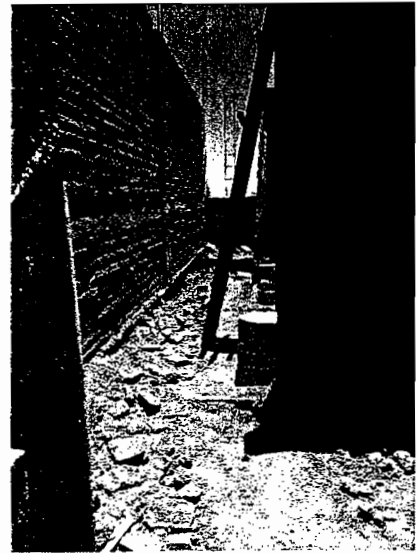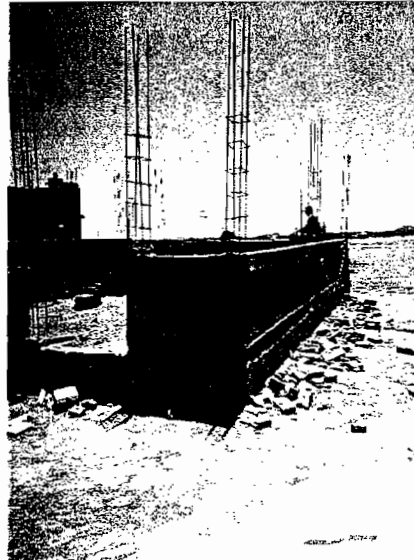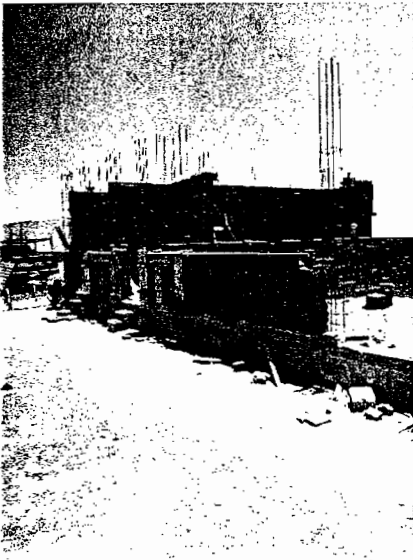

J.
