

105/16

MEMORANDUM

23 DE AGOSTO DEL 2016

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL
Y EVALUACION DE OBRA
PRESENTE.

Por este conducto me permito enviar a Usted Presupuesto y Justificación Técnica para la Cancelación Final por finiquito de la Obra.

Construcción de barda perimetral en jardín de niños Karunti, ubicado en calle Mineral Urique y calle Mineral Terremate, colonia Mineral II. Clave: 08DJN2053R.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P. ARCHIVO
gmm



**CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS KARUNTI, UBICADO EN CALLE MINERAL
URIQUE Y CALLE MINERAL TERREMATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R**

CONTRATO 105/2016

PRESUPUESTO DE CANCELACION AL OFICIO 2016-PDM-FISM-OP-048

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2MTS DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA	ML	287.39	\$83.47	\$23,988.44
2	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	17.23	\$493.55	\$8,503.87
3	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	143.69	\$10.90	\$1,566.22
4	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS CON MAQUINA, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	86.21	\$53.74	\$4,632.93
5	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AÑ 90%	M2	143.69	\$15.25	\$2,191.27
6	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LOGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	287.39	\$366.54	\$105,339.93
7	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	114.95	\$353.71	\$40,658.96
8	CADENA DE DESPLANTE DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS, ACABADO APARENTE CON TUINO EN LAS 4 ARISTAS INCLUYE CIMBRADO, COLADO Y CURADO	ML	287.39	\$216.18	\$62,127.97
9	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	572.32	\$291.46	\$166,808.39
10	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=60 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS,	ML	301.95	\$216.18	\$65,275.55
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS ACABADO ACABADO APARENTE CON TUINO EN LAS 4 ARISTAS, INCLUYE CIMBRADO, COLADO Y CURADO	ML	287.39	\$229.49	\$65,953.13
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y SELLADOR	M2	1,350.73	\$49.85	\$67,333.89
13	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	44.23	\$70.42	\$3,114.68
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS DE ALTURA Y 4 MTS DE ANCHO EN 2 HOJAS	PIEZA	1.00	\$3,446.31	\$3,446.31

**CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS KARUNTI, UBICADO EN CALLE MINERAL
URIQUE Y CALLE MINERAL TERREMATE, COLONIA MINERAL II. CLAVE: 08DJN2053R**

CONTRATO 105/2016

PRESUPUESTO DE CANCELACION AL OFICIO 2016-PDM-FISM-OP-048

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	65.50	\$127.05	\$8,321.78
16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2	143.69	\$7.26	\$1,043.19

**SUBTOTAL
IVA**

**630,306.50
100,849.04**


TOTAL

731,155.54

ESTADO	CHIRIQUÍA
MUNICIPIO	CHIRIQUÍA
LOCALIDAD	CHIRIQUÍA
NÚ. ASES	
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN JARDIN DE NIÑOS "PALMITO"
CONSECUTIVO ID (MIES)	

FECHA	DA	MES	AÑO
	28	7	2016

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

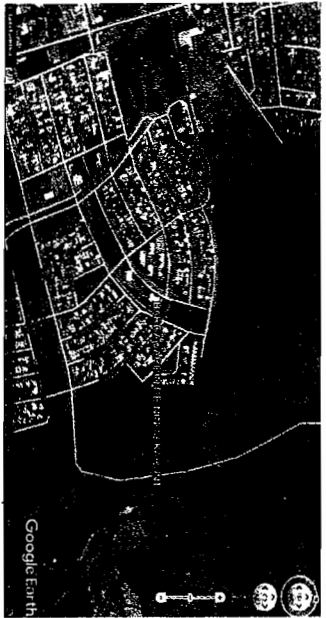

CALLE	INTERCOMUNICACION
NÚ.	NUMERAL DE URBANO Y NUMERAL TRANSANTE
COLOMIA	S/N
CÓDIGO POSTAL	MANUEL II 31104


INDIQUE CON UNA "X" LA OPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA	
1.- ¿SE INVITÓ A LA POBLACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA?	EXPERIENCIA
☒ SI ☐ NO	SE LES DIO AVISO A LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO VECINOS AL LUGAR
2.- DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ¿ESTUVO PRESENTE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA?	EXPERIENCIA
☒ SI ☐ NO	SI SE INVITÓ A LA POBLACIÓN
3.- ¿EXISTEN INCONVENIENTES DE LOS BENEFICIARIOS CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA REALIZADA?	EXPERIENCIA
☒ SI ☐ NO	NINGUN VECINO O AUTORIDAD MANIFESTÓ INCONVENIENTES
4.- ¿LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CONCUERDA CON LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTÓ EN LA MIS?	EXPERIENCIA
☒ SI ☐ NO	
5.- ¿LA OBRA CUENTA CON UNA PLACA DONDE SE INDICITE SU FINANCIAMIENTO CON RECURSOS FAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS?	EXPERIENCIA
☒ SI ☐ NO	

NOMBRES NIÑOS QUE PARTICIPAN			
NOMBRE	CARGO	COMUNO	TELÉFONO/CELULAR
C. JESUS MARINO PEREA MONTON	CIENNA DE FALCET Y ATENCION CIUDADANA	ESTADO DE GUATEMALA	CONMUTADOR 072 EXT 6127
MRS. LUIS CARLOS SALAZAR ROMANIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ESTADO DE GUATEMALA	CONMUTADOR 072 EXT 6124

C. JESUS MARINO PEREA MONTON	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR TÉCNICO SOCIAL	FIRMA

FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO

Página 2 de 2

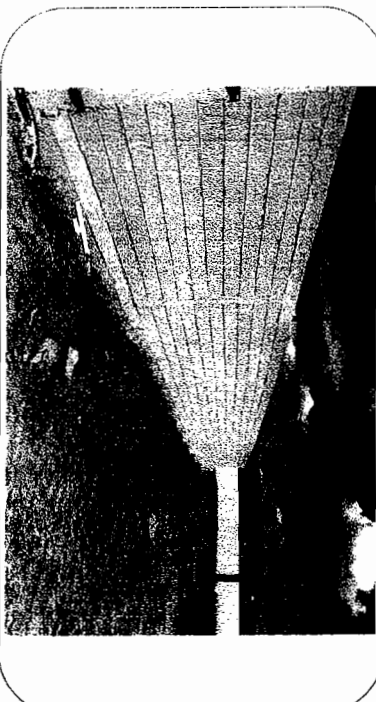

RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

SE CONVOCÓ A LAS AUTORIDADES DE LA SECUNDARIA 3060, SE LES DIO EXPLICACIÓN ACERCA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y SE PROCEDEO A LA FIRMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

C. JESUS MARINO PEREA MONTON	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR TÉCNICO SOCIAL	FIRMA
