



FACTURA

CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA PASO DEL NORTE
SA DE CV
CEI110518AR4
CALLE FLORIDA, 117, Col.
FRACC. ALAMEDA
GALGODROMO, JUAREZ, C.P.
32400 Juárez Chihuahua, México
Tel. 6561305088.

Folio Fiscal:

4ECA592B-CFA7-46A6-A630
-163685CDD80E
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000300952817
Fecha y hora de certificación:
2016-10-05T20:49:27
Fecha y Hora de Emisión:
2016-10-05T20:49:22



Forma de pago: Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: Ingreso
Moneda: MXN
Número de documento: A-140
Lugar de expedición: JUAREZ, Juárez, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Calle: MINA, 408
Colonia: CENTRO
Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: Chihuahua
Estado: Chihuahua
País: México

CP: 31000
Telefono:
E-mail:
RFC: MCI651010V22

1	N/A	Estimación Numero 3, Referente a : Pavimentación con Concreto Hidráulico en Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías de Ferrocarril, Col. Crucero. Incluye: Guarniciones, Banquetas, Línea General de Agua Potable, Tomas Domiciliarias y Descargas Domiciliarias, en ciudad de Chihuahua, Chih.	\$792,295.30	\$792,295.30
1	N/A	Contrato: 114/2016		
1	N/A	Periodo: 01 de Septiembre al 15 de Septiembre del 2016		
1	N/A	ANTICIPO AMORTIZADO AL 30.00 %	\$-237,688.59	\$-237,688.59
1	N/A	RETENCIONES:	\$0.00	\$0.00
		I.C.I.C. AL 0.2 % \$1,584.59 C.M.I.C. AL 0.2 % \$1,584.59 D.I.F. AL 0.2 % \$1,584.59 S.I.V.C.S. AL 0.5 % \$3,961.48		
1	N/A	TOTAL DE RETENCIONES: \$8,715.25 IMPUESTO AL 16.00 % \$88,737.07	\$0.00	\$0.00
		NETO A RECIBIR: \$634,628.53		

SUBTOTAL: \$554,606.71
IVA 16 % \$88,737.07
TOTAL: \$643,343.78

IMPORTE TOTAL EN LETRA
(SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.)

Método de pago: 02 - Cheque nominativo

Condición de pago: Contado

No cuenta de pago No identificado

zaLggSltv/d63AFV1wr/FxYp39q8p11cCyKSvIv32GRB9A64/KPG0IZ8V0s4LTP8qpwmnSVsXlpw9208ha3JrsnpDQATISkORYf+qRHJb6vmbjYJsY8
u2Ge68xw81IMtsXiYPuNERIERmY+HfTKiYvnKpRpo+Qo2iBSzg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CD9iICq5IEeu6JWpR9IkuWO87Y3MMCylaKJigNF9zZ6ZwEhCSXkt+9s99Csld6CzKyC3oIT+Cgqdu7tySci9+MKQ0dVkGoaLstszVcaVW5C5fUJvFqZu1Z
bZ1H2vPufGzuDoRomxAgigLV7pE/P+1M84FKNenopuSTDnCSiG7M/6XYyWM4CdF7U/flyGJISkNvC9cvS2z35wrOu+B/L1n+xLne+c8P0aDcEjRgfr2p7I
1CczpLQbKgxITEzCou63j1F7bZesSqDacSTtcULYqmkT3Y8YpGi46oOG8qbA4a8dXjNKjFpPpyDfqsqI8Qwg2ZQA3jTeYC6xQrCcjXg==

||1.0|4ECA592B-CFA7-46A6-A630-163685CDD80E|2016-10-05T20:49:27|zaLggSltv/d63AFV1wr/FxYp39q8p11cCyKSwlv32GRB9A64/KPG0IZ8V0s4LT
LP8qpwmnSVsXilbw9208ha3JrsnpDXfATSk8CRyIF+qRHHJbevmbyJJsY8u2Ge68xw81IMtsXiYPuNERIERmY+HfTKIYvnKpRpo+Qo2iBSzg=|000010000
00401477845|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
RENTAS Y SERVICIOS

ESTE PROGRAMA NO
PUEDE SER EJECUTADO EN
ENTORNO DE DESARROLLO
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINESES
DISTINTOS A LOS
LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificación de la imagen



RFC del Emisor

CEI110518AR4

Folio Fiscal

4ECA592B-CFA7-46A6-A630-163685CDDB0E

Total del CFDI

\$643,343.78

Nombre o Razón Social del Emisor

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
PASO DEL NORTE SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-10-05T20:49:22

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-10-05T20:49:27

Estado CFDI

Vigente


Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMO1007168C6

Verificación exitosa



**CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CEI-110518-AR4

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 3 (TRES) CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
Pavimentación con Concreto Hidráulico en Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías
de Ferrocarril, Col. Crucero. Incluye: Guarniciones, Banquetas, Línea General de Agua Potable, Tomas
Domiciliarias y Descargas Domiciliarias.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE

01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016

POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$643,343.78** CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RECIBE

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

"ESTE DOCUMENTO
RECEBESE POR LA EMPRESA CON
RECURSOS PROPIOS DE LA EMPRESA"

"ESTE DOCUMENTO ES
PÚBLICO, SE PUEDE COLOCAR
EN CUALQUIER LUGAR
QUE SEA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	FEDERAL MUNICIPAL	CONTRATO No.	114/2016	CONTRATADOS
OBRA:	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías de Ferrocarril, Col. Crucero. Incluye: Guarniciones, Banquetas, Línea General de Agua Potable, Tomas Domiciliarias y Descargas Domiciliarias.	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)	\$ 4,250,952.00 CON IVA
UBICACIÓN:	Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías de Ferrocarril, Col. Crucero, en Cd. Chihuahua, Chih.	PERÍODO EJEC.	01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	919,062.55 CON IVA
RFC	CEI-110518-AR4	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	581,700.87 CON IVA
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	1,500,763.42 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
OBRA NORMAL	\$ 792,295.30	
OBRA EXCEDENTE	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 792,295.30	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$	1,584.59
0.2% C.M.I.C.	\$	1,584.59
0.2% D.I.F.	\$	1,584.59
0.5% S.I.V.C.S.		3,961.48
SUMA DESCUENTOS	\$	8,715.25

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	792,295.30
AMORT ANTICIPO	\$	237,688.59
SUB-TOTAL	\$	554,606.71
I.V.A.	\$	88,737.07
TOTAL	\$	643,343.78

(CON LETRA)

(SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 78/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	8,715.25
SAIDO NETO A RECIBIR	\$	634,628.53

AUTORIZO

ELABORO

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE D.O.P.M

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL
JEFE DEL DEPTO DE
CONSTRUCCION

Vo. Bo.

LOS AGASABLECIDOS
EN EL PROGRAMA

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO MUNICIPALES



OBRA:	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías de Ferrocarril, Col. Crucero. Incluye: Guarniciones, Banquetas, Línea General de Agua Potable, Tomas Domiciliarias y Descargas Domiciliarias.		
MUNICIPIO:	Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías de Ferrocarril, Col. Crucero, en Cd. Chihuahua, Chih.		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.		
PERIODO:	01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)		
No. CONTRATO:	114/2016		

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

\$792,295.30

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO:	114/2016	TRAMO:	Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías de
OBRA:	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vías de Ferrocarril, Col. Crucero. Incluye: Guarniciones, Banquetas, Línea General de Agua Potable, Tomas Domiciliarias y Descargas Domiciliarias.	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
--------------------	----------	---------	---

CONCEPTO	2.5	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de concreto MR= 42.5kg/cm2 para calle, incluye juntas frías, curado de concreto, corte con disco, silletería, sellado de losas con sonomeric 1, así como varillas de 5/8 de diametro y 40 cm de longitud, curado y con un espesor de 15 cms de P.U.O.T.		CALLE MORELIA (NORTE) ---A--- (AREA CAJON M2)(h=0.15 MTS) = M3 AREA M2 1,237.50 ESPESOR 0.15 TOTAL 185.63 CALLE MORELIA (SUR) ---B--- (AREA CAJON M2)(h=0.15 MTS) = M3 AREA M2 1,368.00 ESPESOR 0.15 TOTAL 205.20 CALLE RIO GRANDE ---D--- (AREA CAJON M2)(h=0.15 MTS) = M3 AREA M2 210.00 ESPESOR 0.15 TOTAL 31.50 TOTAL 422.33		422.33 M3

ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO,
QUE DA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

GENERADOR DE OBRA

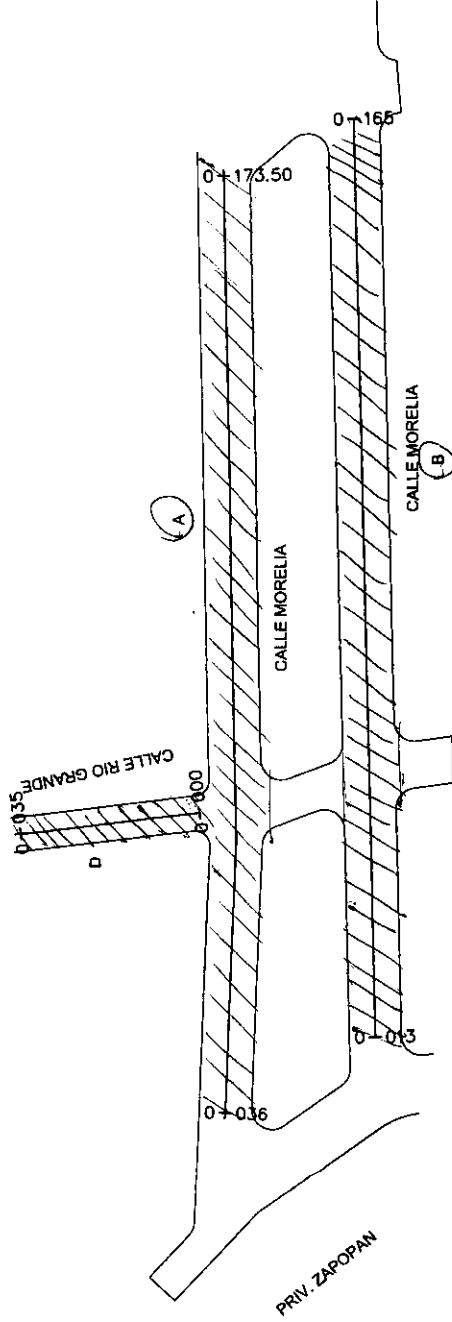

AREA=M2 (TOTALES) X (h=ESPESOR)

- (A) MORELIA NORTE (A)
137.50 ML X 9.00 MTS X 0.15 MTS = 185.63 M3
- (B) MORELIA SUR (B)
152.00 ML X 9.00 MTS X 0.15 MTS = 205.20 M3
- (D) RIO GRANDE
35.00 ML X 6.00 MTS X 0.15 MTS = 31.50 M3

*ESTE PROGRAMA ES

PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER

AREA TOTAL = 185.63 + 205.20 + 31.50 = 422.33 M3

QUEDA PROHIBIDA EL

USO PARA FINES

DISTINTOS A

LOS ESTABLECIDOS

EN EL PROGRAMA

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
SUPERVISOR DE OBRA

ESTUDIO DE PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION
CALLE RIO GRANDE - CALLE MORELIA
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION
CALLE RIO GRANDE - CALLE MORELIA
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION
CALLE RIO GRANDE - CALLE MORELIA

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

001A

FOTOGRAFIA DEL GENERADOR

CONTRATO:	11/4/2016	TRAMO:	Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vialite
OBRA:	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Privada de Zapopan/Morelia entre Blvd. Fuentes Mares y Vias de Ferrocarril, Col. Crucero. Incluye: Guarniciones, Banquetas, Línea General de Agua Potable, Tomas Domiciliarias y Descargas Domiciliarias.	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
--------------------	----------	---

CONCEPTO	2.5	OPERACIONES ARITMETICAS	FOTOGRAFIA	VOLUMEN A PAGAR
Suministro y colocación de concreto MR = 42.5kg/cm2 para calle, incluye juntas frías, curado de concreto, corte con disco, silletas, sellado de losas con sonomente 1, así como varillas de 5/8 de diametro y 40 cm de longitud, curado y con un espesor de 15 cms de P.U.O.T.				

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE DEL DOPM

Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)
ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES (ROBERTOJEFFE) (CONTRATISTA)

No. de nota: 9

Fecha formalización: 2016-08-24
12:35:58.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: -EN ESTA MOTA SE ASIENTA:- QUE SE COORDINA CON LA J.M.A.S. PARA CLAUSURAR LINEAS QUE FUERON SSTITUIDAS POR NUEVA TUBERIA. -SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA DE C.F.E. CON PRESUPUESTO PARA MOVIMIENTO DE RETENIDA EXISTENTE. -SE LE INDICA AL CONTRATISTA CONTINUE CON MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN LOS LAPROS QUE PERMITE EL CLIMA PARA AMINORAR EN LO POSIBLE LOS RETRASOS. -SE LE INDICA AL CONTRATISTA CONTINUE CON DELIMITADO DE AREAS CON SEÑALIZACION NECESARIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES (ROBERTOJEFFE) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)

No. de nota: 10

Fecha formalización: 2016-08-30
11:39:35.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 30/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: EN ESTA NOTA SE ASIENTA QUE SE AUTORIZA DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO QUEDANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION PARA EL DIA 11 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016. RESPECTIVAMENTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)
ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES (ROBERTOJEFFE) (CONTRATISTA)

No. de nota: 11

Fecha formalización: 2016-09-19
11:13:00.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

29 y 30 -08-16.- Continúan fuertes lluvias que atrasan el tendido del material de Base para su nivelación y posterior impregnación.

1-Sep-16.- El día 31 de Agosto no se pueden trabajar terracerías por lo saturado del material y el día 1º se abre canaleta lateral en terracería para escurrimiento de agua en el lado poniente de Calle Morelia.

6-Sep-16.- Se continúa con tendido de Base y nivelación Lado Oriente de Calle Morelia indicándole al Contratista considere una vez recibido el Tramo su Impregnación

7-sep-16.- se presenta lluvia el día de hoy.

9-sep 16.- Se recibe Terracería lado Oriente de Calle Rio Grande. Hacia vías del Ferrocarril. Y se sacan baches en Tramo Poniente Longitudinal para que se oree.

10-Sep-16.- Se impregna Tramo lado Oriente de Calle Rio Grande. Hacia vías del Ferrocarril, se le indica al Contratista presentar Precio Extraordinario de Guarnición de Concreto con sección de 560 cm2, ya que la del presupuesto no corresponde a la de proyecto.

12-sep-16.- Se le indica al contratista presentar solicitud de precio extraordinario para el pago de presupuesto de C.F.E. para movimiento de retenidas existentes.

16-sep-16.- Se continúa con vaciado de concreto en guarniciones de Calle Morelia lado Oriente. Y se Impregna parte restante de este lado Oriente. Además se continua con el tendido y compactación de base del lado Poniente.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)
ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES (ROBERTOJEFFE) (CONTRATISTA)

No. de nota: 12

Fecha formalización: 2016-09-21
16:32:25.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 21/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DIARIO

Se continua con vaciado de concreto en guarnición trapezoidal y se vacía concreto MR-42.5 en pavimento.

-Se le indica al contratista termine terracería de Calle Morelia lado poniente a nivel de base para su posterior Impregnación. aprovechando que no se han presentado lluvias, al igual que corte de terracerías en calle Priv. de Zapopan.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES (ROBERTOJEFFE) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (ALI4YO09MI66) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 114/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. RAFAEL MATA MÁRQUEZ, ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO **"EL MUNICIPIO"**, Y POR LA OTRA PARTE **CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA PASO DEL NORTE, S. A. DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **C. ROBERTO JEFTE BORDIER FONTES**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL CONTRATISTA"**; Y CONJUNTAMENTE COMO **"AMBAS PARTES"** QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- AMBAS PARTES DECLARAN:

- I.1.- Con fecha 10 de junio del 2016, **"AMBAS PARTES"** celebraron el Contrato de Obra Pública No. 114/2016, en el cual **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos descritos en la cláusula primera, consistentes en la obra denominada: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN / MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VÍAS DE FERROCARRIL, COL. CRUCERO INCLUYE; GUARNICIONES, BANQUETAS, LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS"**.
- I.2.- En dicho contrato, en la cláusula segunda se estableció el pago de **"EL MUNICIPIO"** por un importe de **\$3,664,613.79 (Tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 79/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así también en la cláusula tercera de dicho instrumento legal se estableció 80 días naturales, debiendo iniciarlos el 13 de junio de 2016 y terminarlos a más tardar el 31 de agosto 2016
- I.3.- Que para la celebración del contrato antes señalado, se contó con los recursos suficientes según oficios de autorización Nos. **2016-FORTALECE16-A-0042 de fecha 25 de abril de 2016** y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma según oficio de autorización No. **2016-PDM-FED-OP-001 de fecha 03 de mayo de 2016**, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.
- I.4.- De igual forma **"EL CONTRATISTA"** se comprometió a constituir en forma y términos de los artículos 48 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas las garantías correspondientes para asegurar el cumplimiento del contrato, el saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios y anticipo

6959-A



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 114/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. INGENIEROS XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 114/2016, CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD FUENTES MARES Y VIAS DE FERROCARRIL, COL. CRUCERO, INCLUYE; GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 28 de julio del 2016, el suscrito Director de Obras Públicas y Mantenimiento, asistido por la Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura y el Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Obra Pública e Infraestructura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza el diferimiento del plazo de ejecución por motivo del atraso en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos de la obra arriba referida, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 10 de junio de 2016, se celebró con la Empresa: **CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. de C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 114/2016, el cual tiene como objeto los trabajos de: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD FUENTES MARES Y VIAS DE FERROCARRIL, COL. CRUCERO, INCLUYE; GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIA**

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

Para uso exclusivo de asuntos Oficiales

www.mpiochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



**ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 114/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO**

RIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, por un monto de \$ 4'250,952.00 (cuatro millones doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 80 días naturales, debiendo iniciarlos el día 13 de junio de 2016 y terminarlos a más tardar el día 31 de agosto de 2016, pactándose un anticipo del 30% para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

II.- Que el cheque que ampara el importe del anticipo fue entregado a la empresa contratista hasta el día viernes 08 de julio de 2016, por lo que el importe del anticipo fue puesto efectivamente a su disposición hasta el lunes 11 de julio de 2016, debido a lo anterior, la empresa contratista no pudo llevar a cabo el inicio de los trabajos y la adquisición de equipos y materiales de instalación permanente en la obra en la fecha señalada en el contrato; aunado al hecho y como consta en el expediente del referido contrato 114/2016, el contratista exhibió de manera oportuna y de conformidad con el artículo 48 de la Ley en la materia, las garantías al anticipo y de cumplimiento a dicho contrato mediante las pólizas de fianza números 2000956 y 2000983 respectivamente, ambas emitidas por Afianzadora Sofimex, es procedente diferir el plazo de ejecución de la obra.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 114/2016, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 11 de julio de 2016 y 28 de septiembre de 2016, respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA PASO DEL NORTE, S.A. de C.V., el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

2



ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 114/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la ciudad de Chihuahua,
Chih., A los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

LA SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 114/2016, RELATIVO A PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN/MORELIA ENTRE BLVD FUENTES VIEJAS Y VIAS DE FERROCARRIL, COL. CRUCERO, INCLUYE; GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TORNILLOS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.
