



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV
COS120125CA2
Domicilio Fiscal
HUANCUNE 1808
Col. ARBOLEDAS 31114
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 4217627

Factura No: 188
FOLIO FISCAL (UUID):
1B89CC20-9167-4734-B72B-6DF90FDECB33
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302529149
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-06T14:22:09
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-06T14:17:09

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 06 octubre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCION DE ESCUELA TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE ESTIMACION 3 (TRES) SEGUN CONTRATO NUM 127/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 71,747.68 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 143.49 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 143.49 D.I.F. DEL 0.2% \$ 143.49 SUMA \$ 430.47 NETO A RECIBIR \$ 82,796.83	\$ 71,747.68	\$ 71,747.68

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y TRES MIL OISCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 30/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 71,747.68
IVA(IVA 16.00%): \$ 11,479.62
TOTAL: \$ 83,227.30

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W6uCywXHEBU1pUgnWbu... (ZRL)5whz0PyLm4mS7nC88qbv0prMntoxXuDgalRAPSUmA4UKZebhHPeY939Loj8MO6bNZkaS18weG7/5SWmsFoxdPY1pECpLWRUKDT0H74FXM6z2IFmns4vwgGJZZ1eDrevHY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

W6uCywXHEBU1pUgnWbu... (ZRL)5whz0PyLm4mS7nC88qbv0prMntoxXuDgalRAPSUmA4UKZebhHPeY939Loj8MO6bNZkaS18weG7/5SWmsFoxdPY1pECpLWRUKDT0H74FXM6z2IFmns4vwgGJZZ1eDrevHY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]1B89CC20-9167-4734-B72B-6DF90FDECB33[2016-10-06T14:22:09]W6uCywXHEBU1pUgnWbu... (ZRL)5whz0PyLm4mS7nC88qbv0prMntoxXuDgalRAPSUmA4UKZebhHPeY939Loj8MO6bNZkaS18weG7/5SWmsFoxdPY1pECpLWRUKDT0H74FXM6z2IFmns4vwgGJZZ1eDrevHY=0001000000203495276]]



www.tollosdigitales.com

Autenticación de firmas
Autenticación de sellos

Autenticación de firmas
Autenticación de sellos





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

COS120125CA2

Folio Fiscal

39AD4742-C093-4F01-AF78-
3EA9CC590F81

Total del CFDI

\$347,067.18

Nombre o Razón Social del
EmisorCONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN
PEDRO SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-10-06T14:11:18

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-10-06T14:16:18

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203JS7

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 127/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE ESCUELA TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 1,355,795.11 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	
UBICACIÓN: COLONIA LADRILLEROS NORTE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 83,227.30 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	1,028,748.45
RFC COS-120125-CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,111,975.75 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 71,747.68	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 71,747.68	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.		143.49
0.2% I.C.I.C.	\$	143.49
0.2% D.I.F.	\$	143.49
SUMA DESCUENTOS	\$	430.47
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	71,747.68
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	71,747.68
I.V.A.	\$	11,479.62
TOTAL	\$	83,227.30
(CON LETRA)		
(OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	430.47
SALDO NETO A RECIBIR	\$	82,796.83

AUTORIZO	ELABORO
	
ING. HUMBERTO CHAVEZ SALDIVAR	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
	
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 82,796.83
(OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 127/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,355,795.11
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 11/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ESCUELA TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	71,747.68
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 71,747.68
	IVA	\$ 11,479.62
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$ 83,227.30
C.M.I.C. DEL 0.2%	143.49	
I.C.I.C. DEL 0.2%	143.49	
D.I.F. DEL 0.2%	143.49	
SUMA	430.47	


RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,355,795.11
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,028,748.45
ESTA ESTIMACION	\$ 83,227.30
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,111,975.75
POR EJERCER	\$ 243,819.36

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	-
ACUMULADO ANTERIOR	
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.	0.2% IC.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,773.70	\$ 1,773.70	\$ 1,773.70
ESTA ESTIMACION	\$ 143.49	\$ 143.49	\$ 143.49
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,917.19	\$ 1,917.19	\$ 1,917.19

RECIBIMOS



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
CQS-120125-CA2

OBRA: CONSTRUCCION DE ESCUELA TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE
MUNICIPIO: COLONIA LADRILLENº. CONTRATO: 127/2016
ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
PERÍODO: 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

\$ 71,747.68


EXCEDENTES

\$ -

EXTRAORDINARIOS

\$ -

SUBTOTAL	71,747.68
I.V.A.	11,479.62
TOTAL	83,227.30



POR EL CONTRATISTA
ONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

POR EL RESIDENTE
ING. HUMBERTO CHAVEZ SALDIVAR



CONTRATISTA:

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO		IMPORTE	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	UM. ANTERIOR	OL. ESTIMADO	UNITARIO		
OBRA NORMAL									
2	AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS.								\$71,747.68
	HERRERIA								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA MARCA SCOVILL MODELO EIFEL- EIF MOD. US-26D CROMOMATE PARA USO RUDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$790.12		\$1,580.24
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL LISA DE 0.80 A 0.90 MTS DE ANCHO X 2.03 MTS DE ALTO, BATIENTE DE 1 1/2" DE ESPESOR Y ANTEPECHO COMPLEMENTO DE LA PUERTA A BASE DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4"X3", PIJAS Y TAQUETES, TOPE DE PISO, SELLADOR PLASTICO EN TODO EL PERIMETRO, 3 BISAGRAS DE LIBRO, GUARDAPOLVOS, SARDINEL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	5.00	4.45	0.00	4.45	\$2,617.94		\$11,649.83
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO NATURAL DE 2", FIJO- CORREDIZA SEGUN PLANO, FIJADA A MURO CON PIJA DE 1/4"X21/2" Y TAQUETE DE PLASTICO DE 3/8" A CADA 0.50 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 0.40 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL, INCLUYE: MOSQUITERO METALICO, SELLADO CON SILICON Y/O DOWNCORNING, PERFILADO DE MURO, RESANES Y VIDRIO CLARO DE 4 MM DE ESPESOR.	M2	20.67	20.40	0.00	20.40	\$1,904.83		\$38,858.53
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA EN VENTANERIA CON VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 15 CMS. Y METAL DESPLEGADO D20-18 CAL. 18 CON ROMBO DE 11X22 MM. INCLUYE SOLDADURA, MATERIAL, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA.	M2	20.67	20.40	0.00	20.40	\$963.68		\$19,659.07

OR EL CONTRATISTA


POR EL RESIDENTE
ING. HUMBERTO CHAVEZ SALDIVAR

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 1272016	TRAMO : COLONIA LADRILLEROS NORTE
OBRA : CONSTRUCCION DE ESCUELA TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S A DE C V

No DE ESTIMACION : 3 (TRES) PERIODO: 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
34	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA MARCA SCOVILL MODELO EIFEL- EIF MOD. US 26D CROMOMATE PARA USO RUDDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	2 PZAS
35	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL LISA DE 0.80 A 0.90 MTS DE ANCHO X 2.03 MTS DE ALTO, BATEANTE DE 1 1/2" DE ESPESOR Y ANTEPECHO COMPLETO DE LA PUERTA A BASE DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4"X3", PLAS Y TAQUETES, TOPE DE PISO, SELLADOR PLASTICO EN TODO EL PERIMETRO, 3 BISAGRAS DE LIBRO, GUARDAPOLVOS, SARDINEL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	(2.53) (.88) (2)=4.45 m2

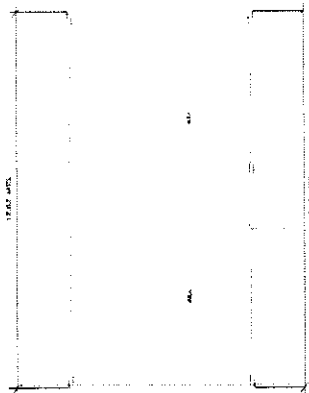CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	2 PZAS
	4.45m2


RESIDENTE



CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO	12/12/2016	TRAMO:	COLONIA LADRILLEROS NORTE
OBRA	CONSTRUCCION DE ESCUELA TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S A DE C V

Nº DE ESTIMACION: 3 (TRES) PERIODO: 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016




CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO NATURAL DE 2". FIJO. CORREDIZA SEGUN PLANO. FIJADA A MURO CON PLIA DE 1/4"x21/2" Y TAQUETE DE PLASTICO DE 3/8" A CADA 0.50 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 0.40 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL. INCLUYE: MOSQUITERO METALICO. SELLADO CON SILICON Y/O DOWNCORNING. PERFILADO DE MURO, RESANES Y VIDRIO CLARO DE 4 MM DE ESPESOR.	(2.9)(1.5)(2)=4.35 M2(AULAS)=8.7 M2 (3.9)(1.5)=5.85 M2(2 AULAS)=11.7 M2 8.7+11.7=20.4 M2
37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA EN VENTANERIA CON VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 15 CMS. Y METAL DESPLEGADO D20-18 CAL. 18 CON ROMBO DE 11X22 MM. INCLUYE SOLDADURA. MATERIAL. PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA.	(2.9)(1.5)(2)=4.35 M2(AULAS)=8.7 M2 (3.9)(1.5)=5.85 M2(2 AULAS)=11.7 M2 8.7+11.7=20.4 M2

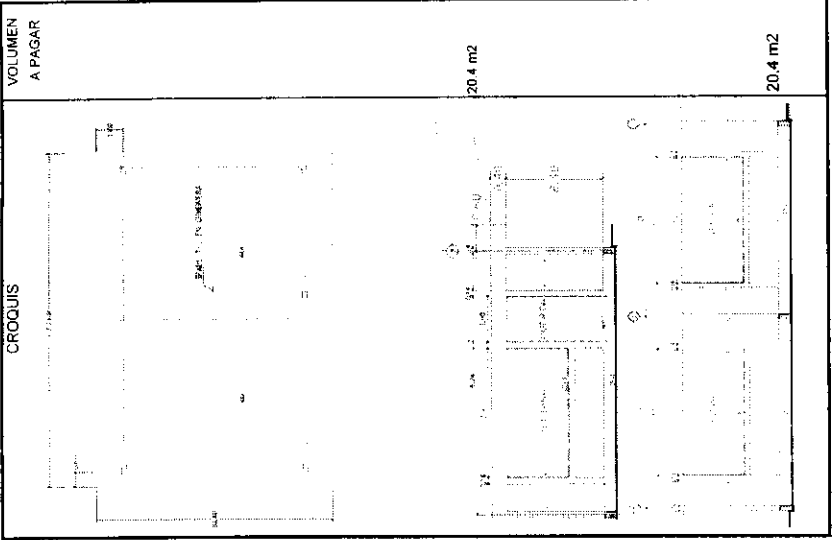

CONTRATISTA




RESIDENTE

FOTOGRAFIAS

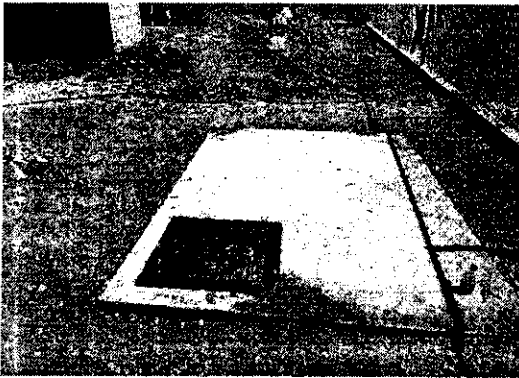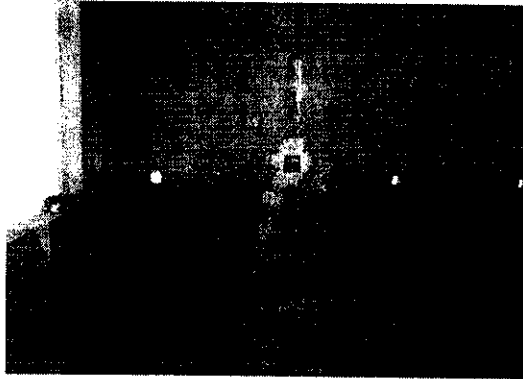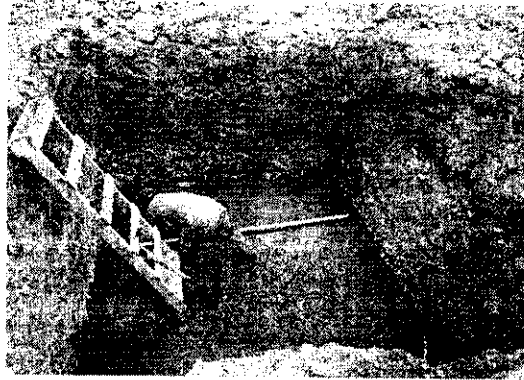

Handwritten signature and initials.

FOTOGRAFIAS

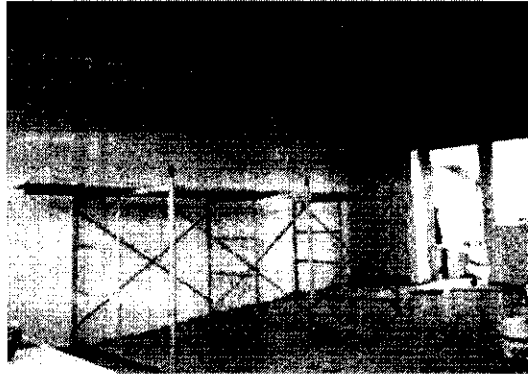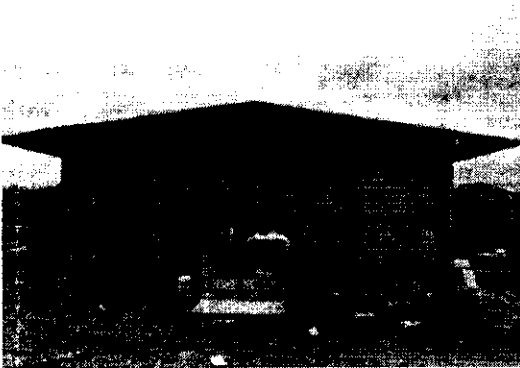

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.
