

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO590801MZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura N°: 89
FOLIO FISCAL (UUID):
1525DA1F-DEE0-4945-9129-F342CB641F83
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-08T12:40:25
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-08T12:35:25

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Fecha de Expedición: 08 marzo 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 99-Otros
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA ESTIMACIÓN NÚMERO 3 (TRES) SEGUN CONTRATO NUM. 128/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 1,665.16 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 3.33 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 3.33 D.I.F. DEL 0.2% \$ 3.33 SANCION POR RETENCIÓN DEL 1% \$ 820.12 SUMA \$ 830.11 NETO A RECIBIR \$ 1,101.47	\$ 1,665.16	\$ 1,665.16

IMPORTE CON LETRA: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 58/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,665.16
IVA (IVA 16.00%): \$ 266.42
TOTAL: \$ 1,931.58

SELLO DIGITAL DEL CFDI

uLpEtyCuEeRpGyX2*0/p+vsphZwSABXyUKny+ztXJrv66pPY4hds8Gbu0LhRFTGyGtJGltw4H53g36pXnDnFhwYduL36grOuI+vaYDj4V1+gN3KFnbDN0JuJucyglZaC9wTEFAM7kNwLTebag9K0WF7oleK4G+87/GM=


SELLO DIGITAL DEL SAT

EJpRvCvdrEptJWASyWp9hr+KSkcZTid9Y0+4pXvniTqe5YpZlmMwWic5VZlIn0cH4Sv3xe8uY2+MTN4ulzR6N4Lp7UcrVD7zP6UWlsuFROJohH0gNhiH+PqyVY80a1F8XF5QYscVzoDK11pRWisZ6q+Oc0bn9fuQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1||1525DA1F-DEE0-4945-9129-F342CB641F83(2017-03-08T12:40:25)QjuElyODEeRpGyX2*0/p+vsphZwSABXyUKny+ztXJrv66pPY4hds8Gbu0LhRFTGyGtJGltw4H53g36pXnDnFhwYduL36grOuI+vaYDj4V1+gN3KFnbDN0JuJucyglZaC9wTEFAM7kNwLTebag9K0WF7oleK4G+87/GM=|00601|v4m0G0203495276||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT




Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SAOO590801 MZZ	OSCAR SANDOVAL OCHOA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
1525DA1F-DEE0-4945-9129-F342CB641F83	2017-03-08T12:35:25	2017-03-08T12:40:25	FMD100205JN7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,931.58	Ingreso	Vigente	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL



CONTRATO

128/2016

IMPORTE CONTRATO \$93,117.50 CON IVA

CONTRATISTA
PERIODO DE EJECUCION
OBRA/SERVICIO

OSCAR SANDOVAL OCHOA
01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 x 2.5 EN EJIDO LA HACIENDITA

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$20,503.14 SIN IVA
\$20,503.14 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

FUERA DE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201609 DE

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO
INCISO B

IMPORTE FUERA DE PROGRAMA \$20,503.14
SANCION / RETENCION DEL 1.0%/MES \$205.03

NUMERO DE MESES DE RETRASO 4.00

IMPORTE DE SANCION \$820.12

IMPORTE DE REINTEGRO

ESTIMACION No.3 (PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016)

TOTAL \$820.12 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

REVISO:

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL

Ma. del Carmen Mendoza R.

Vo.Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 128/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 44,915.77 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: EJIDO LA HACIENDITA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,931.58 CON IVA
CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 19,200.55 CON IVA
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 21,132.13 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 1,588.51	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 76.65	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,665.16	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	3.33
0.2% I.C.I.C.	\$ 3.33
0.2% D.I.F.	\$ 3.33
SANCIÓN POR RETENCIÓN DEL 1% MES	820.12
SUMA DESCUENTOS	\$ 830.11

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 1,665.16
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 1,665.16
I.V.A.	\$ 266.42
TOTAL	\$ 1,931.58

(CON LETRA)

(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 830.11
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 1,101.47

AUTORIZO


ELABORO


ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ
 RESIDENTE D.O.P.M


ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
 CONTRATISTA


Vo. Bo.

REVISO


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
 SUBDIRECTOR DE
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL
 JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION
 SOCIAL

Vo. Bo.


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 DE FEBRERO DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)

ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 128/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 44,915.77
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 77/100 M.N.

CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA

\$ 1,931.58
COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,665.16

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 1,665.16

IVA \$ 266.42

TOTAL \$ 1,931.58

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 3.33

I.C.I.C. DEL 0.2% 3.33

D.I.F. DEL 0.2% 3.33

SANCIÓN POR RETENCIÓN DEL 1% MES 820.12

SUMA 830.11

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 44,915.77
\$ -
\$ 19,200.55
\$ 1,931.58
\$ 21,132.13
\$ 23,783.64

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C. 0.2% I.C.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 3.33	\$ 3.33	\$ 3.33
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3.33	\$ 3.33	\$ 3.33

RECIBIMOS

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SA00-590901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.6 MTS EN EUDO LA HACIENDITA

MUNICIPIO EUDO LA HACIENDITA CONTRATO: 128/2013

ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
	TECHUMBRE	1,588.51
		1,588.51
<u>EXCEDENTES</u>		
		76.65
<u>EXTRAS</u>		
		0.00
SUBTOTAL		1,665.16
I.V.A.		266.42
TOTAL		1,931.58

POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

CONTRATISTA:

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		

OBRA NORMAL

1,538.51

ALBAÑILERIA

1	1 Limpieza de terreno. Incluye: deshierbe y acarreo a 20 mts, la herramienta, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	11.1	6.11	11.100	\$ - 5.50 -\$	27.47
2	2 Trazo y Nivelacion del terreno. (Area de Edificios)	M2	6.64	4.87	6.640	\$ - 4.91 -\$	8.70
9	9 Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frías con volteador. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: el piso deberá colarse después de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelación, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso.	M2	3.3	3.30	0.000	\$ - 232.27 \$	766.49
23	23 Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm. Con concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.	M2	5.5	4.32	5.00	\$ - 532.55 -\$	362.13
26	26 Salida de agua fría en wc incluye: tuberías de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1	1.00	0.00	\$ - 814.92 \$	814.92
27	27 Salida de agua fría y salida agua caliente hidrosanitaria para lavabo incluye: tuberías de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno, incluye ventila, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1	1.00	0.00	\$ - 405.41 \$	405.41

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

Pag 1 de 2

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

CONTRATISTA:

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		

EXCEDENTES

9	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frías con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: el piso deberá colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelacion, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso.	M2	3.30	3.63	3.30	\$ 232.27	\$ 76.65
---	--	----	------	------	------	-----------	----------

EXTRAS

0.00

PO: EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016				
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA		CONTRATISTA:	ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
NO. DE ESTIMACIÓN:	3	PERIODO:	01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CLAVE	CONCEPTO		TOTAL	UNIDAD
1	Limpieza de terreno. Incluye: deshierbe y acarreo a 20 mts, la herramienta, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		6.105 Deductiva -4.995	M2
OPERACIONES ARITMETICAS				
Largo (L)		Ancho (A)	Área (L x A)	Unidad
3.7		1.65	6.105	m2

1. Limpieza de Terreno.

RESIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016									
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA			CONTRATISTA:		ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA		
NO. DE ESTIMACIÓN:		3		PERIODO:		01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
CLAVE		CONCEPTO			TOTAL		UNIDAD		
2		Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)			6.64		M2		
					Deductiva		-1.772		
OPERACIONES ARITMETICAS									
		Largo (L)		Área (L x A)		Unidad			
		2.95		1.65		4.87		m2	

2. Trazo y Nivelación.

RESIDENTE


CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016				
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA	CONTRATISTA:	ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	
NO. DE ESTIMACIÓN:	3	PERIODO:	01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CLAVE	CONCEPTO		TOTAL	UNIDAD
9	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frías con volteador, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: el piso debiera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelacion, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso.		3.63	M2

OPERACIONES ARITMETICAS

Largo (L) (entre ejes A y B)	Ancho (A) (entre ejes 1 y 2)	Área (L x A)	Unidad
1.65	2.2	3.63	m2

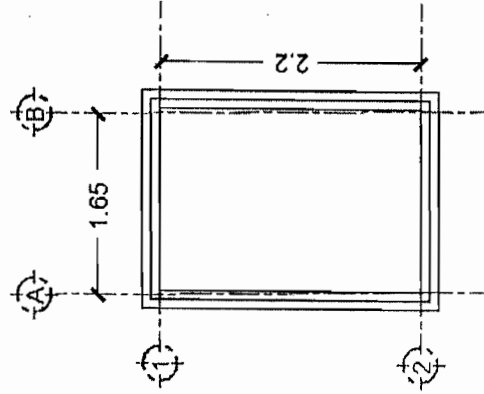

9. Piso de Concreto

RESIDENTE


CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016				
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA		CONTRATISTA:	ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
NO. DE ESTIMACIÓN:	3	PERIODO:	01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CLAVE	CONCEPTO		TOTAL	UNIDAD
23	Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm. Con concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.		4.32	m2
			Deductiva	
			-0.68	

OPERACIONES ARITMETICAS

Largo (L) (entre ejes A y B)	Ancho (A) (entre ejes 1 y 2)	Área (L x A)	Unidad
1.6	2.7	4.32	m ²

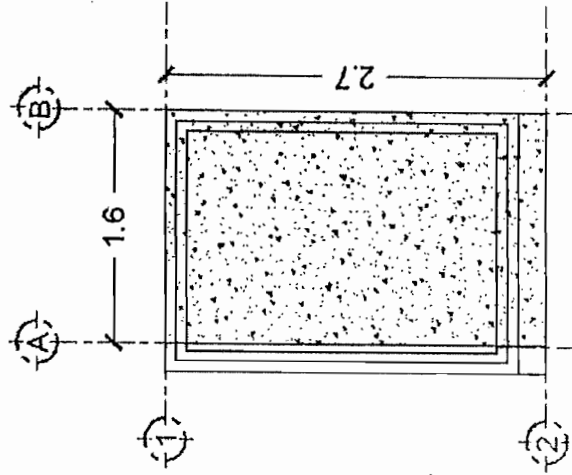

23. Losa de Concreto

[Firma]

RESIDENTE


[Firma]

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016				
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA		CONTRATISTA:	ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
NO. DE ESTIMACIÓN:	3	PERIODO:		01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CLAVE	CONCEPTO		TOTAL	UNIDAD
26	Salida de agua fria en wc incluye: tuberías de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra,excavaciones, relleno, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		1	Pza
OPERACIONES ARITMETICAS				
Salida		1	pza	



RESIDENTE


CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 128/2016				
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EIJO LA HACIENDITA		CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
NO. DE ESTIMACIÓN:		3		PERIODO: 01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CLAVE	CONCEPTO			TOTAL UNIDAD
27	Salida de agua fria y salida agua caliente hidrosanitaria para lavabo incluye: tuberías de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno, incluye ventila, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			1 Pza
OPERACIONES ARITMETICAS				
Salida		1	pza	


 RESIDENTE


 CONTRATISTA

