




Proveedor Autorizado de Certificación

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

[Handwritten signature]



SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO DIGITAL DEL SAT
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

IMPORTE CON LETRA: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 41/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 14,103.80
IVA(IVA 16.00%): \$ 2,256.60
TOTAL: \$ 16,360.41

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA. ESTIMACION NUMERO 2 SEGUN CONTRATO NUM. 129/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 14,103.80 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$28.20 I.C.I.C. DEL 0.2% \$28.20 D.I.F. DEL 0.2% \$28.20 SUMA \$84.60 NETO A RECIBIR \$16,275.81	\$ 14,103.80	\$ 14,103.80

[Handwritten signature]

CLIENTE:
RFC: MCI651010V22
DIRECCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros

Fecha de Expedición: 03 octubre 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCiaPago: NO IDENTIFICADO


OSCAR SANDOVAL OCHOA
SA00590801MAZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
COL. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 65
FOLIO FISCAL (UUID): C163A598-E1C4-4C18-B846-435835CB740C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-10-03T12:49:59
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2016-10-03T12:44:58

[Handwritten signatures and stamps]

Nombre o Razón Social del Receptor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Emisor
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	MCI651010V22	OSCAR SANDOVAL OCHOA	SA000590801MZZ
PAC que Certificó	Fecha Certificación SAT	Fecha de Expedición	Folio Fiscal
FMD100203JS7	2016-10-03T12:49:59	2016-10-03T12:44:58	C163A598-E1C4-4C18-B846-435835CB740C
Estado CFDI	Efecto del Comprobante	Ingreso	Total del CFDI
Vigente			\$16,360.41

Verificar CFDI




Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet




CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$16,360.41 CON IVA INCLUIDO

ACOMPANADA DE LOS NUMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASI COMO LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, PARA SU REVISION Y AUTORIZACION

ATENTAMENTE


ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

RÉCIBE


ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

RESUMEN DE ESTIMACION

DESCUENTOS	0.2% C.M.I.C.	28.20
	0.2% I.C.I.C.	28.20
	0.2% D.I.F.	28.20
SUMA DESCUENTOS	\$	84.60
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	14,103.81
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	14,103.81
I.V.A.	\$	2,256.60
TOTAL	\$	16,360.41

(CON LETRA)

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 41/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	84.60
SALDO NETO A RECIBIR	\$	16,275.81

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
 ING. RAMON DAVILA RAMOS ARMENTA
 Vo. Bo.

E INFRAESTRUCTURA
 SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
 ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
 Vo. Bo.

Jefe del Depto. CONSTRUCCION
 ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
 REVISO

CONTRATISTA
 ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
 ELABORO

RESIDENTE D.O.P.M
 ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ
 AUTORIZO

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 129/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 93,117.50 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.) NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 14,103.81
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO SUBTOTAL IVA TOTAL \$ 14,103.81 \$ 2,256.60 \$ 16,360.41

C.M.I.C. DEL 0.2% 28.20
I.C.I.C. DEL 0.2% 28.20
D.I.F. DEL 0.2% 28.20
SUMA 84.60

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.-CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

2.-AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

3.-RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR \$ -
ESTA ESTIMACION \$ 28.20
ACUMULADO ACTUAL \$ 28.20
0.2% D.I.F. 28.20
0.2% C.M.I.C. 28.20
0.2% I.C.I.C. 28.20

R E C I B I M O S

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOC-590901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA
HACIENDITA

MUNICIPIO: EJIDO LA HACIENDA; No. CONTRATO: 129/2016
ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

TECHUMBRE

13,941.40

13,941.40

EXCEDENTES

TECHUMBRE

162.41

162.41

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL

14,103.81

I.V.A.

2,256.60

TOTAL

16,360.41

FOR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

FOR EL RESIDENTE

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ DOMINGUEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA

MUNICIPIO: No. CONTRATO: 129/2016

ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA:

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	VOLUMENES CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
OBRA NORMAL								
TECHUMBRE								
20	Enrase a base de concreto f'c= 50 kg/cm2 altura promedio de 11 cms. Incluye trazo, cimbra, preparacion, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	12	8.00	0.00	8.00	\$ 24.54	\$ 196.32
21	Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm. Con concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curaíest o similar en calidad.	M2	26.4	25.20	0.00	25.20	\$ 532.55	\$ 13,420.26
23	Pretil de dos hiladas de ladrillo adobon de 6 x 12 x 24 cm. Asentado con mortero cemento-arena, aplanado con mortero cemento-arena 1:3 y chafan de mortero. Incluye: El suministro de los materiales, sus desperdicios, su elevacion a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y operacion.	ML	6.7	6.70	0.00	6.70	\$ 48.48	\$ 324.82
EXCEDENTES								
23	Pretil de dos hiladas de ladrillo adobon de 6 x 12 x 24 cm. Asentado con mortero cemento-arena, aplanado con mortero cemento-arena 1:3 y chafan de mortero. Incluye: El suministro de los materiales, sus desperdicios, su elevacion a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y operacion.	ML	6.70	10.05	6.70	3.35	\$ 48.48	\$ 162.41
162.41								

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

ING. LUIS CARLOS SANDOVAL DOMINGUEZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 129/2016															
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN ELIDO LA HACIENDITA		CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA													
NO. DE ESTIMACIÓN: 2		PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016													
CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD												
20	Enrase a base de concreto f'c= 50 kg/cm2 altura promedio de 11 cms, incluye trazo,cimbra, preparación, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8	ML												
OPERACIONES ARITMETICAS															
<table border="1"> <tr> <th>Ejes</th> <th>Largo</th> <th>Unidad</th> </tr> <tr> <td>A. Entre 1 y 2</td> <td>4</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>B. Entre 1 y 2</td> <td>4</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>8</td> <td>ml</td> </tr> </table>		Ejes	Largo	Unidad	A. Entre 1 y 2	4	ml	B. Entre 1 y 2	4	ml	Total	8	ml		
Ejes	Largo	Unidad													
A. Entre 1 y 2	4	ml													
B. Entre 1 y 2	4	ml													
Total	8	ml													
20. Enrase a base de Concreto															

RESIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 129/2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN ELJDO LA HACIENDITA


CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

NO. DE ESTIMACIÓN: 2 PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD
21	Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm. Con concreto premezclado y/o hecho en obra $f'c=200$ kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.	25.2	m2

OPERACIONES ARITMETICAS

Largo (L) (entre ejes A y B)	Ancho (A) (entre ejes 1 y 2)	Área (L x A)	Unidad
6	4.2	25.2	m2

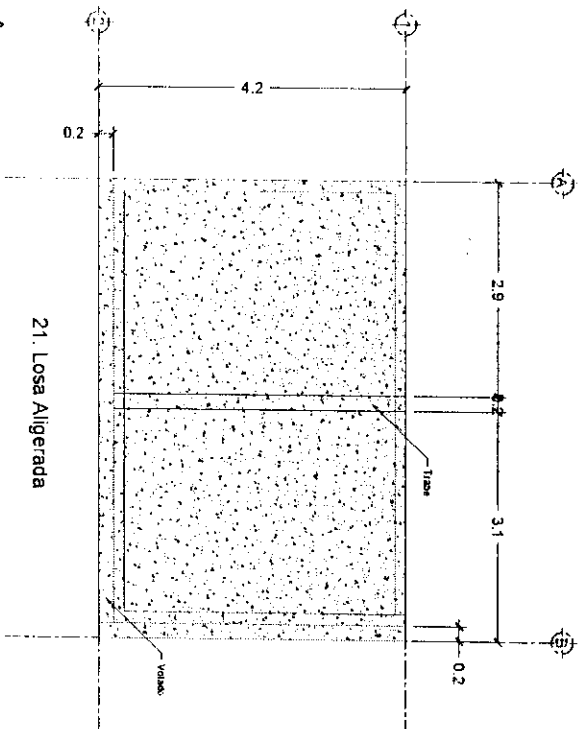

21. Losa Aligerada

RESIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 129/2016				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA		CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA		
NO. DE ESTIMACIÓN: 2		PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016		
CLAVE	CONCEPTO		TOTAL	UNIDAD
23	Pretil de dos hiladas de ladrillo adobon de 6 x 12 x 24 cm. Asentado con mortero cemento-atena, aplanado con mortero cemento-arena 1:3 y chafian de mortero. Incluye: El suministro de los materiales, sus desperdicios, su elevacion a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y operacion.		10.05	ML
OPERACIONES ARITMETICAS				
Ejes		Largo	Unidad	
1. Entre A y B		5.925	ml	
A. Entre 1 y 2		4.125	ml	
Total		10.05	ml	

23. Pretil

RESIDENTE

CONTRATISTA

