

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO590801MZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 90
FOLIO FISCAL (UUID):
6ADA17A4-13C4-4EEA-BF74-9E06F2F62E5B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-08T12:48:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-08T12:43:37

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Fecha de Expedición: 08 marzo 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 99-Otros
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA. ESTIMACIÓN NUMERO 3 (TRES) SEGÚN CONTRATO NUM. 129/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 2,137.50 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 4.27 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 4.27 D.I.F. DEL 0.2% \$ 4.27 SANCIÓN POR RETENCIÓN DEL 1% MES \$1,244.71 NETO A RECIBIR \$ 1,221.97	\$ 2,137.50	\$ 2,137.50

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 49/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 2,137.50
IVA(IVA 16.00%): \$ 341.99
TOTAL: \$ 2,479.49

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h+h2B4uqSsDspr+e+63T+9vUhhYpO2uBkict+PEX4wopBOZv3m1ndD9BEOicvIXoNTz9RyvGRtLJF7Op0QwL7Nv5F7nwpZRGWCFjvoQbHyEzOCHPmca0xL9QDky9wFVOYcB9AUnVihWZ/A9mS7kvtTGI0Y4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

+EIGFccpyLf+12JKsWERBUAaJvc6nUb3W8DRDE+Vx6Dkc+411+94DnaTnjuaFzyN4tKQrSx6ENxpbPXFspud2n3dO5SFQHTcCq5QQAWEZiQSP7L7v70R4R7YsoBwIDVKIFVYF79T3NqWScI3ZdZdoBANKO9FpahzP7L7L7p=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

h+h2B4uqSsDspr+e+63T+9vUhhYpO2uBkict+PEX4wopBOZv3m1ndD9BEOicvIXoNTz9RyvGRtLJF7Op0QwL7Nv5F7nwpZRGWCFjvoQbHyEzOCHPmca0xL9QDky9wFVOYcB9AUnVihWZ/A9mS7kvtTGI0Y4=|00010000000203495276|





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor


RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SAOO590801MZ2	OSCAR SANDOVAL OCHOA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
6ADA17A4-13C4-4EEA-BF74-9E06F2F62E5B	2017-03-08T12:43:37	2017-03-08T12:48:37	FMD100203JS7

Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI
\$2,479.49	ingreso	Vigente



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

129/2016

IMPORTE CONTRATO

\$93,117.50

CON IVA

CONTRATISTA
PERIODO DE EJECUCION
OBRA/SERVICIO

OSCAR SANDOVAL OCHOA
01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 EN EJIDO LA HACIENDITA

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$31,117.96 SIN IVA
SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$31,117.96 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO
INCISO B

IMPORTE FUERA
DE PROGRAMA
\$31,117.96

NUMERO DE
MESES DE
RETRASO
4.00

SANCION / RETENCION DEL
1.0%/MES
\$311.18

IMPORTE DE
SANCION
\$1,244.71

ESTIMACION No.3 (PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2016)

ELABORO:

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

TOTAL

\$1,244.71 SIN I.V.A.

Ma. del Socorro Mendoza R
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIOS

REVISO:

Vo.Bo.
Javier Villal
ING. JAVIER VILLAL REAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 129/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 93,117.50 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
UBICACIÓN: EJIDO LA HACIENDITA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 2,479.49 CON IVA
CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 54,541.18 CON IVA
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 57,020.67 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ (324.82)	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ (162.41)	
<u>EXTRAS</u>	\$ 2,624.72	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 2,137.50	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	4.27
0.2% I.C.I.C.	\$ 4.27
0.2% D.I.F.	\$ 4.27
SANCION POR RETENCION DEL 1.0% MES	1,244.71
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,257.52

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 2,137.50
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 2,137.50
I.V.A.	\$ 341.99
TOTAL	\$ 2,479.49

(CON LETRA)

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,257.52
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 1,221.97

AUTORIZO

ELABORO

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
CONTRATISTA

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL
JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE DICIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 1,234.78
(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 129/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 93,117.50 INCLUYE CONVENIO
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 2,137.50

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 2,137.50

IVA \$ 341.99

TOTAL \$ 2,479.49

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 4.27

I.C.I.C. DEL 0.2% 4.27

D.I.F. DEL 0.2% 4.27

SANCION POR RETENCION DEL 1.0% 1,244.71

SUMA 1,257.52

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 93,117.50
\$ -
\$ 54,541.18
\$ 2,479.49
\$ 57,020.67
\$ 36,096.83

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% I.C.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR \$ - \$ - \$ -
ESTA ESTIMACION \$ 4.27 \$ 4.27 \$ 4.27
ACUMULADO ACTUAL \$ 4.27 \$ 4.27 \$ 4.27

RECIBIMOS

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO-590901-MZ2

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 DE FEBRERO 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 129/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 93,117.50
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

\$ 1,234.78
COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO LA HACIENDITA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 2,137.50

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$

SUBTOTAL \$ 2,137.50

IVA \$ 341.99

TOTAL \$ 2,479.49

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 4.27

I.C.I.C. DEL 0.2% 4.27

D.I.F. DEL 0.2% 4.27

SANCION POR RETENCION DEL 1.0% 1,244.71

SUMA 1,257.52

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 93,117.50
\$ -
\$ 54,541.18
\$ 2,479.49
\$ 57,020.67
\$ 36,096.83

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% I.C.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR \$ - \$ - \$ -
ESTA ESTIMACION \$ 4.27 \$ 4.27 \$ 4.27
ACUMULADO ACTUAL \$ 4.27 \$ 4.27 \$ 4.27

RECIBIMOS

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO-590901-MZ2

CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
	TECHUMBRE	-324.82
		-324.82
<u>EXCEDENTES</u>		
	TECHUMBRE	-162.41
		-162.41
<u>EXTRAS</u>		
		2,624.72
SUBTOTAL		2,137.50
I.V.A.		341.99
TOTAL		2,479.49

POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

CONTRATISTA:

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

ESTIMACIÓN No. 3

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		

OBRA NORMAL

TECHUMBRE

23 Pretil de dos hiladas de ladrillo adobon de 6 x 12 x 24 cm.
Asentado con mortero cemento-atena, aplanado con
mortero cemento-arena 1:3 y chaflan de mortero. Incluye:
El suministro de los materiales, sus desperdicios, su
elevacion a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
operacion.

ML 6.7 -6.70 0.00 -6.70 \$ 48.48 -\$ 324.82

EXCEDENTES

23 Pretil de dos hiladas de ladrillo adobon de 6 x 12 x 24 cm.
Asentado con mortero cemento-atena, aplanado con
mortero cemento-arena 1:3 y chaflan de mortero. Incluye:
El suministro de los materiales, sus desperdicios, su
elevacion a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
operacion.

ML 6.70 10.05 6.70 -3.35 \$ 48.48 -\$ 162.41

EXTRAS

EXTRA-01 Trabe de concreto f'c=200kg/cm2 de 20x40 cms. Ahogada
en losa de 12 cms, armada con 5varillas de 1/2" y 2
varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cms promedio.
Incluye cimbrado, armado y colado.

ML 4.00 4.00 0.00 4.00 \$ 656.18 \$ 2,624.72

POR EL CONTRATISTA

POR EL PRESIDENTE

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

ING. LUIS CARLOS SALAZAR DOMINGUEZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 129/2016			
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA	
CONTRATISTA:		ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	
NO. DE ESTIMACIÓN:	3	PERIODO:	01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CLAVE	CONCEPTO		TOTAL UNIDAD
23	Pretil de dos hiladas de ladrillo adobon de 6 x 12 x 24 cm. Asentado con mortero cemento-atena, aplanado con mortero cemento-arena 1:3 y chaflan de mortero. Incluye: El suministro de los materiales, sus desperdicios, su elevacion a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y operacion.		-10.05 ML
OPERACIONES ARITMETICAS			
Ejes		Largo	Unidad
1. Entre A y B		5.925	ml
A. Entre 1 y 2		4.125	ml
Total		10.05	ml

Diagram showing a rectangular structure with dimensions 5.925 and 4.125. The structure is labeled '23. Pretil'.

CONTRATISTA


RESIDENTE

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 129/2016			
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN EJIDO LA HACIENDITA	
CONTRATISTA:		ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	
NO. DE ESTIMACIÓN:		3	PERIODO: 01 DE SEP. AL 31 DE DICIEMBRE 2016
CLAVE	CONCEPTO		TOTAL UNIDAD
EXTRA-01	Trabe de concreto f'c=200kg/cm2 de 20x40 cms. Ahogada en losa de 12 cms, armada con 5varillas de 1/2" y 2 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cms promedio. Incluye cimbrado, armado y colado.		4 ml



OPERACIONES ARITMETICAS


Ejes	Largo	Unidad
A. Entre 1 y 2	4	ml

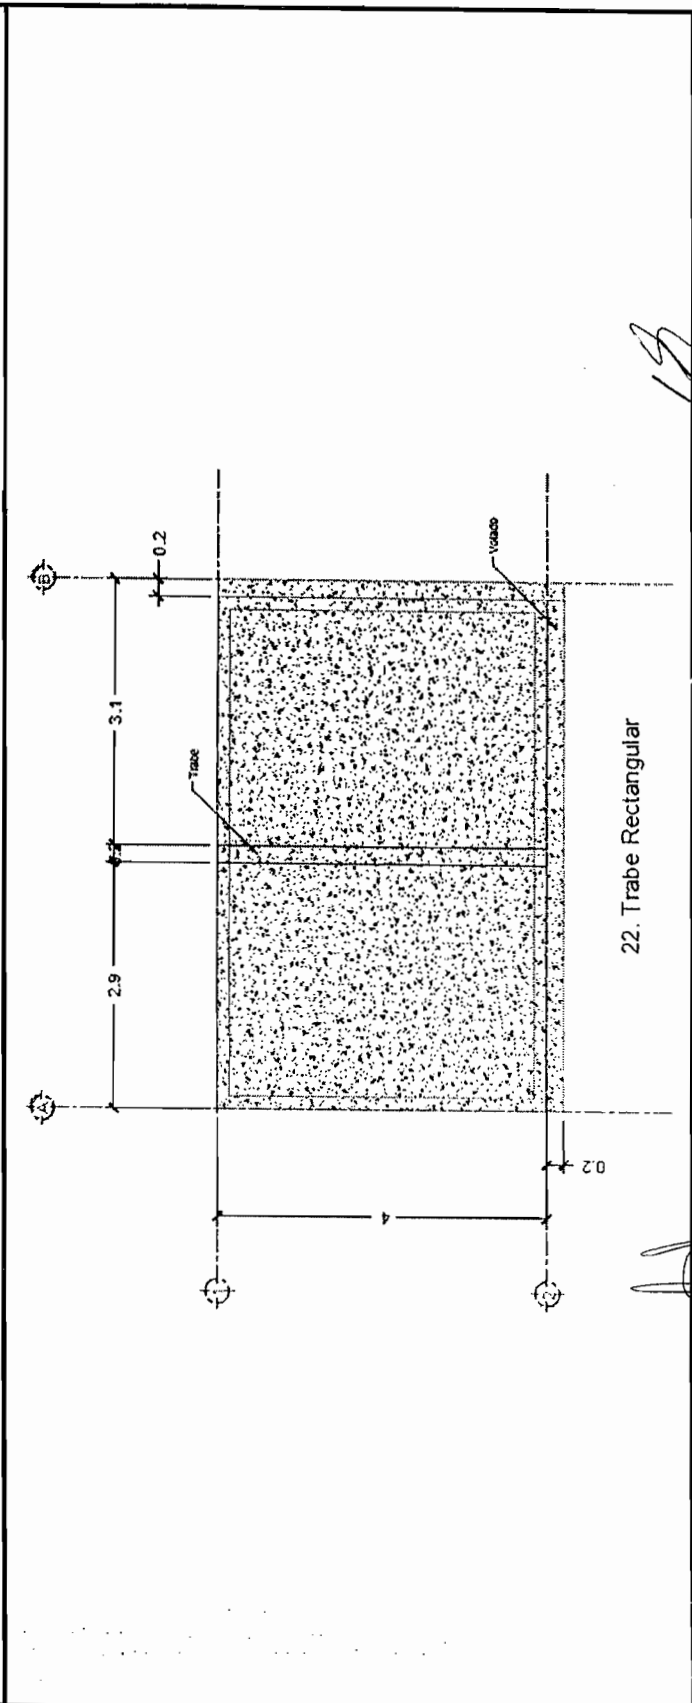




RESIDENTE

CONTRATISTA

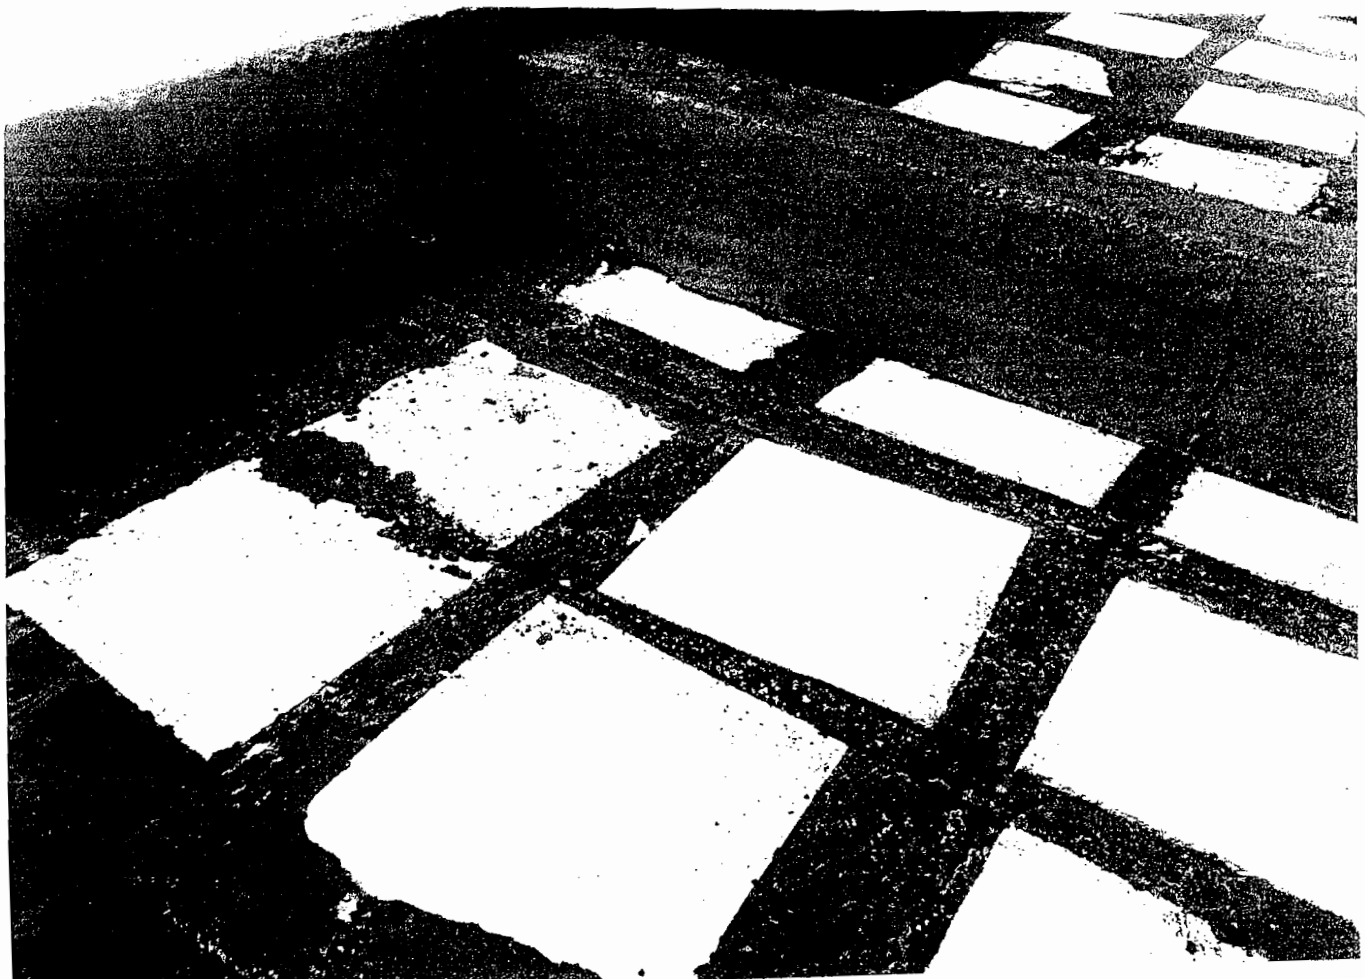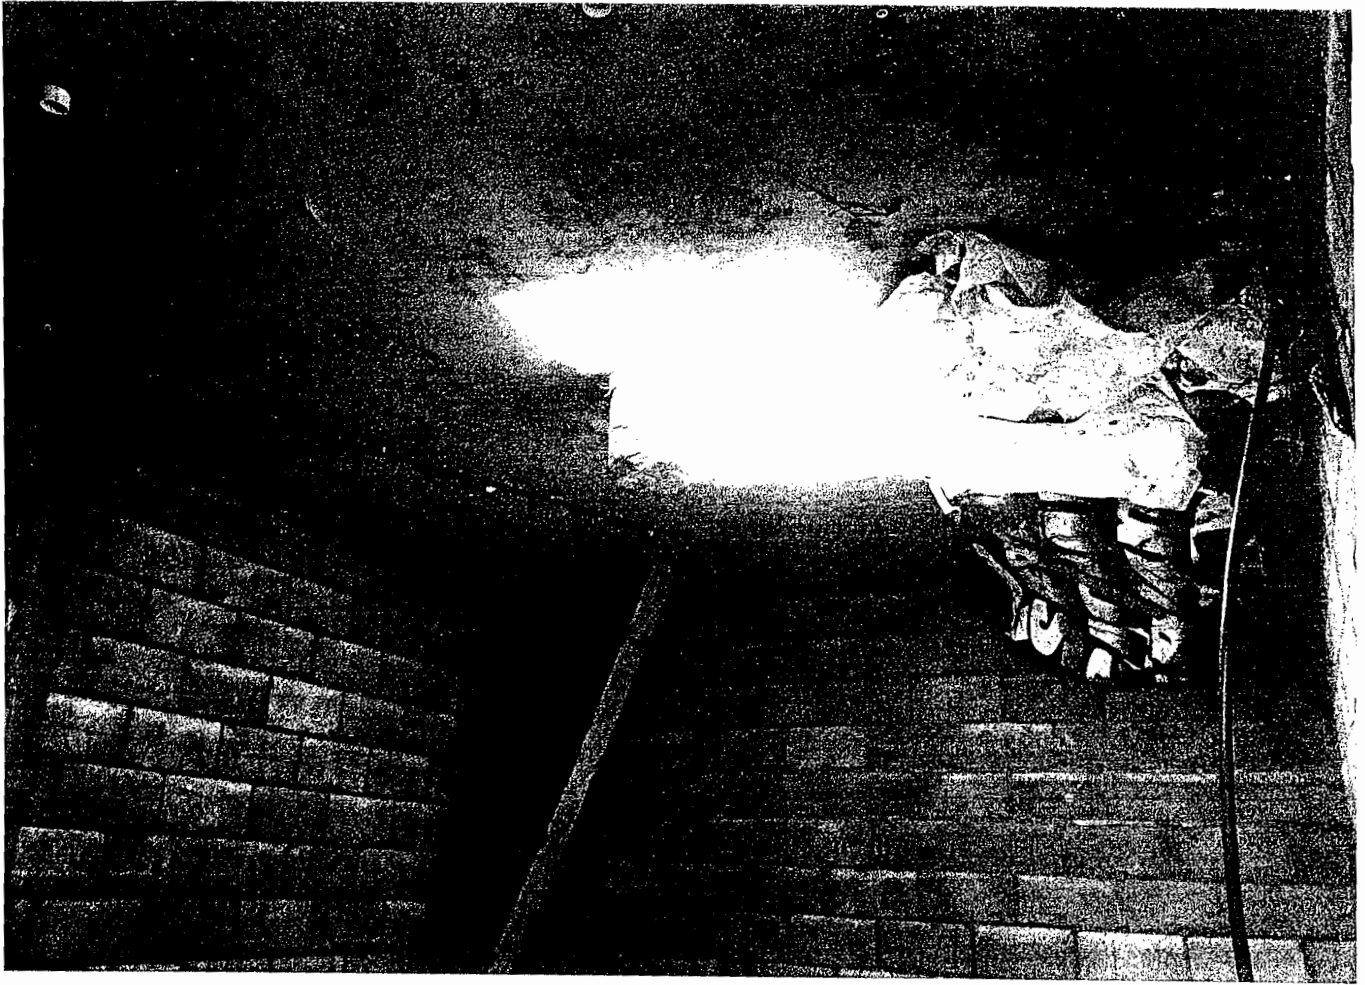

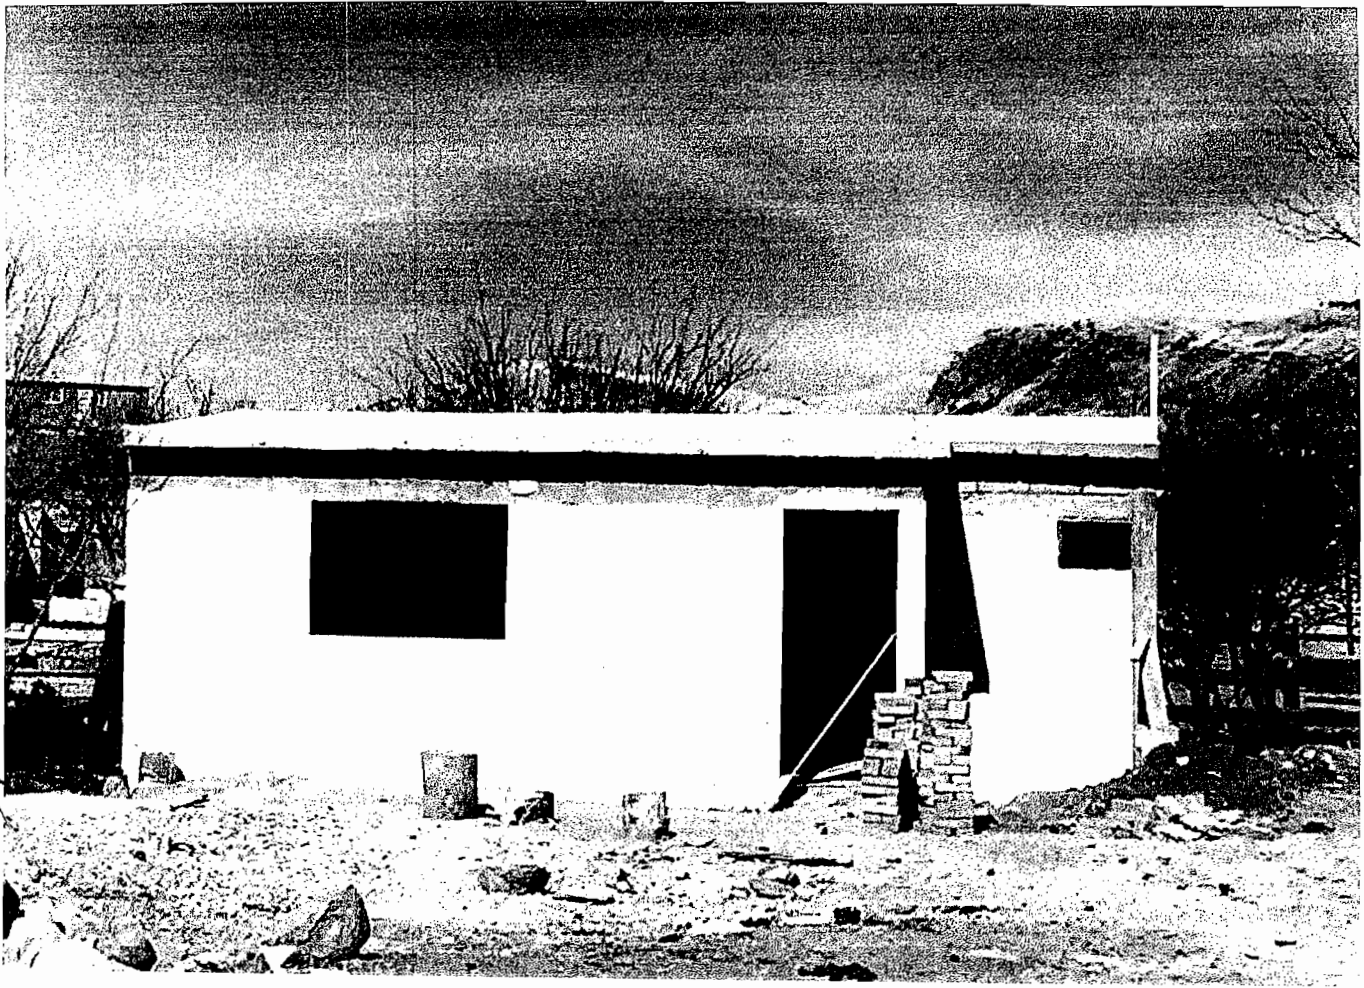

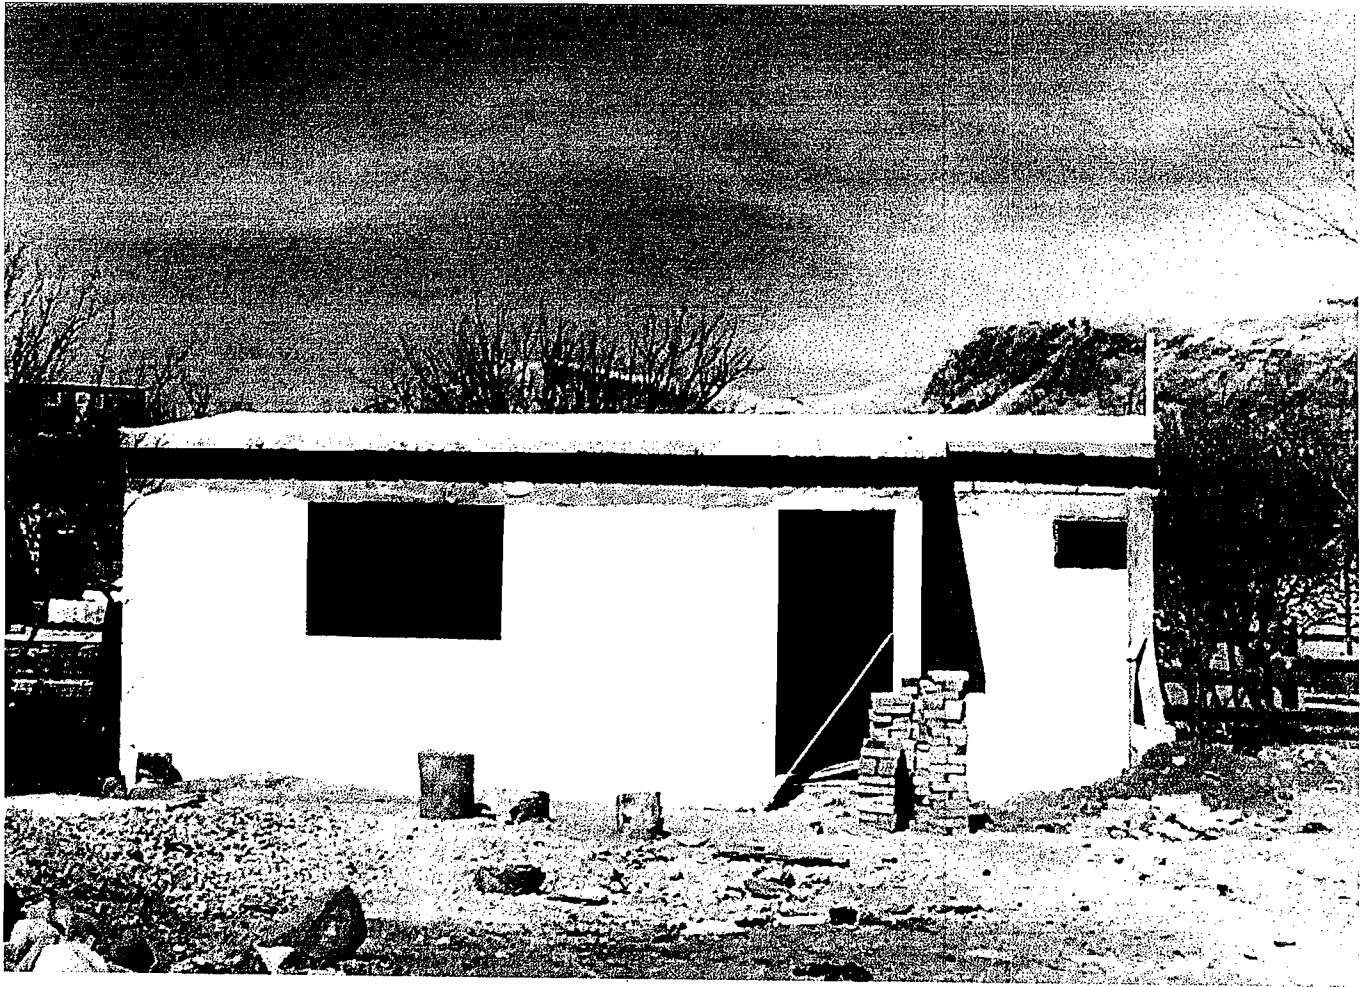

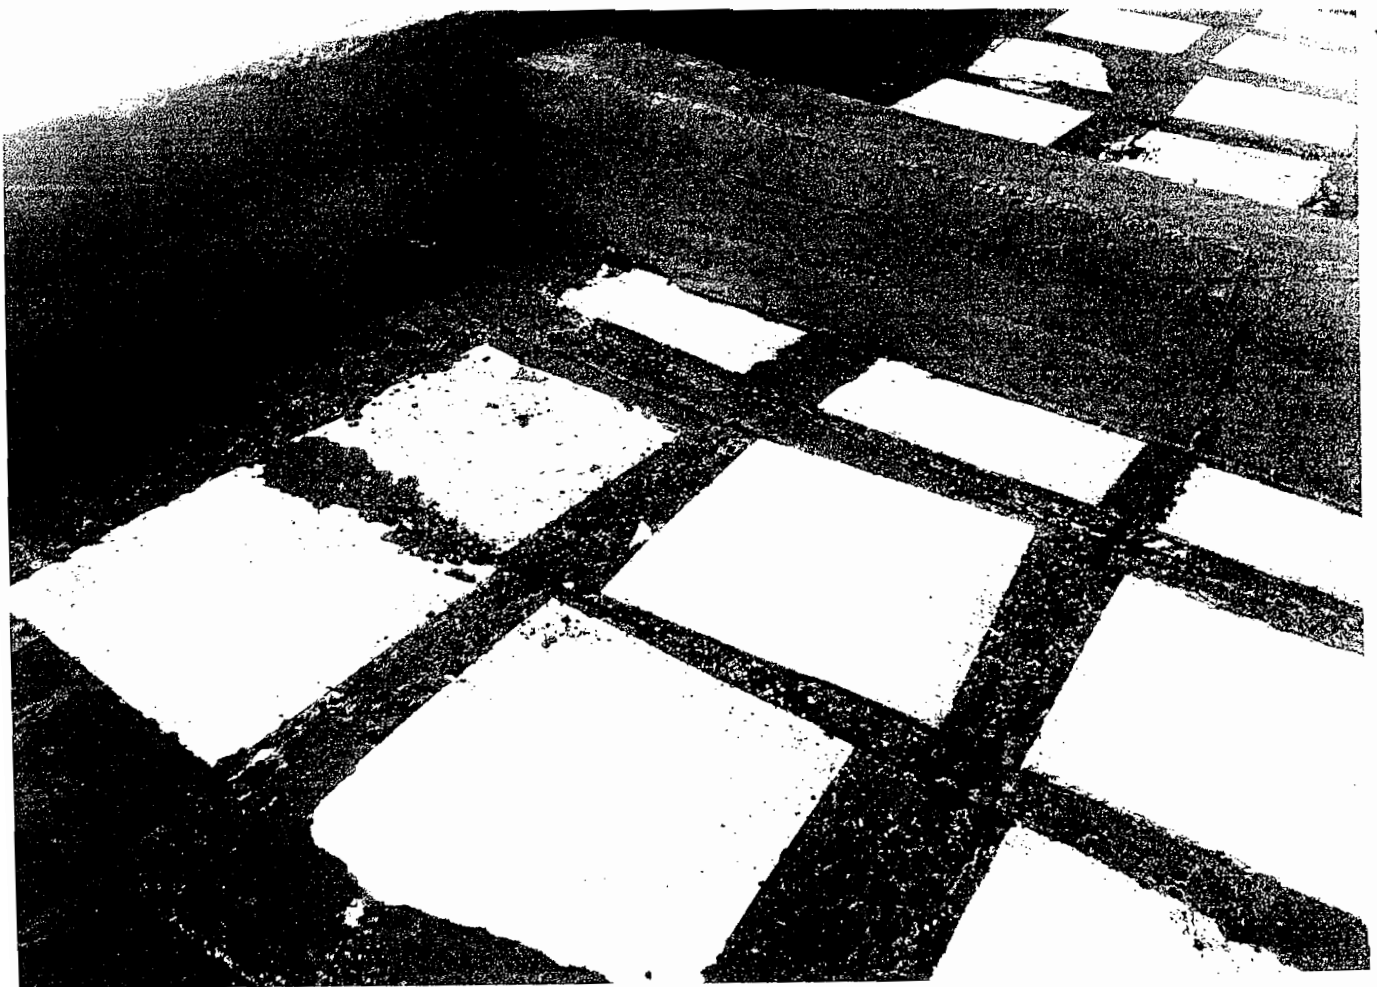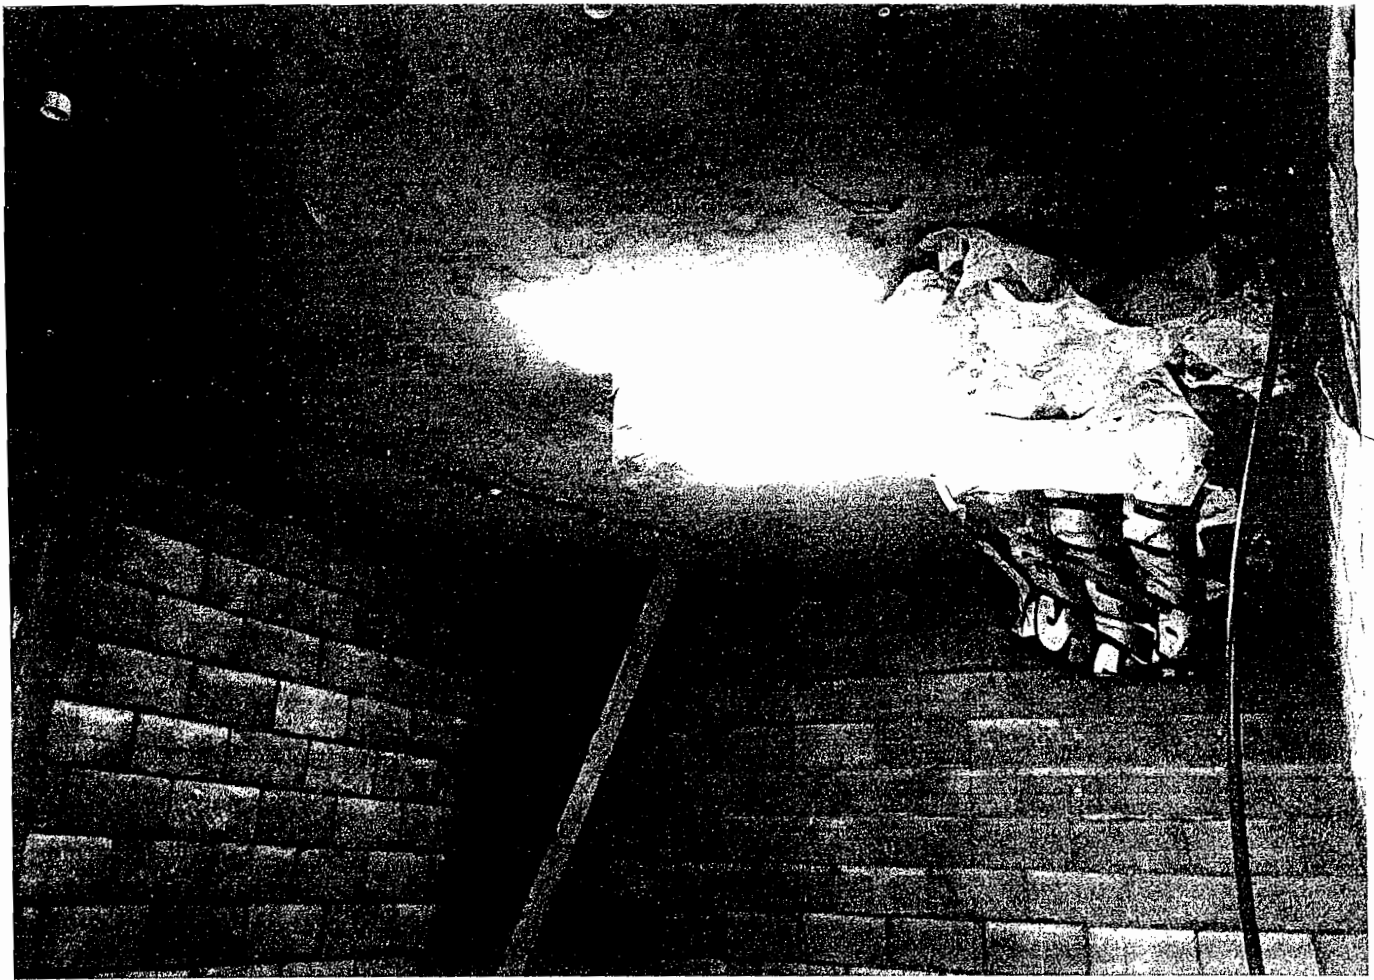



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL
OFICIO No CS/4501/2016


19 DE OCTUBRE DEL 2016

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
PRESENTE.-

Con relación a su solicitud mediante escrito S/N con fecha 17 de octubre del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN LOCALIDAD EJIDO LA HACIENDITA**, que al amparo del contrato No. **129/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXTRA-01	TRABE DE CONCRETO F'C=200 DE 20 X 40 CMS. AHOGADA EL LOSA 12 CMS., ARMADA CON 5 VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. PROMEDIO INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ML	\$656.18	\$656.18

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.C.P. ING. JAVIER VILLAREAL POSADA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
C.C.P. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION SOCIAL
C.C.P. ING. LUIS SALAZAR RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/CHCG/JVP/CMR/jlcc
