

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO590801M22
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 61

FOLIO FISCAL (UUID):

B68F1A26-EBB0-46DB-97DE-88D4C7CAEC42

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000304489099

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-10-03T12:19:52

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-10-03T12:14:52

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 03 octubre 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO ESTIMACIÓN NÚMERO 2 SEGÚN CONTRATO NUM. 130/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$8,432.03 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C DEL 0.2% \$16.86 I.C.I.C. DEL 0.2% \$16.86 D.I.F. DEL 0.2% \$16.86 SUMA \$50.58 NETO A RECIBIR \$9,730.57	\$ 8,432.03	\$ 8,432.03

IMPORTE CON LETRA: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 15/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 8,432.03
IVA(IVA 16.00%): \$ 1,349.12
TOTAL: \$ 9,781.15

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UuLCKjZLGRNkuaWkLxIdAplodtIS/CA20vBIMz1keKu4hpvrhaE+IZ53pD7yUbrCjWWTsjCMz5LepzKazhTOvCINbY3vU1zG8KH+cgYCU0f5v2PnsaaeyoqJFuqAobVXYeYJ0h1cM8B9W7k7LzH1Acws9nm0mc+

SELLO DIGITAL DEL SAT

NJa971sRO1JAP2UR8ZKHwBTmcmLJ1xespjUpXNaq1Xabd+WqVdwxJqVW+YeSH1HRzmV4szJf06xAzzLWYlbgG+QzFFAvqLW8LDm9/FWISH00wthaV5q9yktzXJb2P0y57uPnGuaBYJAV5JB8R02189g+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

g11yB8n8F1A26-EBB0-46DB-97DE-88D4C7CAEC422016-10-03T12:19:52jZLGRNkuaWkLxIdAplodtIS/CA20vBIMz1keKu4hpvrhaE+IZ53pD7yUbrCjWWTsjCMz5LepzKazhTOvCINbY3vU1zG8KH+cgYCU0f5v2PnsaaeyoqJFuqAobVXYeYJ0h1cM8B9W7k7LzH1Acws9nm0mc-[00001000000203495276]



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 0000000000





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SAOO590801MZ2	OSCAR SANDOVAL OCHOA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
B68F1A26-EBB0-46DB-97DE-88D4C7CAEC42	2016-10-03T12:14:52	2016-10-03T12:19:52	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$9,781.15	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 130/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 44,915.77 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	
UBICACIÓN: EJIDO NUEVO SACRAMENTO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 9,781.15 CON IVA
CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 7,887.21 CON IVA
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 17,668.36 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 8,372.69	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 59.34	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 8,432.03	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.		16.86
0.2% I.C.I.C.	\$	16.86
0.2% D.I.F.	\$	16.86
SUMA DESCUENTOS	\$	50.58
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	8,432.03
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	8,432.03
I.V.A.	\$	1,349.12
TOTAL	\$	9,781.15
(CON LETRA)		
(NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	50.58
SALDO NETO A RECIBIR	\$	9,730.57

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ORTIZ RESIDENTE D.O.P.M	ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N.)

ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 130/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 44,915.77
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 77/100 M.N.

CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO

\$ 9,730.57
COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 8,432.03

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 8,432.03

IVA \$ 1,349.12

TOTAL \$ 9,781.15

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	16.86
I.C.I.C. DEL 0.2%	16.86
D.I.F. DEL 0.2%	16.86
SUMA	50.58

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	44,915.77
\$	-
\$	7,887.21
\$	9,781.15
\$	17,668.36
\$	27,247.41

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% IC.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	-	\$	-	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	16.86	\$	16.86	\$	16.86
ACUMULADO ACTUAL	\$	16.86	\$	16.86	\$	16.86

R E C I B I M O S

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAO-590901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO NUEVO
SACRAMENTO

MUNICIPIO: EJIDO LA HACIENDA No. CONTRATO: 130/2016

ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

8,372.69

ALBAÑILERIA

8,372.69

EXCEDENTES

59.34

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL

8,432.03

I.V.A.

1,349.12

TOTAL

9,781.15

POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. RODOLFO ORTIZ

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO	UNITARIO		
<u>OBRA NORMAL</u>								\$	8,372.69
<u>ALBAÑILERIA</u>								\$	8,372.69
10	Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 M.M. (3/4") H. en O., de 15 x 15 cms., Armada con armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	15.36	14.70	0.00	14.70	\$ 164.97	\$	2,425.06
11	Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 , Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correctas ejecución.	M2	20.32	17.19	0.00	17.19	\$ 253.94	\$	4,365.23
12	Dala de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4") H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriaes y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8	8.00	0.00	8.00	\$ 197.80	\$	1,582.40
<u>EXCEDENTES</u>									59.34
12	Dala de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4") H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriaes y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8	8.30	8.00	0.30	\$ 197.80	\$	59.34

EXTRAS

POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. ROBERTO ORTIZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 130/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

NO. DE ESTIMACIÓN: 2 PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD
10	Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 M.M. (3/4") H. en O., de 15 x 15 cms., Armada con armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	14.7	ML

OPERACIONES ARITMETICAS

	Altura (A)	Piezas (P)	Longitud (A x P)	Unidad
Cimentación	0.42	5	2.1	ml
Muros	2.1	5	10.5	ml
Enrase	0.42	5	2.1	ml
Total			14.7	ml

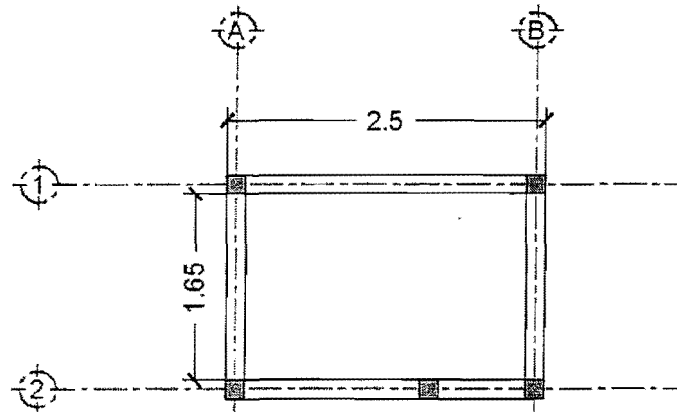

10. Castillo de Concreto

RESIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 130/2016


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

NO. DE ESTIMACIÓN: 2 PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD
11	Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 , Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	17.19	M2

OPERACIONES ARITMETICAS


Ejes	Largo (L)	Castillo (C)	Ventana (V)	Puerta (P)	L - C	Altura Muro (M)	Altura Enrase (E)	Área $\{(L-C) \times (M+E) - (V+P)\}$	Unidad
1. Entre A y B	2.2	0	0	0	2.2	2.1	0.42	5.54	m2
A. Entre 1 y 2	1.65	0	0.24	0	1.65	2.1	0.42	3.92	m2
2. Entre A y B	2.2	0.15	0	1.6	2.05	2.1	0.42	3.57	m2
B. Entre 1 y 2	1.65	0	0	0	1.65	2.1	0.42	4.16	m2
Total								17.19	m2

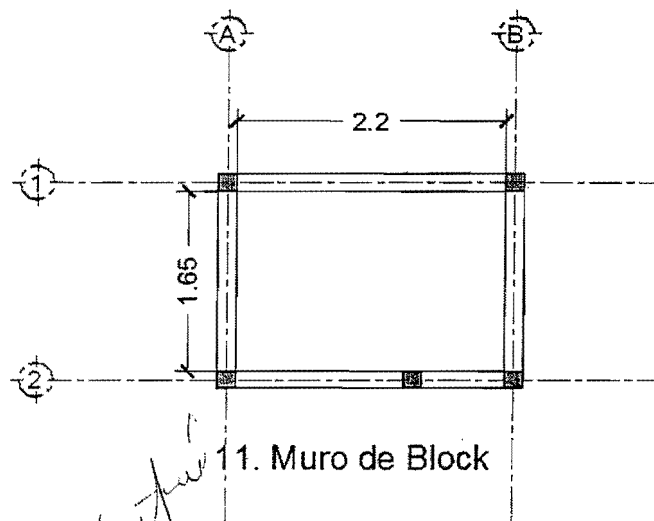

RESIDENTE



CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

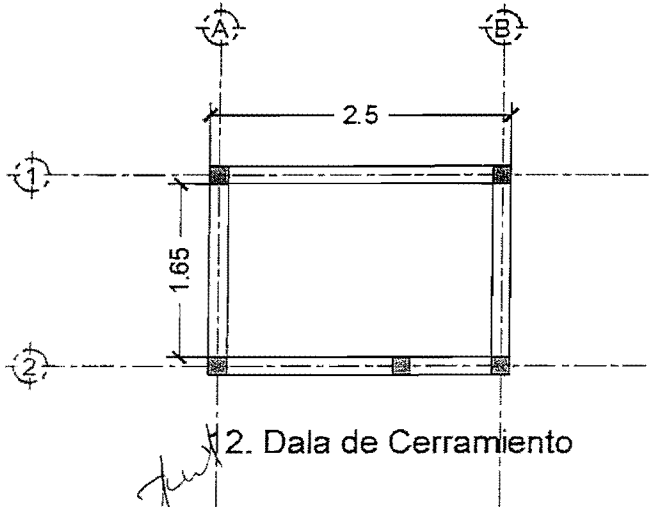CONTRATO: 130/2016				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA				
NO. DE ESTIMACIÓN: 2			PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	
CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD	
12	Dala de cerramiento de concreto $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ T.M.A: 19 MIM (3/4") H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriaes y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	8.3	ML	
OPERACIONES ARITMETICAS				
		Ejes	Largo	Unidad
		1. Entre A y B	2.5	ml
		A. Entre 1 y 2	1.65	ml
		2. Entre A y B	2.5	ml
		B. Entre 1 y 2	1.65	ml
		Total	8.3	ml
 2. Dala de Cerramiento				

RESIDENTE

CONTRATISTA

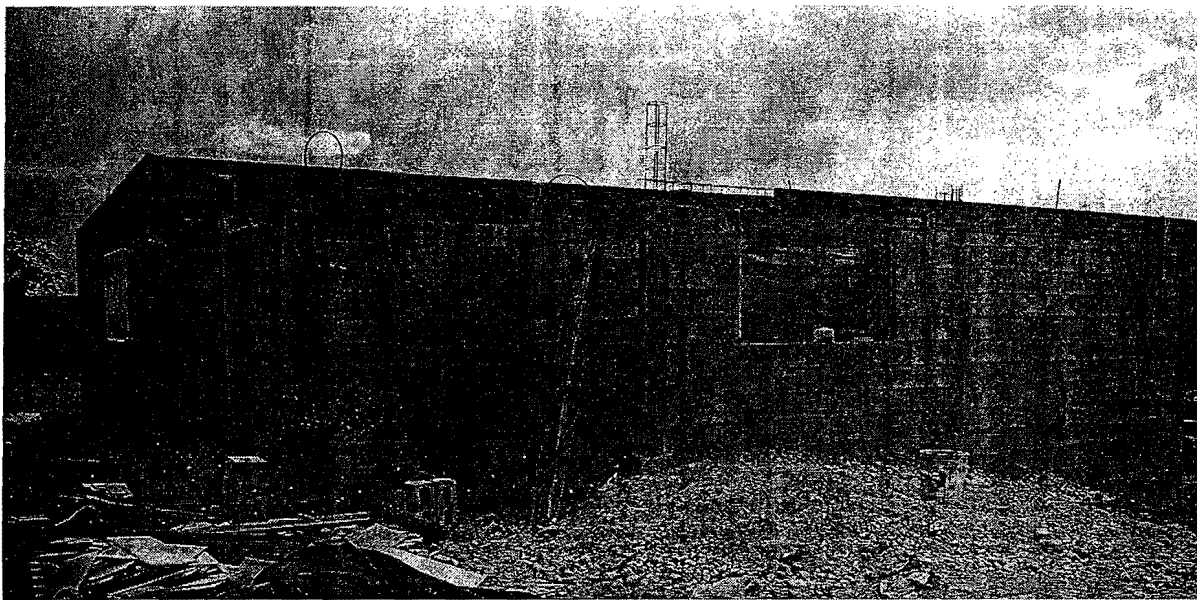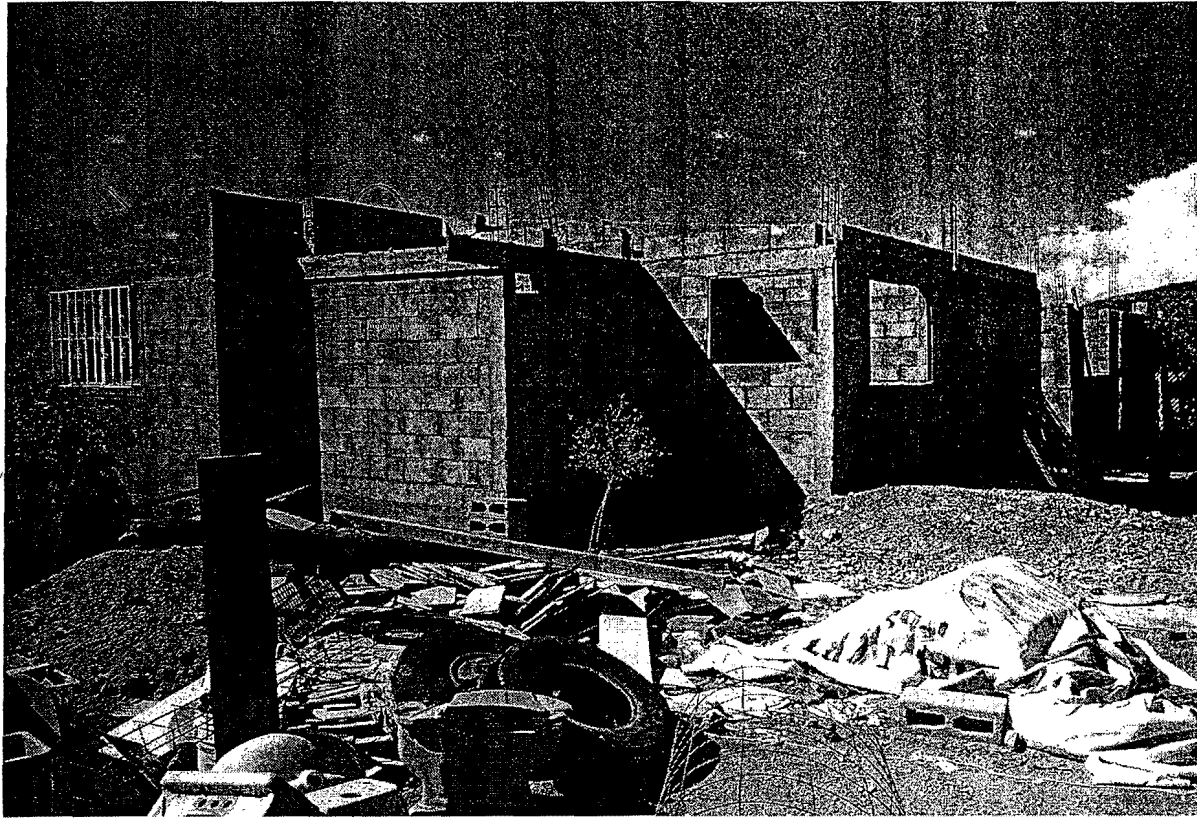

Reflected
