

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO590801MZZ
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 87
FOLIO FISCAL (UUID):
9F37F506-A90E-4257-9D99-5D90CC4F2D87
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-08T12:07:56
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-08T12:02:55

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Fecha de Expedición: 08 marzo 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 99-Otros
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO ESTIMACIÓN NÚMERO 3 (TRES) SEGÚN CONTRATO NUM. 131/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 17,910.63 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 35.82 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 35.82 D.I.F. DEL 0.2% \$ 35.82 SANCIÓN POR RETENCIÓN DEL 1% MES \$1,002.43 SUMA \$1,109.89 NETO A RECIBIR \$ 19,666.44	\$ 17,910.63	\$ 17,910.63

IMPORTE CON LETRA: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 33/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 17,910.63
IVA(IVA 16.00%): \$ 2,865.70
TOTAL: \$ 20,776.33

SELLO DIGITAL DEL CFDI

37F506-A90E-4257-9D99-5D90CC4F2D872017-03-08T12:07:56MCI651010V22MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SELLO DIGITAL DEL SAT

9F37F506-A90E-4257-9D99-5D90CC4F2D872017-03-08T12:02:550000100000020349527600001000000304489099

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

9F37F506-A90E-4257-9D99-5D90CC4F2D872017-03-08T12:07:56MCI651010V22MUNICIPIO DE CHIHUAHUA9F37F506-A90E-4257-9D99-5D90CC4F2D872017-03-08T12:02:550000100000020349527600001000000304489099





Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SAOO590801MZ2	OSCAR SANDOVAL OCHOA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHILITLÁN
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificado
9F37F506-A90E-4257-9D99-5D90CC4F2D87	2017-03-08T12:02:55	2017-03-08T12:07:56	FMD100203J57
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$20,776.33	ingreso	Vigente	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

13/1/2016

IMPORTE CONTRATO \$93,117.50 CON IVA

CONTRATISTA
PERIODO DE EJECUCION
OBRASERVICIO

OSCAR SANDOVAL OCHOA
1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4x6 EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$25,060.77 SIN IVA
SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$25,060.77 SIN IVA FUERA DE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO
INCISO B

IMPORTE FUERA
DE PROGRAMA \$25,060.77

NUMERO DE
MESES DE
RETRASO 4.00

IMPORTE DE
SANCION \$1,002.43

ESTIMACION No.3 (PERIODO 1 SEPTIEMBRE AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2016)

TOTAL \$1,002.43 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. RODOLFO PORTIZ

REVISO:

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

Va.Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 131/2016 ✓	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO ✓	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 93,117.50 CON IVA ✓
	PERÍODO EJEC. 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: EJIDO NUEVO SACRAMENTO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 20,776.33 CON IVA ✓
CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	43,270.68 CON IVA ✓
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 64,047.01 CON IVA ✓

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 15,056.25	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 2,854.38	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 17,910.63 ✓	

--

DESCUENTOS	
0.2% C.M.I.C.	35.82
0.2% I.C.I.C.	\$ 35.82
0.2% D.I.F.	\$ 35.82
SANCION POR RETENCION DEL 1% I	1,002.43
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,109.89
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 17,910.63
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 17,910.63
I.V.A.	\$ 2,865.70
TOTAL	\$ 20,776.33
(CON LETRA)	
(VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 1,109.89
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 19,666.44

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ORTIZ	C. OSCAR SANDOVAL OCHOA
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL
SUBDIRECTOR DE	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 DE FEBRERO DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 19,666.44
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 131/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 93,117.50
0.00 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 17,910.63

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

	SUBTOTAL	\$ 17,910.63
	IVA	\$ 2,865.70
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$ 20,776.33

C.M.I.C. DEL 0.2%	35.82
I.C.I.C. DEL 0.2%	35.82
D.I.F. DEL 0.2%	35.82
SANCION POR RETENCION DEL 1% MES	1,002.43
SUMA	1,109.89

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 93,117.50
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 43,270.68
ESTA ESTIMACION	\$ 20,776.33
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 64,047.01
POR EJERCER	\$ 29,070.49

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	
ESTA ESTIMACION	\$ 0.01
ACUMULADO ACTUAL	\$ 0.01
POR AMORTIZAR	\$ (0.01)

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% IC.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 35.82	\$ 35.82	\$ 35.82
ACUMULADO ACTUAL	\$ 35.82	\$ 35.82	\$ 35.82

R E C I B I M O S

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SA00-590901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 NTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO

MUNICIPIO: EJIDO NUEVO SACRA No. CONTRATO: 131/2016

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
		15,056.25
<u>EXCEDENTES</u>		
		0.00
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>		
		2,854.38
SUBTOTAL		17,910.63
I.V.A.		2,865.70
TOTAL		20,776.33

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

ING. RODOLFO ORTIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO
SACRAMENTO

MUNICIPIO: No. CONTRATO: 131/2016


ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

CONTRATISTA:

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	JUM. ANTERIOR		
<u>OBRA NORMAL</u>							
11	Muro de block de concreto 15x20x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, incluye el suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2			0.00	-1.05 ✓	\$253.94
18	Enjarre exterior a base de Stuco en muros color blanco con previa preparación de superficie donde se aplica. Incluye: plomo, perfiles y todo y todo lo necesario para su correcta ejecución (Enjarre del rodapié debe ser aplanado)	M2	11.78	14.03	0	14.03 \$	73.74 ✓
21	Losa cubierta de 12 cms de espesor aligerada con casetón de poliestireno de 40x40x7 cms con concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero #3 a 10 cms en ambos sentidos. Inc. Cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.	M2	28.44	26.83	0.00	26.83 ✓	\$532.55
							\$0.00
<u>EXCEDENTES</u>							
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>							
EXT-01	TRABE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AHOGADA EN LOSA DE 12 CMS. ARMADA CON 5 VARS. DE 1/2" Y 2 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. PROMEDIO. INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ML	4.40	4.35	0.00	4.35 ✓	\$656.18
							\$2,854.38

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL PRESIDENTE

ING. RODOLFO ORTIZ

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO : 131/2016	TRAMO:	EJIDO NUEVO SACRAMENTO
OBRA : Construccion de cuarto completo de 6 x 4 mts. En ejido Nuevo Sacramento	CONTRATISTA:	C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

No DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
-------------------	----------	--

CLAVE	21 CONCEPTO	Losa de cubierta de 12 cm de espesor. Aligerada con caseton de polipropilenoexpandido de 40x40x7 cm. Con concreto premexclado y/o hecho en obra fc=200 kg/cm2 armada con 2 varillas de acero # 3 a 10 cm. En ambos sentidos. Incluye simbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, Colado y curado de concreto con curafest rojo de Fester o similar en calidad.
-------	-------------	---

OPERACIONES ARITMETICAS			
largo	ancho	area	unidad
6.00	4.55	27.3	m2
1.95	0.20	0.39	m2

SUBTOTAL		27.69	m2
TRABE		0.86	m2
TOTAL		26.83	m2
MENOS TRABE	0.20	4.30	0.86

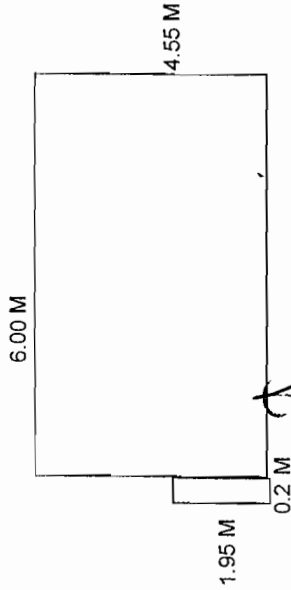

RESIDENTE

CONTRATISTA


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 131/2016	TRAMO: EJIDO NUEVO SACRAMENTO
OBRA : Contrucción de cuarto completo de 6 x 4 mts. En ejido Nuevo Sacramento	CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

Nº DE ESTIMACION: 3 (TRES)	PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
----------------------------	--

CLAVE	22 CONCEPTO	Sobre armado para trabe rectangular integral plana de 40x12 cms. Colada al centro del claro largo de 6 mts. Armada con acero 1y=4200 kg/cm2 con 7 varillas 3/8" y estribos de 1/4 @20cms inc. Traslapes, cruces, desperdicios, alambre recocido, habilitado del armado, elevación y colocación.
-------	-------------	---

OPERACIONES ARITMETICAS			
largo	ancho	area	unidad
4.35	0.40	1.74	ML



LARGO 4.35

RESIDENTE *[Signature]*

CONTRATISTA *[Signature]*


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 131/2016	TRAMO: EJIDO NUEVO SACRAMENTO
OBRA : Contrucción de cuarto completo de 6 x 4 mts. En ejido Nuevo Sacramento	CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

Nº DE ESTIMACION: 3 (TRES)	PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
----------------------------	--



CONCEPTO	Recubrimiento exterior a base de Stuco en muros color blanco, incluye la preparación previa de la superficie donde se va a aplicar, el suministro de los materiales y sus desperdicios, recortes, acarreos, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución
----------	---



OPERACIONES ARITMETICAS			
largo	ancho	area	unidad
6.00	2.60	15.60	m2
Menos ventana 1.50m x 1.05 m		1.575	m2
Total		14.03	m2



RESIDENTE 

CONTRATISTA 

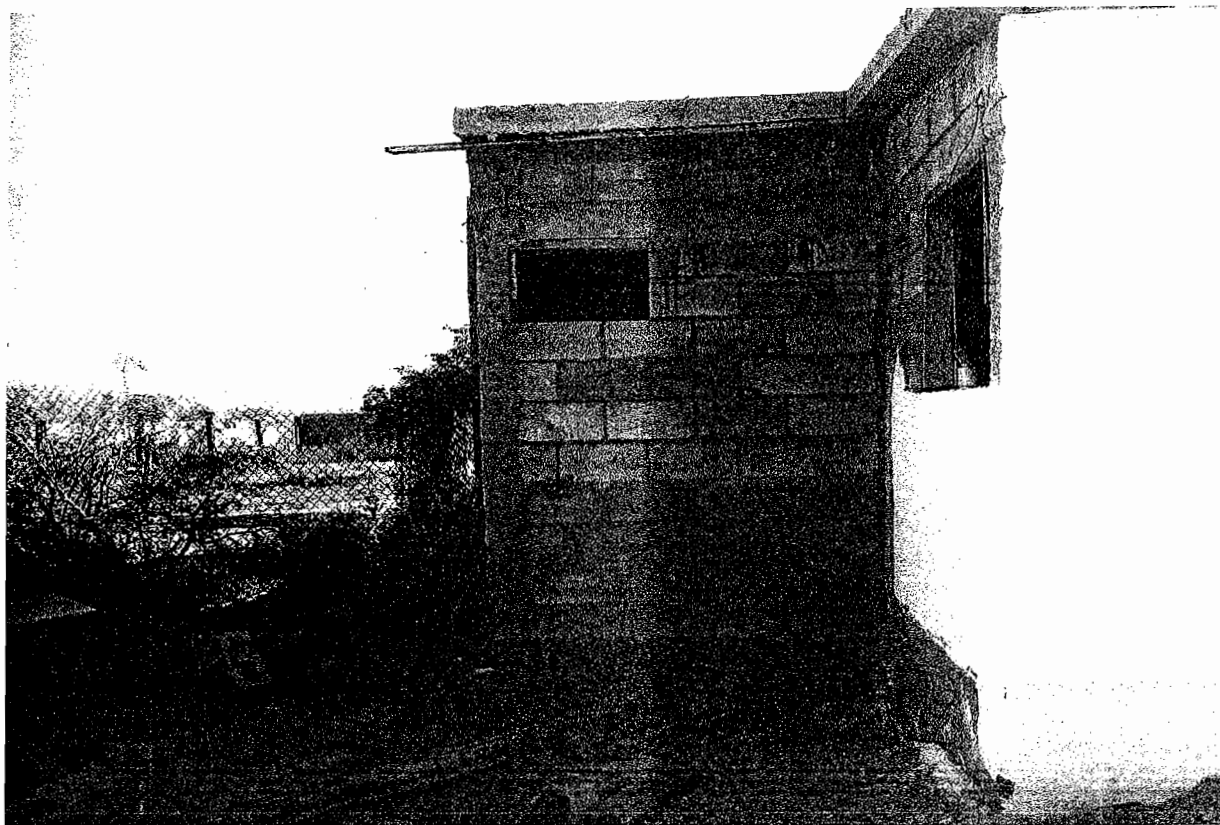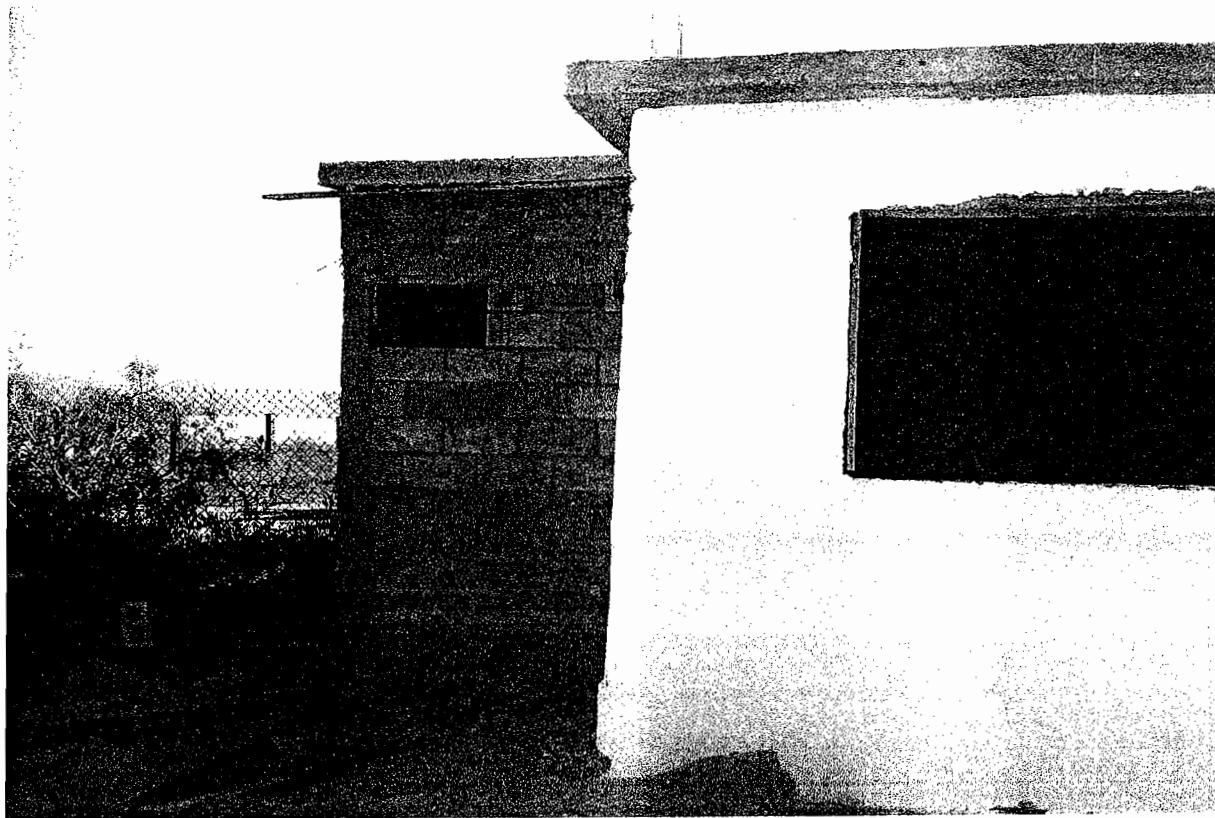

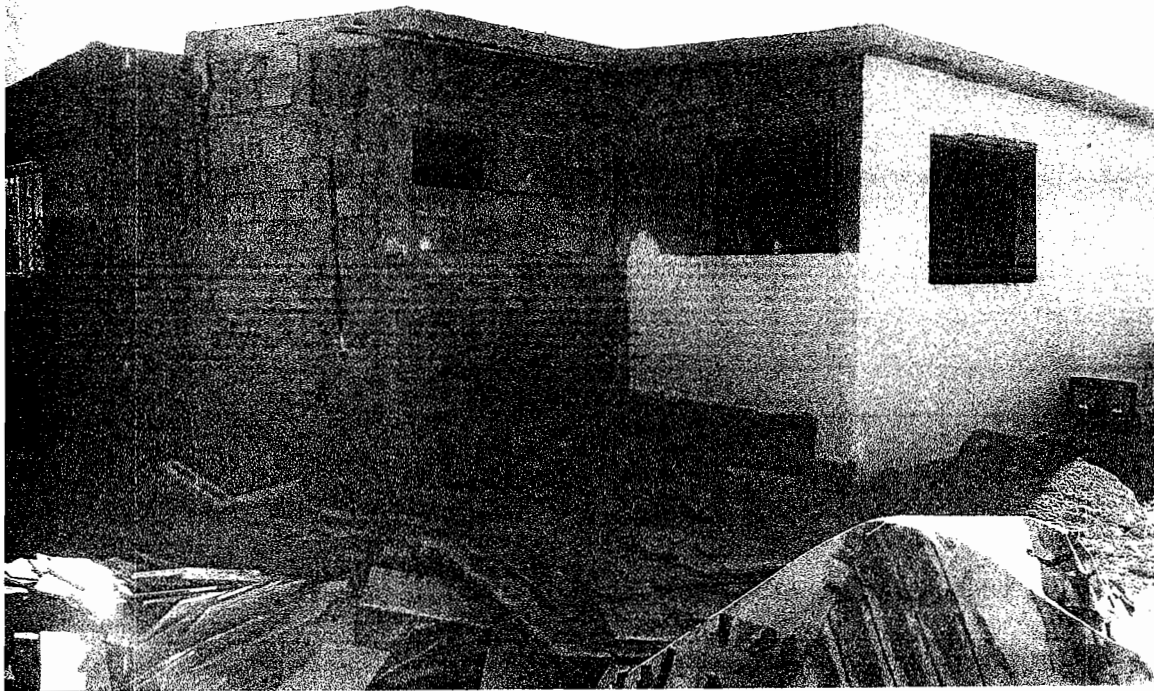



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL
OFICIO No CS/4500/2016

19 DE OCTUBRE DEL 2016

**ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
PRESENTE.-**

Con relación a su solicitud mediante escrito S/N con fecha 17 de octubre del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO.**, que al amparo del contrato No. 131/2016 ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXTRA-01	TRABE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20 X 40 CMS. AHOGADA EN LOSA 12 CMS., ARMADA CON 5 VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. PROMEDIO INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ML	\$656.18	\$656.18

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.C.P. ING. JAVIER VILLAREAL. POSADA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
C.C.P. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO. JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION SOCIAL
C.C.P. ING. RODOLFO ORTIZ. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/CHCG/JVP/CMR/jlcc
