

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SA00590801MZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 63
FOLIO FISCAL (UUID):
A809EA87-A3EE-492E-94B6-7E93F244359C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-03T12:34:31
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-03T12:29:31

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Fecha de Expedición: 03 octubre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 99-Otros
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO ESTIMACIÓN NUMERO 2 SEGUN CONTRATO NUM. 131/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$16,239.14 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$32.47 I.C.I.C. DEL 0.2% \$32.47 D.I.F. DEL 0.2% \$32.47 SUMA \$97.41 NETO A RECIBIR \$18,739.99	\$ 16,239.14	\$ 16,239.14

IMPORTE CON LETRA: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 16,239.14
IVA(IVA 16.00%): \$ 2,598.26
TOTAL: \$ 18,837.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DJkVUc90n+0JXLogIDSTT8p5T5rJ0KQEHgukwOICuUM7VCFWVhYhYc+qVCk1kdy7K12eLBNPHYVYK3qpwqD4d2+S1B4PN4zgf+cVuaKeJCKE87bNTO8UGTdUjencp1+MBN2fp4am9XAaCTv7JLV2ceetHsW+GUs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mttjP4c8kGmz5YVIALspytb4HLQJ07U5VwqOLC+d8BAK5IGAKFQDxYvVncX897UKxXa9gT7RdQ9CRF0M4C2TAKSv9EaZKPXNTc+mYYB51HP7HPTUeG3AE87SXH3nwtTIDaOtnAuGYM8ZjjaBKrgyhdHSjZTio=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111P4A809EA87-A3EE-492E-94B6-7E93F244359C(2016-10-03T12:34:31)DJkVUc90n+0JXLogIDSTT8p5T5rJ0KQEHgukwOICuUM7VCFWVhYhYc+qVCk1kdy7K12eLBNPHYVYK3qpwqD4d2+S1B4PN4zgf+cVuaKeJCKE87bNTO8UGTdUjencp1+MBN2fp4am9XAaCTv7JLV2ceetHsW+GUs=[00001000000203495276]



[Handwritten signature]


www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
del SAT México




Factura No: 63
FOLIO FISCAL (UUID):
A809EA87-A3EE-492E-94B6-7E93F24-4359C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
000010000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
000010000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-03T12:34:31
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-03T12:29:31

Régimen Fiscal:	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		
Lugar de Expedición:	Chihuahua, Chihuahua	Fecha de Expedición:	03 octubre 2016
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Clave de Moneda:	MXN
Método de Pago:	99-Otros	NumCtaPago:	NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO ESTIMACION NUMERO 2 SEGUN CONTRATO NUM. 131/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$16,239.14 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$32.47 I.C.I.C. DEL 0.2% \$32.47 D.I.F. DEL 0.2% \$32.47 SUMA \$97.41 NETO A RECIBIR \$18,739.99 	\$ 16,239.14	\$ 16,239.14

SUBTOTAL:	\$ 16,239.14
IVA(IVA 16.00%):	\$ 2,598.26
TOTAL:	\$ 18,837.40

[illegible]

CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. RODOLFO ORTIZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$18,837.40 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

RECIBE

ING. RODOLFO ORTIZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 131/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 93,117.50 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	
UBICACIÓN: EJIDO NUEVO SACRAMENTO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 18,837.40 CON IVA
CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 24,433.27 CON IVA
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 43,270.67 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 16,239.14	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 16,239.14	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.		32.47
0.2% I.C.I.C.	\$	32.47
0.2% D.I.F.	\$	32.47
SUMA DESCUENTOS	\$	97.41
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	16,239.14
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	16,239.14
I.V.A.	\$	2,598.26
TOTAL	\$	18,837.40
(CON LETRA)		
(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	97.41
SALDO NETO A RECIBIR	\$	18,739.99

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ORTIZ RESIDENTE D.O.P.M	ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	




Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal		x
RFC Emisor		
RFC Receptor		

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SA00590801M22	OSCAR SANDOVAL OCHOA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C169E0C4-4EAE-4506-8AA6-7B4542920AA6	2016-10-03T12:23:16	2016-10-03T12:28:16	FMD100203J57
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$24,433.27	ingreso	Vigente	

Imprimir

CHIHUAHUA, CHIH.,

12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 18,739.99
(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 131/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 93,117.50 INCLUYE CONVENIO
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 16,239.14

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 16,239.14

IVA \$ 2,598.26

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO TOTAL \$ 18,837.40

C.M.I.C. DEL 0.2% 32.47

I.C.I.C. DEL 0.2% 32.47

D.I.F. DEL 0.2% 32.47

SUMA 97.41

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 93,117.50
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 24,433.27
ESTA ESTIMACION	\$ 18,837.40
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 43,270.67
POR EJERCER	\$ 49,846.83

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% I.C.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 32.47	\$ 32.47	\$ 32.47
ACUMULADO ACTUAL	\$ 32.47	\$ 32.47	\$ 32.47

R E C I B I M O S

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOQ-590901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS. EN EJIDO NUEVO
SACRAMENTO

MUNICIPIO: EJIDO LA HACIENDA No. CONTRATO: 131/2016

ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

16,239.14

ALBAÑILERIA

16,239.14

EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL

16,239.14

I.V.A.

2,598.26

TOTAL

18,837.40

POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. RODOLFO ORTIZ

CONTRATISTA:

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO		IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO	UNITARIO		
	<u>OBRA NORMAL</u>							\$	16,239.14
	<u>ALBAÑILERIA</u>							\$	16,239.14
10	Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 M.M. (3/4") H. en O., de 15 x 15 cms., Armada con armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	24.55	17.64	0.00	17.64	\$ 164.97	\$	2,910.07
11	Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 , Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correctas ejecucion.	M2	44.52	38.78	0.00	38.78	\$ 253.94	\$	9,847.79
12	Dala de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4") H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriaes y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	19.4	17.60	0.00	17.60	\$ 197.80	\$	3,481.28

EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00

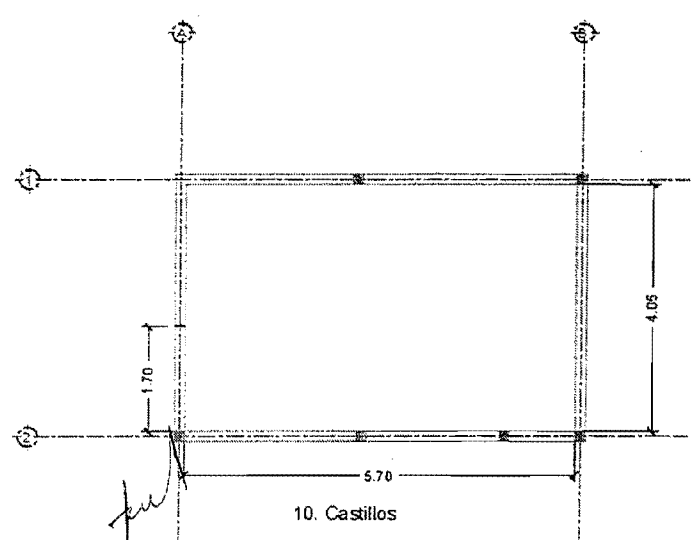
POR EL CONTRATISTA

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL RESIDENTE

ING. RODOLFO ORTIZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 131/2016						
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN NUEVO SACRAMENTO		CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA		
NO. DE ESTIMACIÓN:		2		PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016		
CLAVE	CONCEPTO				TOTAL	UNIDAD
10	Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 M.M. (3/4") H. en O., de 15 x 15 cms., Armada con armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.				17.64	ML
OPERACIONES ARITMETICAS						
		Altura (A)	Piezas (P)	Longitud (A x P)	Unidad	
		Cimentación	0.42	6	2.52	ml
		Muros	2.1	6	12.6	ml
		Enrase	0.42	6	2.52	ml
		Total		17.64	ml	
 10. Castillos						

RESIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: 131/2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN NUEVO SACRAMENTO

CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA

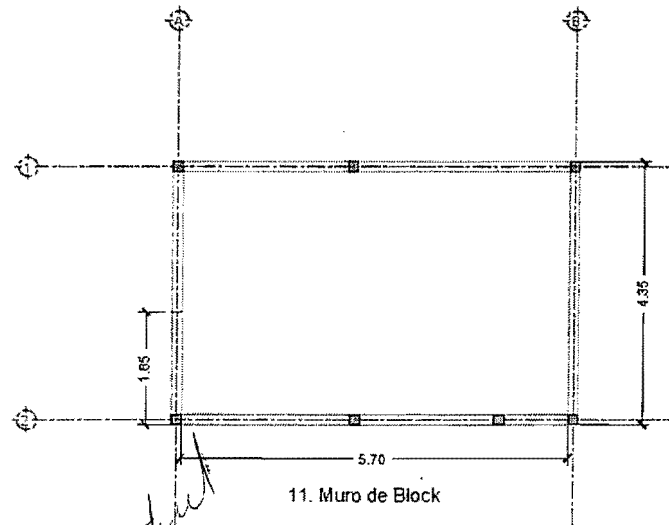
NO. DE ESTIMACIÓN: 2

PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CLAVE	CONCEPTO	TOTAL	UNIDAD
11	Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 , Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdiciós, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correctas ejecución.	38.78	M2

OPERACIONES ARITMETICAS

Ejes	Largo (L)	Castillo (C)	Ventana (V)	Puerta (P)	L - C	Altura Muro (M)	Altura Enrase (E)	Área ((L-C) x (M + E) - (V+P))	Unidad
1. Entre A y B	5.7	0.15	0	0	5.55	2.1	0.42	13.99	m2
2. Entre A y B	5.7	0.3	1.5	1.8	5.4	2.1	0.42	10.31	m2
A. Entre 1 y 2	1.85	0.15	0	0	1.7	2.1	0.42	4.28	m2
B. Entre 1 y 2	4.35	0.3	0	0	4.05	2.1	0.42	10.21	m2
Total								38.78	m2



RESIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

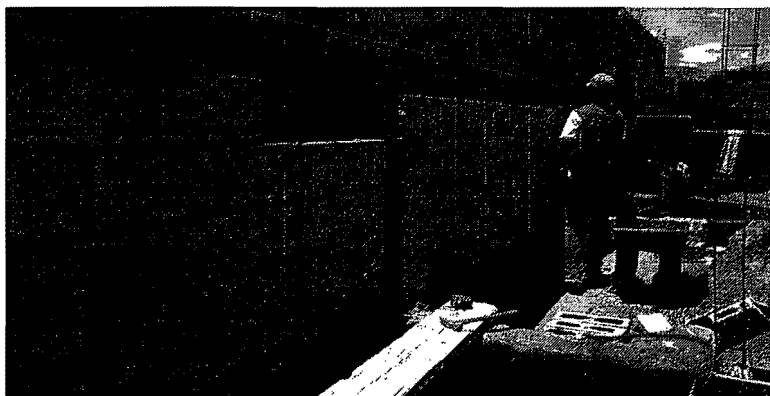
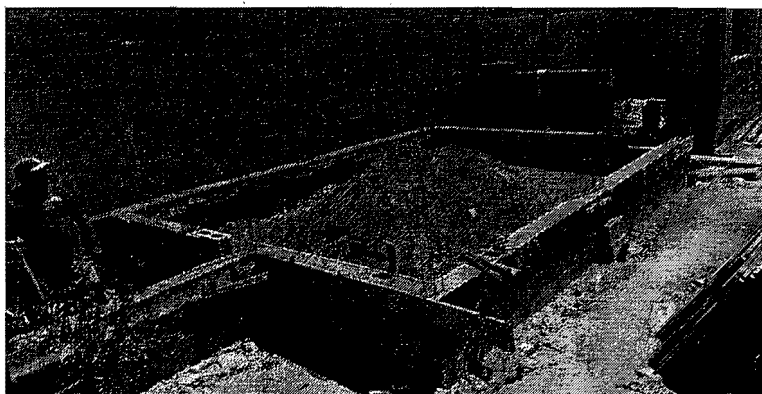
CONTRATO: 131/2016				
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS EN NUEVO SACRAMENTO		CONTRATISTA: ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
NO. DE ESTIMACIÓN:		2		PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
CLAVE	CONCEPTO			TOTAL UNIDAD
12	Dala de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4") H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetriaes y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.			17.6 ML
OPERACIONES ARITMETICAS				
		Ejes	Largo	Unidad
		1. Entre A y B	5.7	ml
		2. Entre A y B	5.7	ml
		A. Entre 1 y 2	1.85	ml
		B. Entre 1 y 2	4.35	ml
		Total	17.6	ml
8. Dala de Cerramiento				


RESIDENTE


CONTRATISTA

REPORTE FOTOGRAFICO

Obra:	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO		11 de julio al 8 de agosto DE 2018
No. Contrato:	130/2016	ESTADO:	CHIHUAHUA
Contratista:	C. OSCAR SANDOVAL OCHOA		




C. OSCAR SANDOVAL OCHOA


ING. RODOLFO ORTIZ
