

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*



Sello Digital del CFDI  
Sello Digital del SAT  
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS, 74/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 74,402.36  
IVA(IVA 16.00%): \$ 11,904.36  
TOTAL: \$ 86,306.74

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO IDENTIFICACION | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
|----------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1.00     | N/A              | 1                 | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALEGRIA" UBICADA EN LA CALLE 74 S/N, CO. VISTA CERRO GRANDE, C.P. 31065, CLAVE 08DJN2076B<br>ESTIMACION NUMERO 2<br>SEGUN CONTRATO NUM. 132/2016<br>ALCANJE DE LA ESTIMACION \$ 74,402.36<br>AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -<br>RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO<br>C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 148.80<br>I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 148.80<br>D.I.F. DEL 0.2% \$ 148.80<br>SUMA \$ 446.40<br>NETO A RECIBIR \$ 85,860.34 | \$ 74,402.36    | \$ 74,402.36 |

CLIENTE:  
RFC:  
DIRECCION:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
MCI651010V22  
CENTRO C.P. 31000  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
Lugar de Expedición:  
Forma de Pago:  
Método de Pago:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Chihuahua, Chihuahua  
Pago en una sola exhibición  
99-Otros

Fecha de Expedición: 07 octubre 2016  
Clave de Moneda: MXN  
NumCtaPago:  
NO IDENTIFICADO

OSCAR SANDOVAL OCHOA  
SA00590801M22  
Domicilio Fiscal  
ARBOL DE LIMA 18939  
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170  
Chihuahua Chihuahua México  
Tel. 5434707

Factura No: 69  
FOLIO FISCAL (UUID): 792237CF-FC45-4608-A8ED-DF8D45E06254  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000203495276  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 000010000000304489099  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-10-07T13:53:25  
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2016-10-07T13:48:25



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

☒ Folio Fiscal

☐ RFC Emisor

☐ RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



Verificar CFDI

|                |                                      |                        |                     |                                  |                      |                                    |                        |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| RFC del Emisor | SA00590801MZZ                        | RFC del Receptor       | MCI651010V22        | Nombre o Razón Social del Emisor | OSCAR SANDOVAL OCHOA | Nombre o Razón Social del Receptor | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |
| Folio Fiscal   | 792237CF-FCAS-460B-A8ED-DF8D45E06254 | Fecha de Expedición    | 2016-10-07T13:48:25 | Fecha Certificación SAT          | 2016-10-07T13:53:25  | PAC que Certificó                  | FMD100203JS7           |
| Total del CFDI | \$86,306.74                          | Efecto del Comprobante | Ingreso             | Estado CFDI                      | Vigente              |                                    |                        |

Imprimir

*[Handwritten signatures and marks]*

CHIHUAHUA, CHIH. 3 de octubre de 2016


ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ  
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :  
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALEGRIA" UBICADA EN LA CALLE 74 S/N,  
COL. VISTA CERRO GRANDE, C.P. 31065, CLAVE: 08DJN20768

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE 1 de agosto al 31 de agosto de 2016  
POR UN SALDO NETO FACTURADO I \$86,306.74 CON IVA INCLUIDO

ACOMPANADA DE LOS NUMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN  
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISION Y AUTORIZACION

ATENTAMENTE  
C. OSCAR SANCHEZ OCHOA  
RECIBE  
ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

|                                                                                                                                                     |  |                                                   |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------|--|
| PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL                                                                                                                         |  | CONTRATO No. 132/2016                             | CONTRATADOS |  |
| OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALEGRIA" UBICADA EN LA CALLE 74 S/N, COL. VISTA CERRO GRANDE, C.P. 31065, CLAVE: 08DJN20758 |  | PERIODO EJEC. 1 de agosto al 31 de agosto de 2016 |             |  |
| UBICACIÓN: CALLE 74 S/N, COL. VISTA CERRO GRANDE, C.P. 31065                                                                                        |  | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA) \$ 86,306.74 CON IVA   |             |  |
| CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA                                                                                                                |  | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA) \$ 4,573.96 CON IVA  |             |  |
| RFC SAOO-590901-MZ2                                                                                                                                 |  | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA) \$ 90,880.70 CON IVA  |             |  |

| TIPO DE OBRA                        |  | IMPORTE |           | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|---------------|
| OBRA NORMAL                         |  | \$      |           |               |
| OBRA EXCEDENTE                      |  | \$      | 1,541.76  |               |
| OBRA EXTRAORDINARIA                 |  | \$      | 47,486.30 |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA) |  | \$      | 74,402.36 |               |

|                                                         |               |           |        |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| DESCUENTOS                                              | 0.2% CMIC     | \$        | 148.80 |
|                                                         | 0.2% I.C.I.C. | \$        | 148.80 |
|                                                         | 0.2% DIF      | \$        | 148.80 |
| SUMA DESCUENTOS                                         |               | \$        | 446.40 |
| RESUMEN                                                 |               |           |        |
| SUMA ESTA ESTIMACION                                    | \$            | 74,402.36 |        |
| AMORT ANTICIPO                                          | \$            | 0.00      |        |
| SUB-TOTAL                                               | \$            | 74,402.36 |        |
| I.V.A.                                                  | \$            | 11,904.38 |        |
| TOTAL                                                   | \$            | 86,306.74 |        |
| (CON LETRA)                                             |               |           |        |
| (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 74/100 M.N.) |               |           |        |
| DESCUENTOS                                              | \$            | 446.40    |        |
| SALDO NETO A RECIBIR                                    | \$            | 85,860.34 |        |

|                                               |                                |                   |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| AUTORIDAD                                     | ING. JOSÉ HUITON LÓPEZ         | RESIDENTE D.O.P.M | Vo. Bo. |
| REVISOR                                       | C. OSCAR SANDOVAL OCHOA        | CONTRATISTA       | Vo. Bo. |
| ELABORÓ                                       |                                |                   |         |
| SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA | ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO      |                   |         |
| JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION                | ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN |                   |         |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO    | ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA |                   |         |


## CONTRATO : 132:2016

OBRA: **CONTRATISTA**  
 C. OSCAR SANDOVAL  
 OCHOA  
 CONTRATISTA  
 C. OSCAR SANDOVAL  
 OCHOA

**Nº DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Zapata corrida de colindancia de 0.60 x 0.20 m, a base de concreto $f'_{c} = 250 \text{ kg/cm}^2$ , armada con varilla de acero No. 4 a cada 0.25 m en ambos sentidos. Incluye acero para anclajes verticales, cimbrado, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su |
| CLAVE | 2.5 CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| OPERACIONES ARITMETICAS |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| ejes                    | largo | unidad |
| 1 entre Ay D            | 9.95  | m      |
| 2 entre Cy D            | 0.58  | m      |
| 3 entre Ay B            | 1.35  | m      |
| A entre 1 y 2           | 1.55  | m      |
| B entre 1 y 4           | 5.78  | m      |
| D entre 1 y 2           | 5.78  | m      |

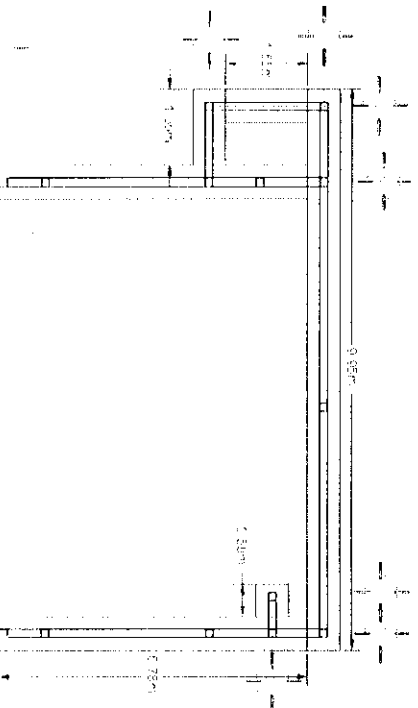

**राष्ट्रियसंघर्ष**

~~CONFIDENTIAL~~

## CONTRATO : 132/2016


OBRA: CONTRASTES  
C. OSCAR SANDOVAL  
DCHQA

Nº DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Dalla de cerramiento de concreto hidráulico  $f_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ , de  $20 \times 20 \text{ cm}$ , armada con armex de cuatro puntas, incluye: anclaje de varillas a elemento existente, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.

|       |     |          |                                                  |
|-------|-----|----------|--------------------------------------------------|
| CLAVE | 2.8 | CONCEPTO | correcta ejecución por unidad de obra terminada. |
|-------|-----|----------|--------------------------------------------------|

| OPERACIONES ARITMETICAS |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| ejes                    | largo | unidad |
| 1 entre Ay D            | 9.5   | m      |
| 2 entre Cy D            | 0.65  | m      |
| 3 entre Ay B            | 1.35  | m      |
| A entre 1 y Z           | 2     | m      |
| B entre 1 y 4           | 6     | m      |
| D entre 1 y Z           | 6     | m      |

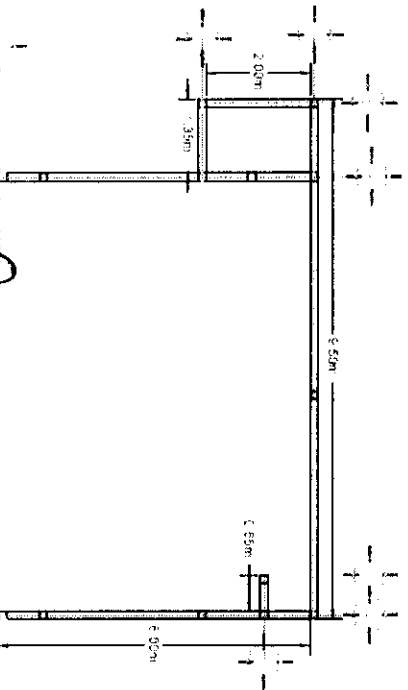

RESIDENTE

~~CONTRATISTA~~

## CONTRATO 132/2016


OBRA: CONFERENCIA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILMA, TENDRÁ QUE SER LA ALFARERÍA DEL VILMA, ENTONCES  
ENTONCES, LA ALFARERÍA DE VILMA DEBE

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL  
OCHOA

**Nº DE ESTIMACION:** 2    **PERIODO:** 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

|       |     |          |                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE | 2.9 | CONCEPTO | Suministro y colocación de barrera impermeable a base de dos manos de impermeabilizante asfáltico VAPORTITE 550 en paredes de zapaia, rodapie y dala. incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. |
|-------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OPERACIONES ARITMETICAS |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
|                         | volumen | unidad |
| 1.1(25.5)               | 28.05   | m2     |
| TOTAL                   | 28.05   | m2     |

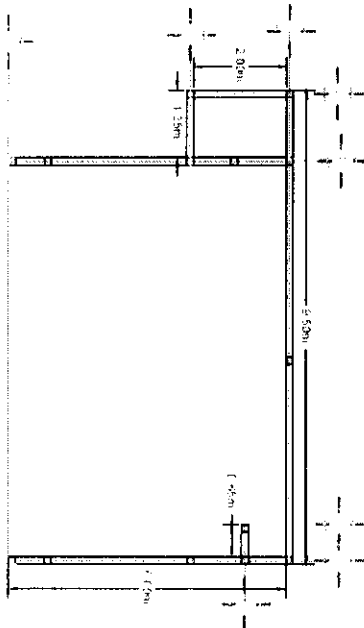

RESIDENTE

~~CONFIDENTIAL~~

CONTRATO : 132/2016


[illegible]

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

| CLAVE |          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1   | CONCEPTO | <p>Relleño con material de banco, compactado al 95 % de su PVSM por medios mecánicos. Incluye: agua, afine, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</p> |

| OPERACIONES ARITMETICAS |       |       |             |         |        |
|-------------------------|-------|-------|-------------|---------|--------|
|                         | largo | ancho | profundidad | volumen | unidad |
| SALÓN                   | 7.85  | 5.85  | 0.50        | 22.96   | M3     |
| BAÑO                    | 2     | 1.2   | 0.50        | 1.20    | M3     |
| TOTAL                   |       |       |             | 24.16   | M3     |

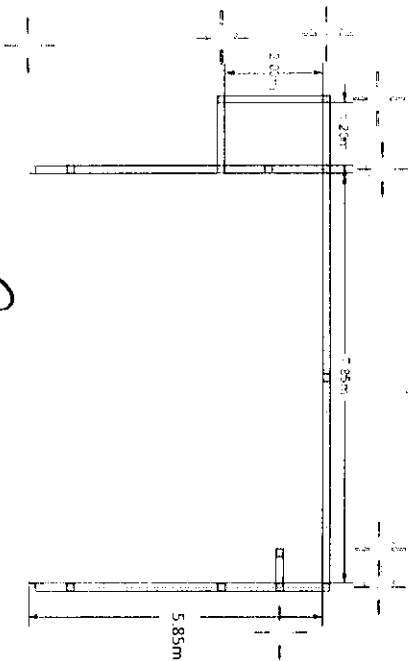

RESIDENTIE

~~CONFIDENTIAL~~

# GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO: 132/2016

OBRA: CONSTRUCCION DE ALACANTILLAS EN LOS TALLERES DEL GRUPO INDUSTRIAL DE TALLERES SAN JOSE, VILLACCA, CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

NO DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

| CLAVE | EXT-1 | CONCEPTO | RODAPIE EN CIMENTACION A BASE DE BLOQUE DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2<br>ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 80 CMS. |
|-------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OPERACIONES ARITMETICAS |       |      |          |        |
|-------------------------|-------|------|----------|--------|
| ejes                    | largo | alto | Area     | unidad |
| 1 entre A y D           | 8.9   | 0.63 | 5.61     | m2     |
| 2 entre C y D           | 0.5   | 0.63 | 0.32     | m2     |
| 3 entre A y B           | 1.2   | 0.63 | 0.76     | m2     |
| A entre 1 y 2           | 2     | 0.63 | 1.26     | m2     |
| B entre 1 y 4           | 5.4   | 0.63 | 3.40     | m2     |
| D entre 1 y 2           | 5.397 | 0.63 | 3.4011   | m2     |
| Total                   |       |      | 14.74031 | m2     |

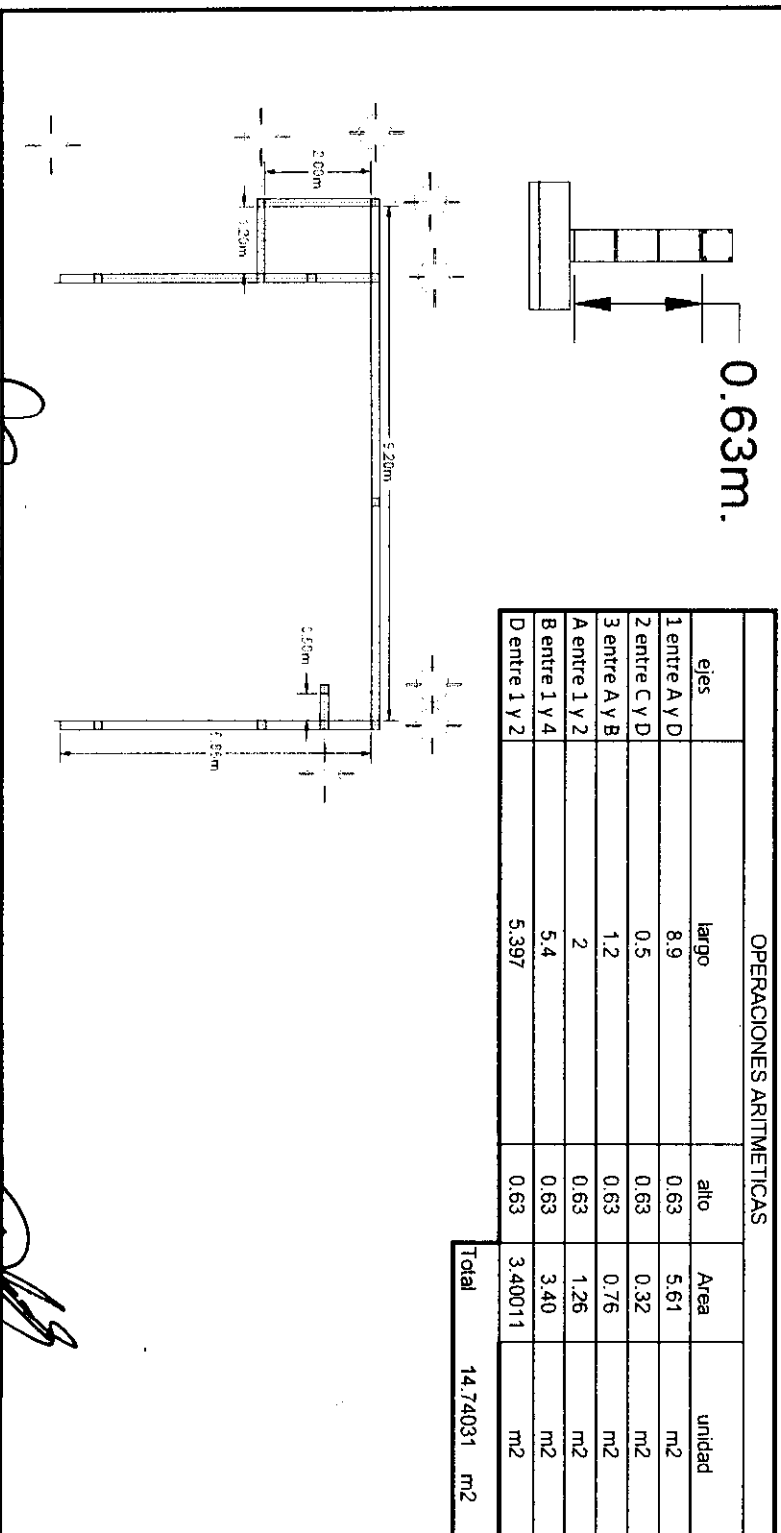

RESIDENTE

CONTRATISTA

# GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO 132/2016

OBRA: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

Nº DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

CLAVE EXT-02 CONCEPTO #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X30 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS

| OPERACIONES ARITMETICAS |       |         |
|-------------------------|-------|---------|
| ejes                    | largo | unidad  |
| 1 entre A y D           | 9.5   | m       |
| 2 entre C y D           | 0.65  | m       |
| 3 entre A y B           | 1.35  | m       |
| A entre 1 y 2           | 2     | m       |
| B entre 1 y 4           | 6     | m       |
| D entre 1 y 2           | 6     | m       |
| Piña                    | 8.15  | m       |
| Total                   |       | 33.65 m |

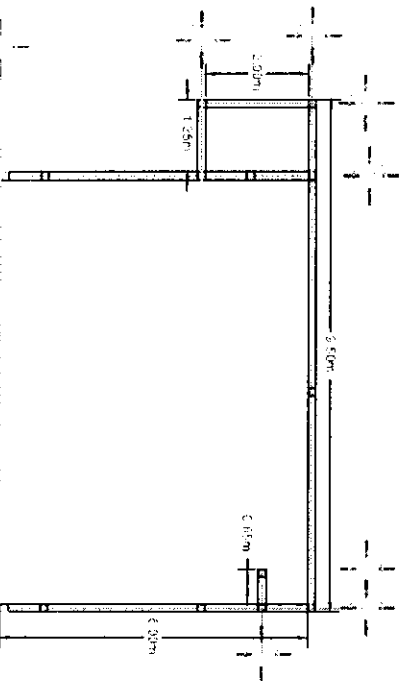

RESIDENTE

CONTRATISTA

## CONTRATO : 132/2016

**OBRA**



**F**

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL  
OCHOA

**Nº DE ESTIMACION:** 2 **PERÍODO:** 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

|       |        |          |                                                                                              |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE | EXT-03 | CONCEPTO | MURO DE ADOBON DE 14 CMS. ASENTADO CON CEM-ARENA 1-5. ACABADO COMUN INC. ENRASES Y MOCHETAS. |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| OPERACIONES ARITMETICAS |                                                                                    |                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | $0.75(6.07)(2+0.15)(0.75)(5)(2+0.75)=$                                             | 7.23 m <sup>2</sup>  |
| Cuarto                  | $9.5(0.75)(2+0.75)(0.15)=$                                                         | 6.9 m <sup>2</sup>   |
|                         | $(2.3+1.5)(0.75)+1(0.75)(0.15)=$                                                   | 2.74 m <sup>2</sup>  |
| Baño                    | $0.5(0.75)=$                                                                       | 0.38 m <sup>2</sup>  |
|                         | $0.64(1.6+0.82+1.6+1.6+7.85+1.35)(2 \text{ lados})+1.6+2(1.6+0.64+1.6+1.7)(0.62)=$ | 25.75 m <sup>2</sup> |
|                         | TOTAL                                                                              | 43.00 m <sup>2</sup> |



RESIDENTE

~~CONFIDENTIAL~~

## CONTRATO 132/2016


OBRA:  
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA  
LIBRO I TITULO II CAP. III ART. 98  
1507-1508

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL  
OCHOA

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

|       |         |          |                                                                                                                           |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE | EXT-16A | CONCEPTO | CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VR #3 Y ESTRUBOS #2 @20 CMS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OPERACIONES ARITMETICAS |        |        |       |        |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|
| BENEFICIARIO            | piezas | altura | total | unidad |
| Salón                   | 11     | 2.8    | 30.8  | m      |
| Baño                    | 2      | 2.8    | 5.6   | m      |
| TOTAL                   |        |        | 36.4  | m      |

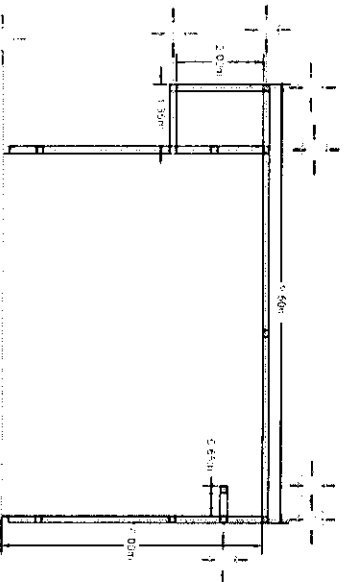

RESIDENTE

~~CONFIDENTIAL~~

# GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO : 132/2016

OBRA : OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL MONUMENTO NACIONAL DE LA INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, BOLIVIA. CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

Nº DE ESTIMACION : 2 PERIODO : 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

| CLAVE | EXT-17A | CONCEPTO | REPIZÓN DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VR #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CMS INC CIMBRADO, ARMADO Y COLADO. |
|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OPERACIONES ARITMETICAS |       |         |
|-------------------------|-------|---------|
| ejes                    | largo | unidad  |
| 1 entre A y D           | 9.5   | m       |
| 2 entre C y D           | 0.65  | m       |
| 3 entre A y B           | 1.35  | m       |
| A entre 1 y 2           | 2     | m       |
| B entre 1 y 4           | 6     | m       |
| D entre 1 y 2           | 6     | m       |
| Total                   |       | 25.50 m |

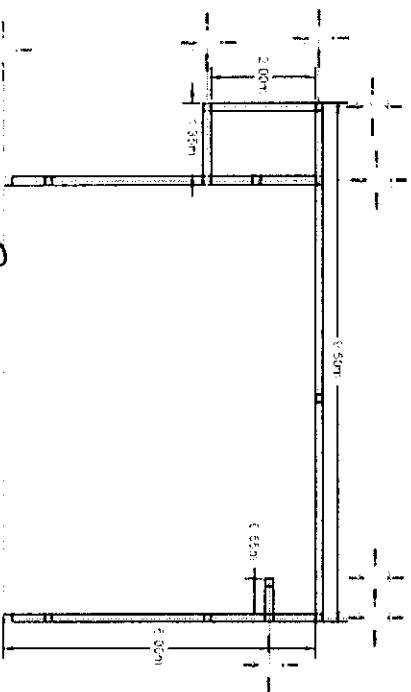

RESIDENTE

CONTRATISTA

*[Handwritten signature]*

CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALEGRIA" UBICADA EN  
LA CALLE 74 S/N, COL. VISTA CERRO GRANDE, C.P. 31065, CLAVE: 08DJN2076B

1 de agosto al 31 de agosto de 2016

2

132/2016

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

Estimación No.

Contrato



CHIHUAHUA, CHIH.

# ALBUM FOTOGRÁFICO

## Captura de Datos de Proyecto

ING. JOSE HUSTRON LOPEZ

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |           |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| Clase | El presente informe es el resultado de la investigación realizada por el personal de la Unidad de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en el marco del expediente 132/2016, con el fin de determinar la causa y circunstancias que originaron el hecho delictivo. | No. Expediente | 132/2016                | ESTADO | CHIHUAHUA |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Identificado   | C. OSCAR SANDOVAL OCHOA |        |           |  |

REPORTE FOTOGRAFICO

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 85,860.34  
(OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N.)  
CONTRATO No. 132/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 428,081.59  
POR TRABAJOS EN LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALEGRIA" UBICADA EN LA CALLE 74 S/N, COL. VISTA CERRO  
GRANDE, C.P. 31065, CLAVE: 08DJN20768

|                                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| ALANCE DE LA ESTIMACION         | \$ | 74,402.36 |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO       | \$ | -         |
| SUBTOTAL                        |    |           |
| IVA                             | \$ | 11,904.38 |
| TOTAL                           | \$ | 86,306.74 |
| RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO |    |           |
| DIF DEL 2%                      |    | 148.80    |
| I.C.I.C. DEL 0.2%               |    | 148.80    |
| CMIC DEL 2%                     |    | 148.80    |
| SUMA                            |    | 446.40    |

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

|              |  |                                |    |            |
|--------------|--|--------------------------------|----|------------|
| 1.- CONTRATO |  | IMPORTE CONTRATADO             | \$ | 428,081.59 |
|              |  | CONVENIO MODIFICATORIO         | \$ | -          |
|              |  | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR  | \$ | 4,573.96   |
|              |  | ESTA ESTIMACION                | \$ | 86,306.74  |
|              |  | ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION | \$ | 90,880.70  |
|              |  | POR EJERCER                    | \$ | 337,200.89 |
|              |  | CONTRATO                       | \$ | -          |

|                               |  |                     |    |   |
|-------------------------------|--|---------------------|----|---|
| 2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO |  | IMPORTE DE ANTICIPO | \$ | - |
|                               |  | ACUMULADO ANTERIOR  | \$ | - |
|                               |  | ESTA ESTIMACION     | \$ | - |
|                               |  | ACUMULADO ACTUAL    | \$ | - |
|                               |  | POR AMORTIZAR       | \$ | - |
|                               |  | CONTRATO            | \$ | - |

|                                      |  |                    |               |               |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| 3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO |  | 0.2% DIF           | 0.2% I.C.I.C. | 0.2% C.M.I.C. |
|                                      |  | ACUMULADO ANTERIOR | \$            | 7.88          |
|                                      |  | ESTA ESTIMACION    | \$            | 148.80        |
|                                      |  | ACUMULADO ACTUAL   | \$            | 156.68        |
|                                      |  | CONTRATO           | \$            | 8.42          |

R E C I B I M O S  
C. OSCAR SANDOVAL OCHOA  
SAOO-990901-MZ2

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALEGRIA" UBICADA EN LA CALLE 74 S/N. COL. VISTA CERRO GRANDE. C.P. 31065. CLAVE 08DJN20765

UBICACION CALLE 74 S/N. COL. VISTA CERRO GRANDE. C.P. 31065. CONTRATO: 13222016

ESTIMACION No. 2

PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

| No. | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS | IMPORTE |
|-----|-----------------------------|---------|
|-----|-----------------------------|---------|

**OBRA NORMAL** 25,374.30

CIMENTACION Y PISO 20,236.92

FIRMES 5,137.38

**OBRA EXCEDENTE** 1,541.76

**OBRA EXTRAORDINARIA** 47,486.30

SUBTOTAL 74,402.36

I.V.A. 11,904.38

TOTAL 86,306.74

POR EL CONTRATISTA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFRA. URBANA

ING. JOSE HU-TRONCOSO

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALEGRIA" UBICADA EN LA CALLE 74 S/N. COL. VISTA CERRO GRANDE. C.P. 31065. CLAVE: 08DJN2076B

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

ESTIMACION No. 2

UBICACIÓN CALLE 74 S/N, CI. CONTRATO: 132/2016

| No. | CONCEPTOS | DESCRIPCION | PROYECTO |         |       | VOLUMENES |      |          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----|-----------|-------------|----------|---------|-------|-----------|------|----------|-----------------|---------|
|     |           |             | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM. | TOTAL     | PUM. | ANTERIOR |                 |         |
|     |           |             |          |         |       |           |      |          |                 |         |

**OBRA EXCEDENTE**

2.9 Suministro y colocación de barrera impermeable a base de dos manos de impermeabilizante asfáltico VAPORTITE 550 en paredes de zapata, rodapie y dala, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.

**OBRA EXTRAORDINARIA**

EXT-1 RODAPIE EN CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 80 CMS.

EXT-2 CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X30 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO

EXT-3 MURO DE ADOBON DE 14 CMS. ASENTADO CON CEM-ARENA 1-5, ACABADO COMUN INC. ENRASES Y MOCHETAS.

EXT-16A CASTILLO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VR #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CMS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO

EXT-17A REPIZÓN DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VR #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CMS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFR. URBANA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

Fag 13 de 19

ING. JOSE HORTON LOPEZ
