

Folio Fiscal

6c3076e0-1a41-4b79-b5c8-3789561170d7

Serie: C**Folio: 102****Número de Certificado del Emisor**

00001000000301653590

Lugar y Fecha de Emisión

CHIHUAHUA CHIH., 2016-08-08T10:50:34

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GCO7911283P3

CALLE PINO No. 509 1 TEL. 417-68-01

COL. LAS GRANJAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31100

Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

FACTURA**Lugar y Fecha de certificación**

México Distrito Federal, 2016-08-08T11:50:38

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección del Cliente

MINA 408

CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

RFC del Cliente

MCI651010V22

CANT	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica		CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	\$ 142,659.35	\$ 142,659.35

ESTIMACION NUMERO 1
SEGUN CONTRATO NUM 141/2016
FIRMA DEL CONTRATISTA
ALCANCE DE LA ESTIMACION \$203,799.07
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 61,139.72
RETENCION PACTADA EN CONTRATO
0.2% I.C.I.C \$ 407.60
0.2% DIF \$ 407.60
0.2% C.M.I.C \$ 407.60
SUMA \$1,222.80 NETO A RECIBIR \$164,262.05

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zs70z5VMYQruUnWAmTOPSOxEcA/epmQABwsR3Plpy4d19spO+0ogDwrf5z4GsTX99Xfu+HrYH3jHHipb6Jlk1+JIVibUdWiz6Y9J6OTrgk2+R
nUIW5RFQuTD1Oew+rXkXHwkd/W2VPQlxzeYrARL31yHWt4WeZDLQ8y+5FUCIfY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JlMS4Znyg0ZG7ISybXHtafgxbbrxg6ftWlm+pSvln9uD2InNeOYPfUn90rvEC7MQLOYGbl+2GkSaxCAV0VtAQlby+jpKTX5DC+RtJGInqzm
u3wtbW9Jj/rbSABm3/Ml6FhjdS7lr8xTic7gpimelCdyXosqskp8/wh2gESmGI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|6c3076e0-1a41-4b79-b5c8-3789561170d7|2016-08-08T11:50:38|Zs70z5VMYQruUnWAmTOPSOxEcA/epmQABwsR3Plpy4d19spO+0ogDwrf5z4GsTX99Xfu+HrYH3jHHipb6Jlk1+J
IVibUdWiz6Y9J6OTrgk2+RnUIW5RFQuTD1Oew+rXkXHwkd/W2VPQlxzeYrARL31yHWt4WeZDLQ8y+5FUCIfY=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 99 OTRAS

Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO



SUB-TOTAL	\$ 142,659.35
Total de Impuestos Traslados	\$ 22,825.50
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 22,825.50
TOTAL	\$ 165,484.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



Verificar CFDI

RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GCO7911283P3	GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
6C3076E0-1A41-4B79-B5C8-3789561170D7	2016-08-08T10:50:34	2016-08-08T11:50:38	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$165,484.85	ingreso	Vigente	

Imprimir





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	INVERSION MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO No.	141/2016	CONTRATADOS
OBRA:	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN CLLE EUCALIPTO ENTRE CALLES PRIMERAY SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS	ESTIMACIÓN No.	1	\$ 913,716.39 CON IVA
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA CHIH	PERÍODO EJEC.	01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2016	
CONTRATISTA:	GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	236,406.92 CON IVA
RFC	GCO-791128-3P3	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	-
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	236,406.92 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 203,799.07	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 203,799.07	

--

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	407.60
0.2% DIF.	\$	407.60
0.2% CMIC.	\$	407.60
SUMA DESCUENTOS	\$	1,222.80
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	203,799.07
AMORT ANTICIPO	\$	61,139.72
SUB-TOTAL	\$	142,659.35
I.V.A.	\$	22,825.50
TOTAL	\$	165,484.85
(CON LETRA)		
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,222.80
SALDO NETO A RECIBIR	\$	164,262.05

AUTORIZO	ELABORO
 ING. EVER GARIBO PALMA RESIDENTE D.O.P.M	 GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
 ING. XOCHITL PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	 ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN JEFE DEL DEPTO. DE CONSERVACION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	



CHIHUAHUA, CHIH.,

04 DE AGOSTO 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 164,262.05
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 5/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 141/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 913,716.39 INCLUYE CONVENIO
DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BORDA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN CLLE EUALIPTO ENTRE CALLES PRIMERAY SEGUNDA
DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 203,799.07

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 61,139.72

SUBTOTAL \$ 142,659.35

IVA \$ 22,825.50

TOTAL \$ 165,484.85

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 407.60

DIF 0.2% 407.60

C.M.I.C. 0.2% 407.60

SUMA 1,222.80

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 913,716.39
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 236,406.92
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 236,406.92
POR EJERCER	\$ 677,309.47

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 274,114.92
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 70,922.08
ACUMULADO ACTUAL	\$ 70,922.08
POR AMORTIZAR	\$ 203,192.84

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 407.60	\$ 407.60	\$ 407.60
ACUMULADO ACTUAL	\$ 407.60	\$ 407.60	\$ 407.60
			\$ 1,222.80

RECIBIMOS

GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
GCO-791128-3P3



OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN CILE EUCALIPTO ENTRE CALLES PRIMERAY SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH
CONTRATISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2016
ESTIMACION No. 1
No. CONTRATO: 141/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

<u>NORMALES</u>	\$	203,799.07
<u>EXCEDENTES</u>	\$	
<u>EXTRAS</u>	\$	


SUBTOTAL	\$	203,799.07
I.V.A.	\$	32,607.86
TOTAL	\$	236,406.93

POR EL CONTRATISTA

GARMEL CONSTRUCCIONES SA DE CV

RESIDENTE DE OBRA

ING. EVER GARFIO PALMA



OBRA:

CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA CHIHUAHUA 275/7 UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

MUNICIPIO:

CHIHUAHUA CHIH.

CONTRATISTA:

GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PERIODO:

01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2016

ESTIMACION No.:

141/2016

CONTRATO:

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
	BARRA						\$ 203,799.07
1.-	TRAZO Y NIVELACION	M2	320	320.00	0	4.8	\$ 1,536.00
3.-	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	165	13.20	0	126.27	\$ 1,666.76
3.10	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	153.00			55.21	\$ 2,529.72
4.-	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	m2	167	37.73	0	113.45	\$ 4,280.47
5.-	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	m2	233.28		0	494.45	\$
6.-	COLOCACION DE DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4vs #4 Y ST DEL#3 @ 20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, CONCRETO, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	277	89.90	0	89.90	\$ 27,041.02

CONTRATISTA
GARMEL CONSTRUCCIONES SA DE CV

RESERVA DE LUGAR
ING. GUILLERMO GARFIA PALA



D/

CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN
CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS
CERRO GRANDE

MUNICIPI
O: CHIHUAHUA CHIH

CONTRAT
STA: GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2016

ESTIMACI
ON No. 1

No.
CONTRAT 141/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
7.-	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 4:1 Y ACABADO APARENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	540	146.46	0	406.32	\$ 59,509.63		
12.00	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	305	74.24	0	237.16	\$ 17,606.76		
8.-	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 V#3 Y ST DE #2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	320	89.90	0	265.00	\$ 23,823.50		
14	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTES Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m	277	45.00	0	85.02	\$ 7,566.78		
15	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS, RELLENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR. #4 A CADA 60 CMS.	m2	45.82	45.82	0	542.69	\$ 24,866.06		

CONTRAT
GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA
ING. EVER GARRIO PALM



D/

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN
CALLE EUCAUPTO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA GRANUJAS
CERRO GRANDE

MUNICIPI
O: CHIHUAHUA CHIH.

CONTRAT
ISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2016

ESTIMACI
ON No.

No.

CONTRAT
O:

141/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	OL. ESTIMADO			
16	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 27 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	ml	53.9			53.90	532.6	\$	28,707.14
17	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	57.13			57.13	81.66	\$	4,665.24
									203799.07
									32607.85
									236406.92

CONTRATISTA
GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RESERVA DE OBRA
ING. EVER GARRIO PALM

GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		OBRA:							GENERADOR
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN CALLE EUCLIPTO ENTRE CALLES PRIMERAY SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE									
		CONTRATO No.- 141/2016		CONTRATISTA:					
		PERIODO DE EJECUCION		GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
		01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2016							

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNID	LARGO	ANCHO	ALTO	CROQUIS	CROQUIS	CANTIDAD TOTAL
1.1	ALBANILERIA							
1.-	TRAZO Y NIVELACION	M2	1 X 320= 320				ANEXO-1	320.00
3.-	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	53.90X.7X	.35 = 13.20			ANEXO	13.20
4.-	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	m2	53.90 X.70=	37.73 M2			ANEXO	37.73
5.-	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	m2	0.00				ANEXO	
6.-	COLOCACION DE DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS A BASE D	ML	62.9+27	89.90			ANEXO	89.90
7.-	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 4:1 Y ACABADO APARENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	62.9X1.47 + 27*2=	146.46			ANEXO	146.46
12	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	32X2.32=	74.24 ML			ANEXO	74.24
8.-	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 Vs#3 Y ST DE #2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	62.90+27=	89.90 ML			ANEXO	89.9
14	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA.	ML	1X89=	89				89
15	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 60 CMS.	M2	53.90X1.25+ .42/2=	45.00 M2			ANEXO	45.00
16	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 27 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	ML	53.90				ANEXO	53.90
17	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	53.9X 1.06X1.0=					57.13


RESIDENTE DE OBRA
ING. EVER GARFIO PALMA

GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757

99,64

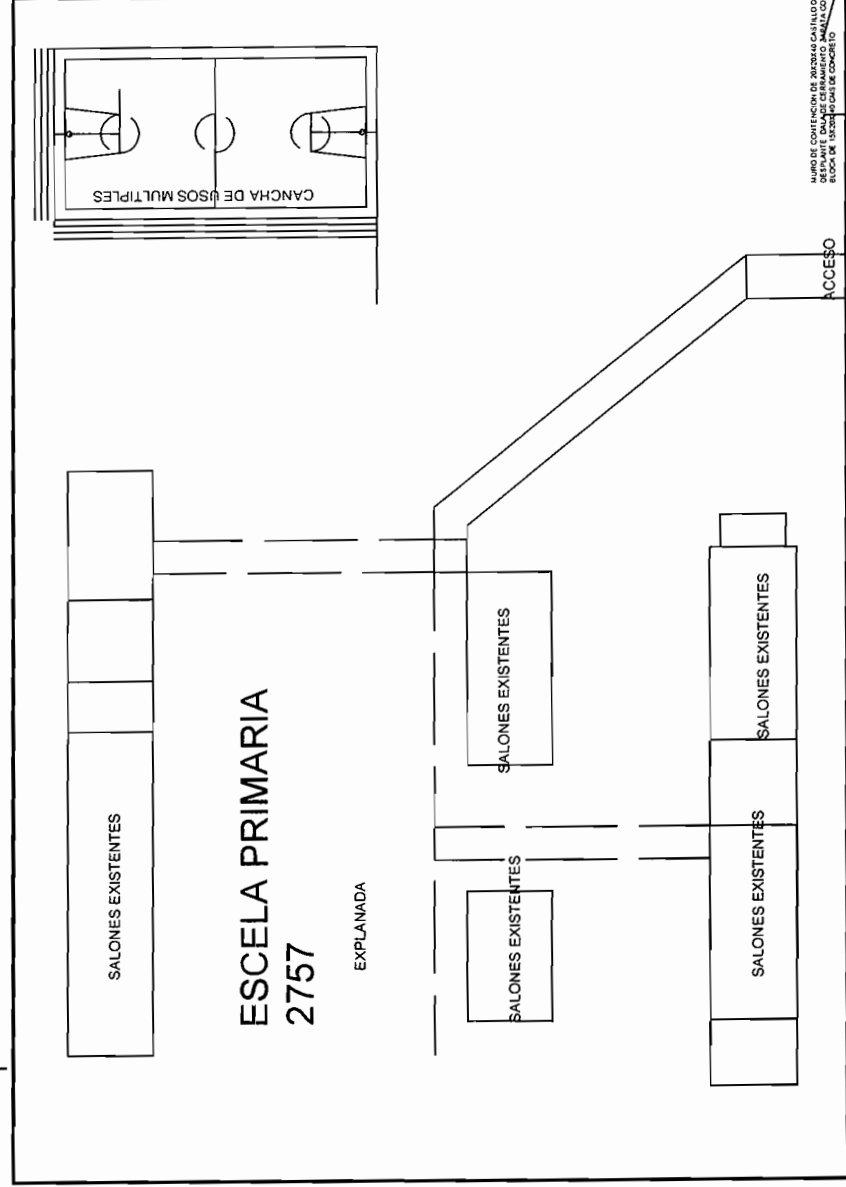



149,8

PLANTA ARQUITECTONICA

ANEXO-1

Handwritten signature

BARDA ESC. PRIMARIA 2757

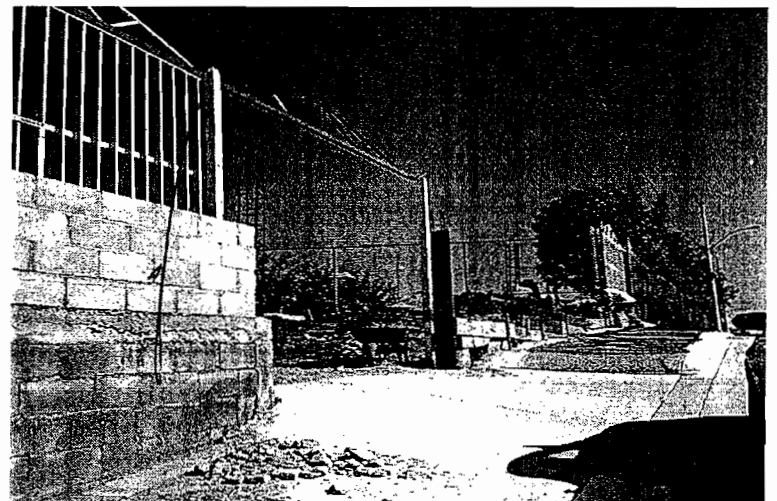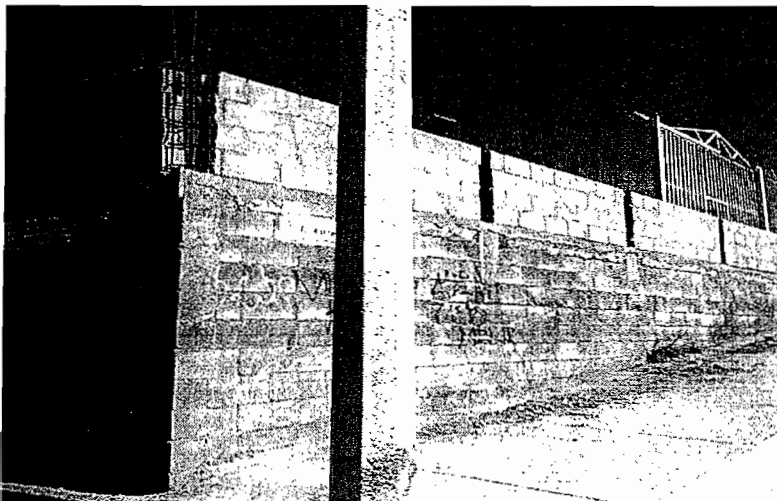

Walter Fox
