



Constructora Prouvika S.A. de C. V.

R.F.C. CPR1108125Z8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

C 275

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	NO IDENTIFICADO	Pago en una sola Exhibición	2016-07-08T09:38:01	CHIHUAHUA MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P.31370

Folio Fiscal

8EEC1504-83C3-45D9-AC37-2DDCFE3C9DBE

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT

00001000000202453260

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000400248443

Fecha y hora de certificación

2016-07-08T09:38:01

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS DE GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA, DEL CONTRATO No. 143/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN.	\$ 257,349.65	\$ 257,349.65
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: 2% DIF \$ 514.70 2% CMIC \$ 514.70 2% I.C.I.C. \$ 514.70 SUMA \$ 1,544.10 NETO A RECIBIR \$ 296,981.49	\$ 0.00	\$ 0.00

Proveedor Autorizado
de Facturación
B1SOFT LATINOAMERICA

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DÍA ULTIMO DE CADA MES.
*EFECTOS FISCALES AL PAGO.
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUBTOTAL	\$ 257,349.65
DESCUENTO	\$
IVA 16.00 %	\$ 41,175.94
TOTAL	\$ 298,525.59



Sello digital del CFDI

Y2G7g11kYUtgEhtRnWep52cyQL1FsYB+DQM5VntaDeNCX9m5ZHMb0c3M+84UwzKM+n+nU9tF1teJQ0ZpSpzTrCeHOx3B JUM0SKntmNOC677DU5G48XcMDOWpJBMNRUo1QzqBIMHIG6ugNnvAerAgr6nNNLvhVhHy1AheczBfQuLYGfKy4rwgle
nEtUCBaCW621GwEaxJKzWmhmMnPhYhPHLqVthwRXpzyWCKqMbLlqbnNR80TH+Up7W6SiuhYJXL8bqNBLzPvKGdaTmLFMG0DbSmRzePrn9pOPbLDAwWZQEhmDe29LLEZ0w0VA==

Sello del SAT

kgfa+3HexpHqROEF88weVvNMd9QxkneLIVVJQoKka9lc5CT8Jzl2VmuJ4SYRkkEatzPWg+XnaigfsJoh5TQBRWwNgNYPe3pwbUBnsJwB0je7U0dH+Jh70uGAN7TRm07v07IWWcPa0QfeWYQZJ4dUDz/CTzhwDxJX2U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1108EEC1504-83C3-45D9-AC37-2DDCFE3C9DBE2016-07-08T09:38:01Y2G7g11kYUtgEhtRnWep52cyQL1FsYB+DQM5VntaDeNCX9m5ZHMb0c3M+84UwzKM+n+nU9tF1teJQ0ZpSpzTrCeHOx3B JUM0SKntmNOC677DU5G48XcMDOWpJBMNRUo1QzqBIMHIG6ugNnvAerAgr6nNNLvhVhHy1AheczBfQuLYGfKy4rwgleEtvUCBaCW621GwEaxJKzWmhmMnPhYhPHLqVthwRXpzyWCKqMbLlqbnNR80TH+Up7W6SiuhYJXL8bqNBLzPvKGdaTmLFMG0DbSmRzePrn9pOPbLDAwWZQEhmDe29LLEZ0w0VA==00001000000202453260]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT



Handwritten signature and initials.



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT.

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPR1108125Z8	Constructora Prouvika S.A. de C. V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
8EEC1504-83C3-45D9-AC37-2DDCFE3C9DBB	2016-07-08T09:38:01	2016-07-08T09:38:01	STB080508339
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$298,525.59	ingreso	Vigente	





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 143/2016	CONTRATADOS
OBRA: GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 450,185.90 CON IVA
	PERÍODO EJEC: DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 298,525.59 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 298,525.59 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$257,349.65	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 257,349.65	

DESCUENTOS		
0.2% DIF		514.70
0.2% CMIC	\$	514.70
0.2% I.C.I.C.	\$	514.70
SUMA DESCUENTOS		1,544.10
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	257,349.65
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	257,349.65
I.V.A.	\$	41,175.94
TOTAL	\$	298,525.59
(CON LETRA)		
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,544.10
SALDO NETO A RECIBIR	\$	296,981.49

Vo. Bo	ELABORO
ARQ. NANCY MAGDALENA CLARES HERNANDEZ	CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
SUPERVISION CONTRATADO DE OBRA	CONTRATISTA
AUTORIZO	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
SUBDIRECTOR DE	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
AUTORIZO	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE JULIO DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD D \$ **296,981.49**
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 143/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ **450,185.90**
SON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTAY CINCO PESOS 90/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **257,349.65**

SUBTOTAL	\$ 257,349.65
IVA	\$ 41,175.94
TOTAL	\$ 298,525.59

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

DIF 0.2%	\$514.70
CMIC 0.2%	\$514.70
I.C.I.C. 0.2%	\$514.70
SUMA	\$1,544.10

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
CONVENIO MODIFICATORIO 2
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	450,185.90
\$	-
\$	-
\$	-
\$	298,525.59
\$	298,525.59
\$	151,660.31

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	DIF 0.2%	CMIC 0.2%	I.C.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 514.70	\$ 514.70	\$ 514.70
ACUMULADO ACTUAL	\$ 514.70	\$ 514.70	\$ 514.70

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR110812528

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
1.00	OBRA NORMAL	257,349.65
	TERRACERIAS	249,999.60
6.00	EQUIPAMIENTO	\$7,350.05

SUBTOTAL	257,349.65
I.V.A.	41,175.94
TOTAL	298,525.59

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES-HERNÁNDEZ

OBRA: GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, No. 143/2016
CONTRATO: CHIH.

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 1 (JUNO)

PERIODO: DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
1.00	TERRACERIAS						
1.01	Relleno con material sub-base con arena limosa no plástica (vrs 50%), compactada por cualquier medio al 95% en capas no mayores de 0.20 m. de espesor, adicionando agua. Incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1,523.83	1,231.04	0.00	203.08 \$	\$249,999.60
6.00	EQUIPAMIENTO						
6.01	Suministro e instalación de sardinel de 6", en la parte inferior de la puerta principal, puerta de emergencia y puerta de bodega, para el cuidado de la superficie deportiva. Incluye: material, mano de obra, herramienta.	m	7.80	7.80	0.00	576.93 \$	\$4,500.05
6.02	Suministro e instalación de señalamientos en; salidas de emergencia, baños, centro de carga y canastas.	pza	12.00	12.00	0.00	237.50 \$	\$2,850.00

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

Pag 1 de 1

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO : 143/2016		TRAMO:	
OBRA : GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	

No DE ESTIMACION:		1 (UNO)	PERIODO DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2016
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
1.01 Relleno con material sub-base con arena limosa no plastica (vrs 50%), compactada por cualquier medio al 95% en capas no mayores de 0.20 m. de espesor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.			
			VOLUMEN A PAGAR 1,231.04 m3



ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO : 143/2016	TRAMO:
OBRA : GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.








No DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2016
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
6.01 Suministro e instalacion de sardinel de 6", en la parte inferior de la puerta principal, puerta de emergencia y puerta de bodega, para el cuidado de la superficie deportiva. Incluye: material, mano de obra, herramienta.	SE AÑEXA CROQUIS Y OPERACIONES	VOLUMEN A PAGAR 7.80 m



ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNANDEZ



CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

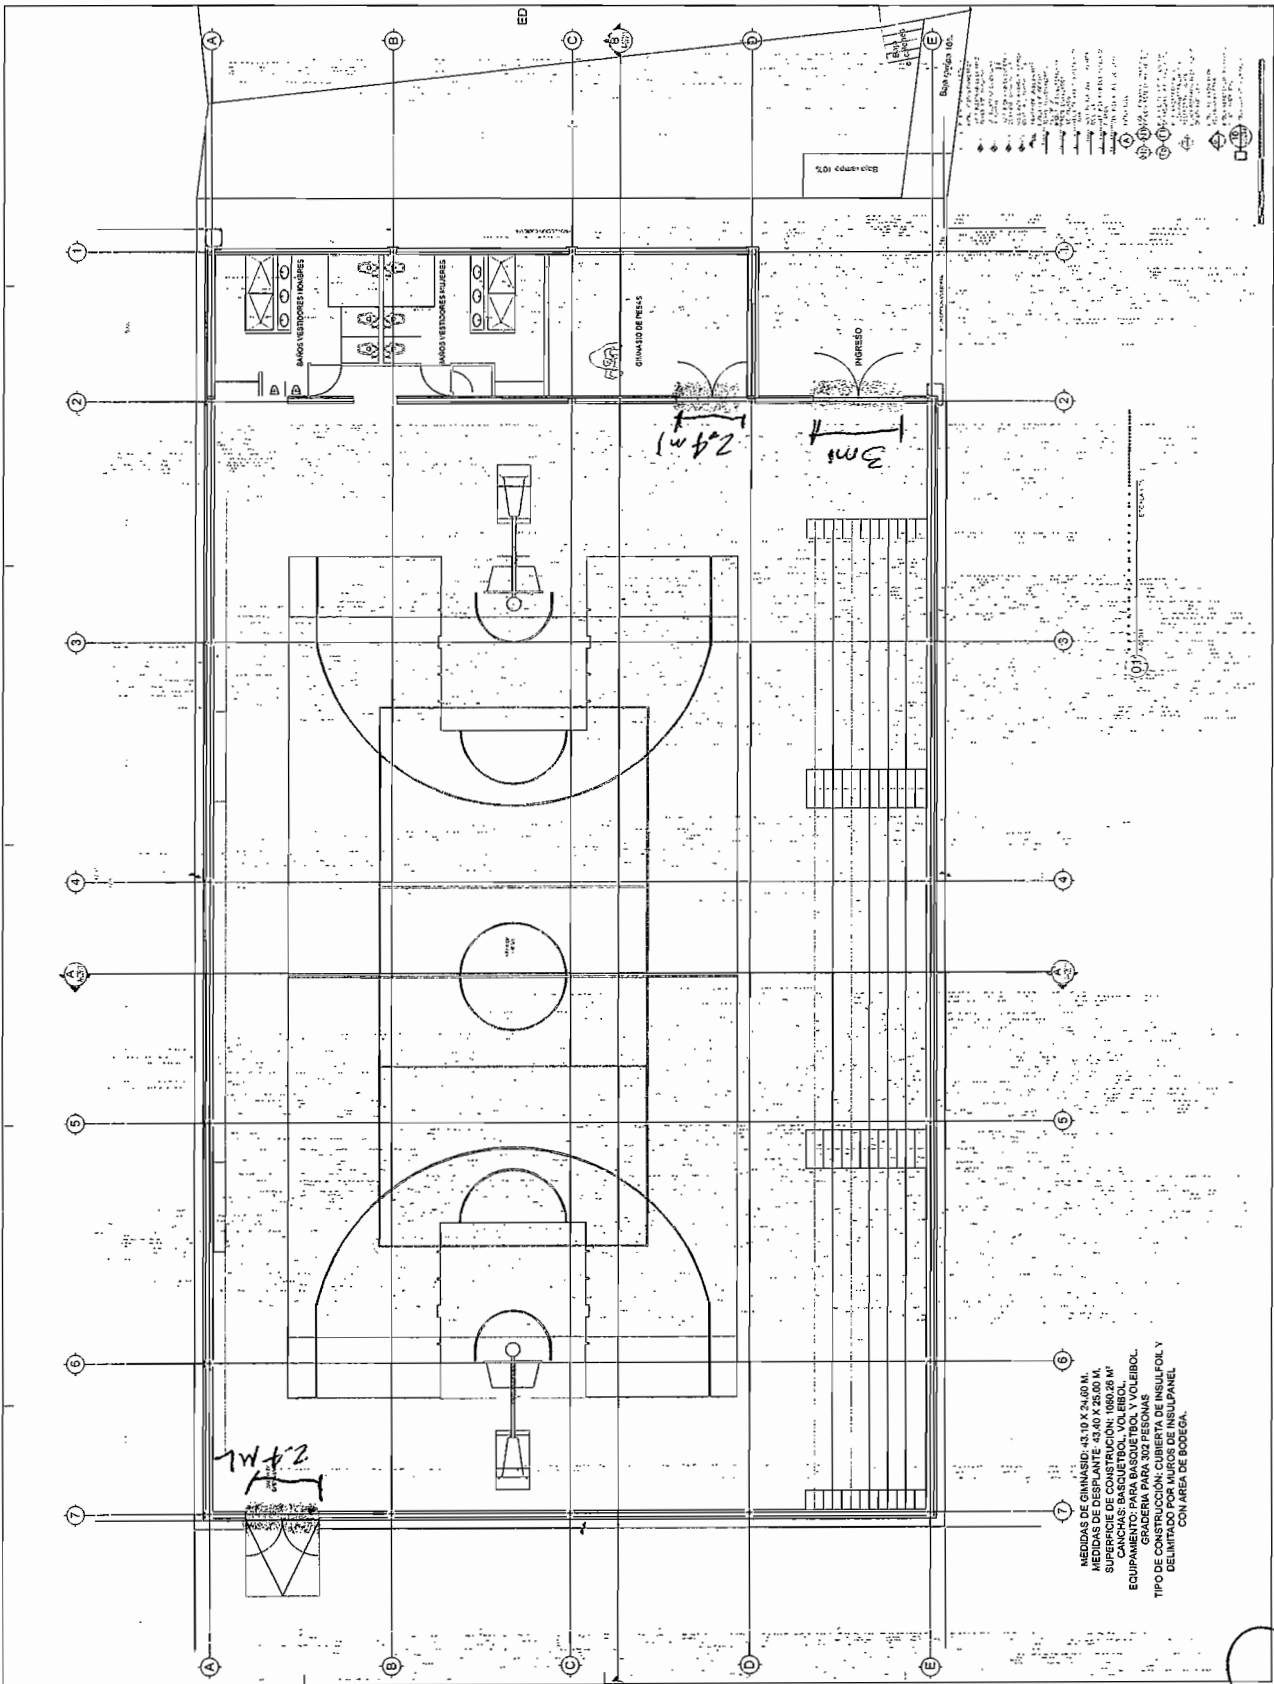

MEZAS DE GIMNASIO: 43.10 X 24.00 M.
MEZAS DE GIMNASIO: 43.10 X 24.00 M.
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: 1033.28 M²
CANCHAS: BASQUETEBOL, VOLEIBOL,
EQUIPAMIENTO PARA BASQUETEBOL Y VOLEIBOL.
TIPO DE CONSTRUCCION: CUBIERTA DE INSULACION Y
DELIMITADO POR MUROS DE INSULACION
CON AREA DE BODEGA.

GIMNASIO USOS MULTIPLES


PLANTA ARQUITECTONICA

A-2011


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO : 143/2016	TRAMO:
OBRA : GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.




No DE ESTIMACION: 1 (UNO) PERIODO DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2016	
CONCEPTO	CROQUIS
6.02 Suministro e instalacion de señalamientos en; salidas de emergencia, baños, centro de carga y canastas.	VOLUMEN A PAGAR 12.00 pza






ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNANDEZ



CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

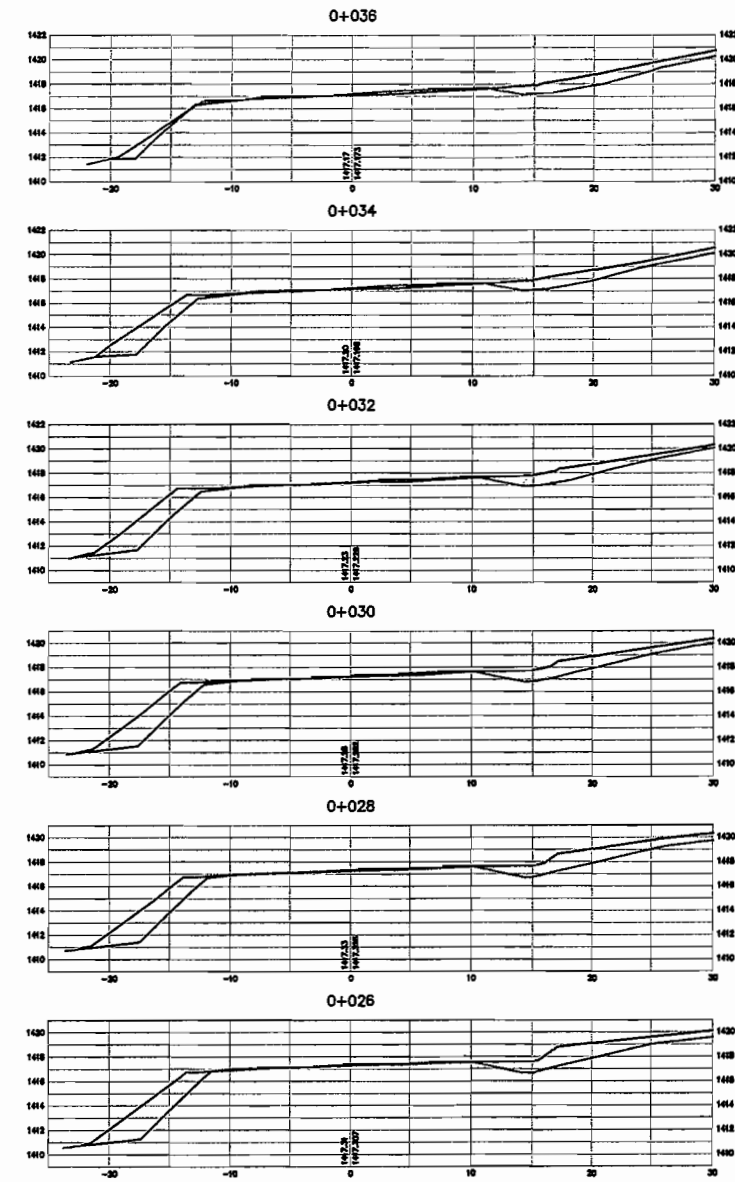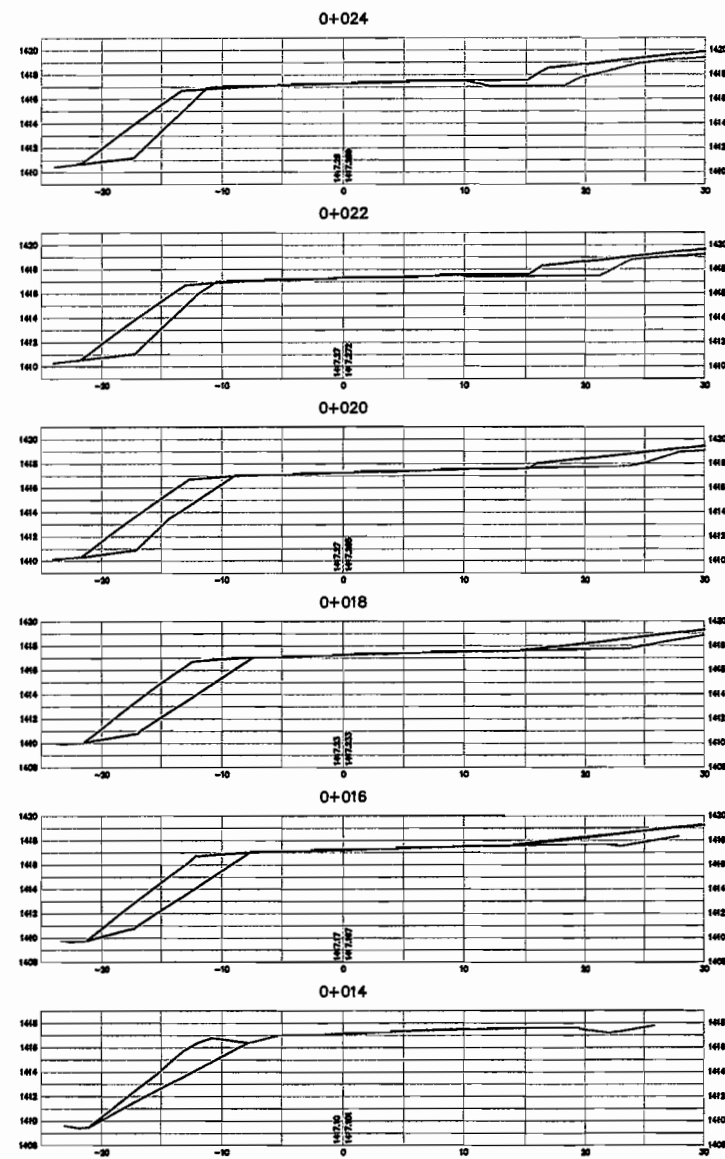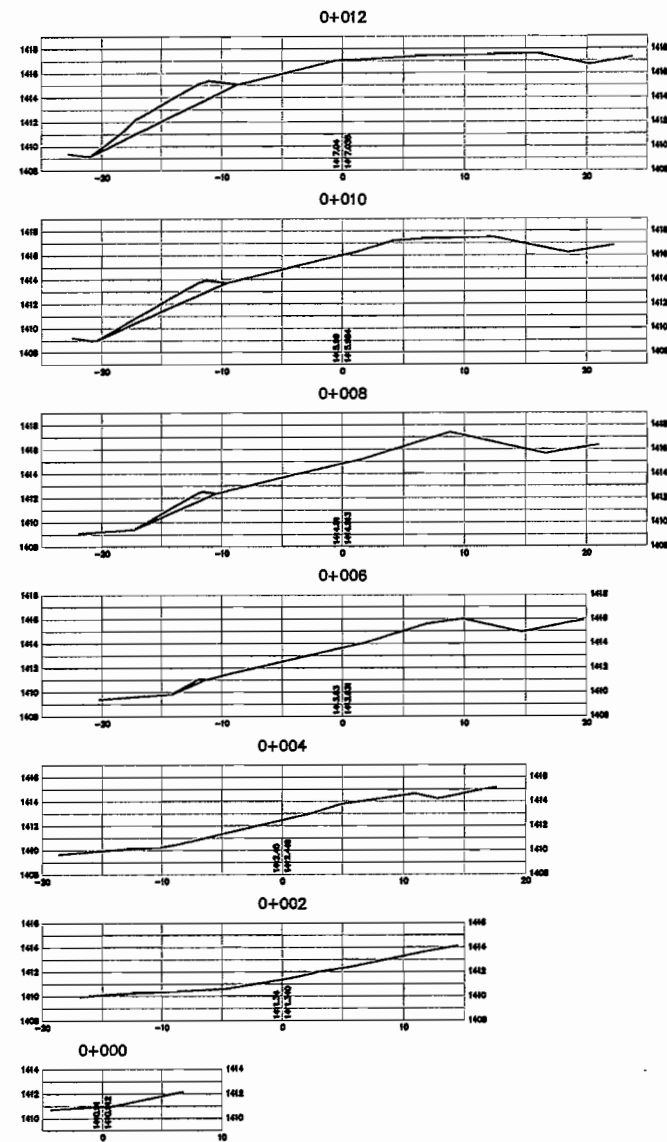

ESTACION	DISTANCIA	AREA	VOLUMEN
0		0.00	
2	2	0.00	0.00
4	2	0.00	0.00
6	2	0.38	0.38
8	2	2.33	2.71
10	2	5.92	8.25
12	2	12.13	18.05
14	2	15.51	27.64
16	2	21.74	37.25
18	2	26.35	48.09
20	2	20.89	47.24
22	2	17.74	38.63
24	2	16.96	34.70
26	2	15.98	32.94
28	2	15.28	31.26
30	2	14.90	30.18
32	2	14.48	29.38
34	2	11.24	25.72
36	2	2.82	14.06
TOTAL			426.48

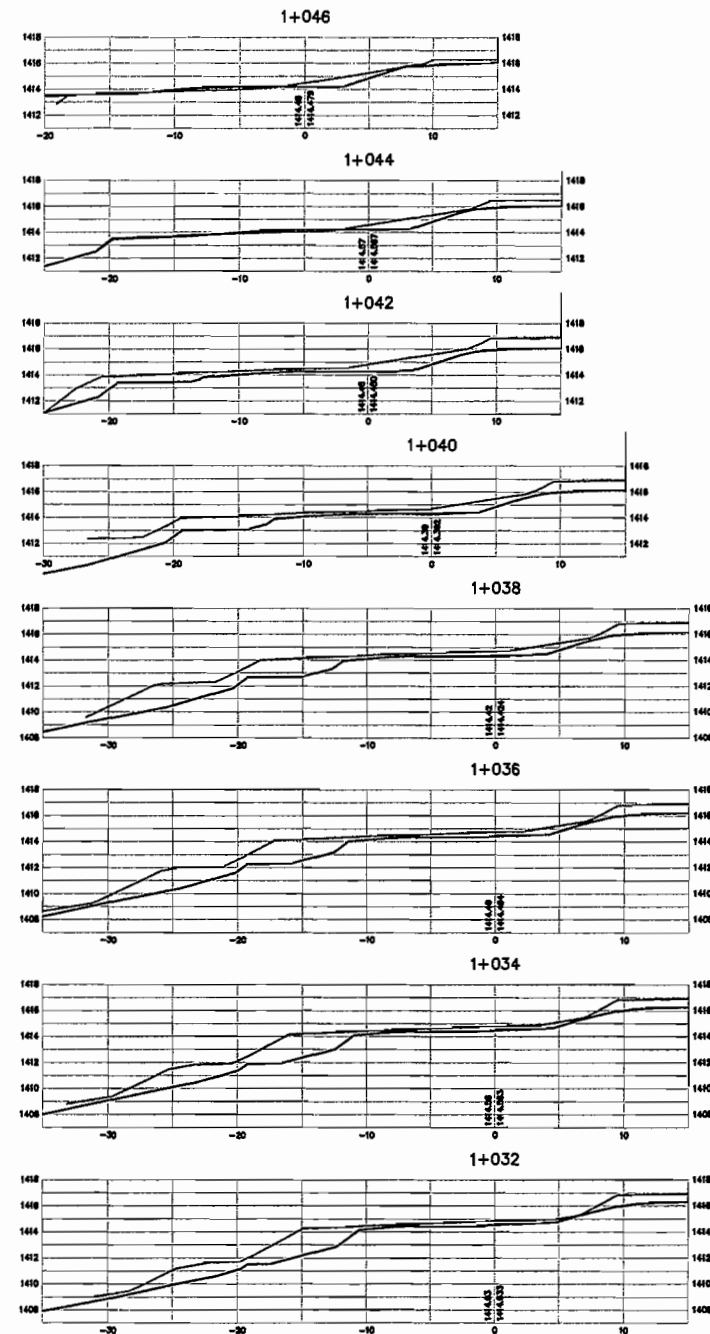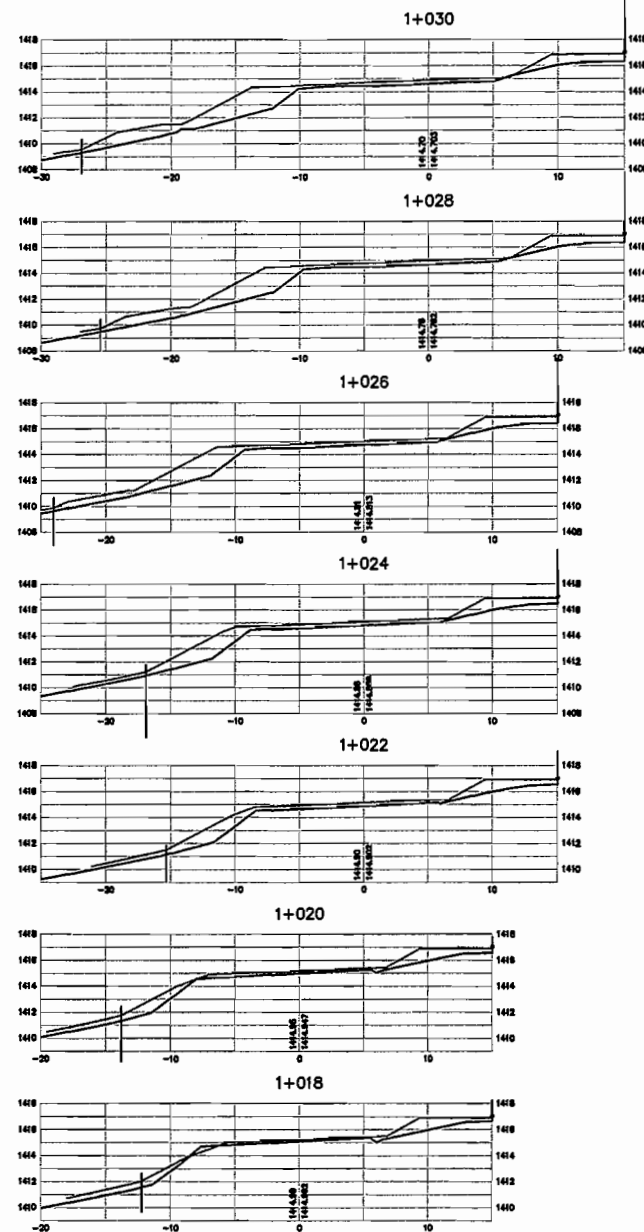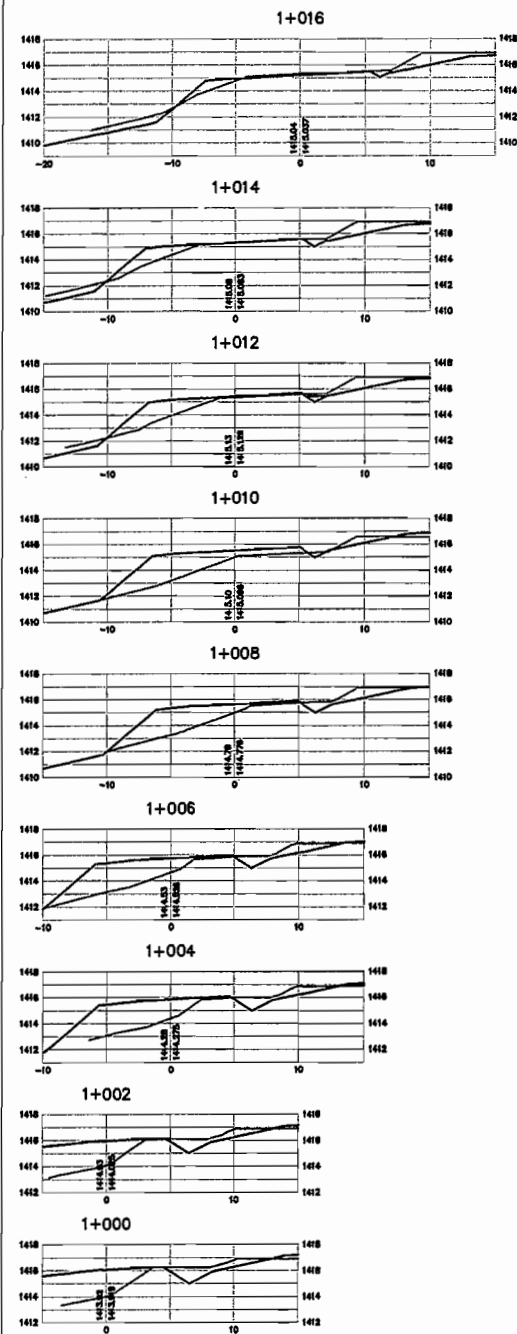

ESTACION	DISTANCIA	AREA	VOLUMEN
0		4.38	
2	2	4.11	8.49
4	2	3.91	8.02
6	2	3.83	7.74
8	2	4.18	8.01
10	2	1.88	6.06
12	2	4.57	6.45
14	2	4.79	9.36
16	2	5.95	10.74
18	2	9.24	15.19
20	2	12.46	21.70
22	2	15.67	28.13
24	2	20.11	35.78
26	2	23.18	43.29
28	2	25.81	48.99
30	2	27.74	53.55
32	2	29.58	57.32
34	2	32.23	61.81
36	2	34.72	66.95
38	2	37.05	71.77
40	2	26.34	63.39
42	2	24.43	50.77
44	2	7.89	32.32
46	2	5.75	13.64
48	2	2.91	8.66
50	2	1.50	4.41
52	2	0.99	2.49
52.66	0.66	1.02	0.66
TOTAL			745.69

