**Constructora Prouvika S.A. de C. V.**

R.F.C. CPR1108125Z8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA**C 279**

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	NO IDENTIFICADO	Pago en una sola Exhibición	2016-07-15T10:27:37	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCALPERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P.31370**Folio Fiscal**

4B531A29-C166-48CA-A47B-93B20469429B

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000**No de Serie de Certificado del SAT**

00001000000202453260

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000400248443

Fecha y hora de certificación

2016-07-15T10:27:38

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) ÚLTIMA DE LOS TRABAJOS DE GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA, DEL CONTRATO No. 143/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN.	\$ 130,741.65	\$ 130,741.65
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: .2% DIF- \$ 261.48 .2% CMIC- \$ 261.48 .2% I.C.I.C- \$ 261.48 SUMA- \$ 784.44 NETO A RECIBIR- \$ 150,875.87	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 31/100 M.N

OBSERVACIONES*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DIA ULTIMO DE CADA MES.
*EFECTOS FISCALES AL PAGO.
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.**SUBTOTAL**

\$ 130,741.65

DESCUENTO

\$

IVA 16.00 %

\$ 20,918.66

TOTAL

\$ 151,660.31

Sello digital del CFDI

c0NWGsCn4UeZnmOP7oIGmXG+2svfUgEXoaUvq3ur/36SVzpk2kemq+XXH111+eQIML0sBhPelC3CdeBjd4kD6h0B7cqJoTL9hZYU6EQmBkpV/L67klzD0wLW/YsuoOvTovdkK52aT4Pdnjw5KocpuqedHDSemaDhXkqF5H3Y3Uew1zS92GL/F4Q+eplo21YlYwIS/br/vda5sR8x+sdK9ru3NNZcXo9ELd5dw1TSBQwBr3x/1DFG9/QPBCanBGZEN5Nlc4ILg2DjzSD84EITOb/1RTmQIUOvswSGWclikeQ32ERFNPB11Ly0trgXgPTmiejzkg==

Sello del SAT

cw1qdvCB1LCoelUeT9zLh2ZZYecRjyC+sd0smDVXMuPLaEb5s1HmE+3TCQphBVWObVFJPgpJ5SbeG+q2CPGaDHXMA2JMLOMhfnW+Dj52rNkUJ/HdlaevbBLUnouAGNMvMFsvz8sEE7D/YHjF5WKOx5cGnvcl0AIXaf95fb0c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]4B531A29-C166-48CA-A47B-93B20469429B[2016-07-15T10:27:38]c0NWGsCn4UeZnmOP7oIGmXG+2svfUgEXoaUvq3ur/36SVzpk2kemq+XXH111+eQIML0sBhPelC3CdeBjd4kD6h0B7cqJoTL9hZYU6EQmBkpV/L67klzD0wLW/YsuoOvTovdkK52aT4Pdnjw5KocpuqedHDSemaDhXkqF5H3Y3Uew1zS92GL/F4Q+eplo21YlYwIS/br/vda5sR8x+sdK9ru3NNZcXo9ELd5dw1TSBQwBr3x/1DFG9/QPBCanBGZEN5Nlc4ILg2DjzSD84EITOb/1RTmQIUOvswSGWclikeQ32ERFNPB11Ly0trgXgPTmiejzkg=[00001000000202453260]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT

B1SOFT
PROVEEDOR AUTORIZADO DE FACTURA
ELECTRONICA
(01) 636-6038
Cel 04455-43189032
contacto@b1-soft.com
www.b1-soft.com**B1SOFT**
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DEL SAT: 00285



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

CPR1108125Z8

Folio Fiscal

4B531A29-C166-48CA-
A47B-93B20469429B

Total del CFDI

\$151,660.31

Nombre o Razón Social del
Emisor

Constructora Prouvika S.A. de C. V.

Fecha de Expedición

2016-07-15T10:27:37

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-07-15T10:27:38

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

STB080508339



[Handwritten signatures and marks]



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 143/2016	CONTRATADOS
OBRA: GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) ULTIMA	\$ 450,185.90 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 151,660.31 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 298,525.59 CON IVA
RFC CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 450,185.90 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$130,741.65	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 130,741.65

DESCUENTOS

0.2% DIF		261.48
0.2% CMIC	\$	261.48
0.2% I.C.I.C.	\$	261.48
SUMA DESCUENTOS		784.44

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	130,741.65
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	130,741.65
I.V.A.	\$	20,918.66
TOTAL	\$	151,660.31

(CON LETRA)

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 31/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	784.44
SALDO NETO A RECIBIR	\$	150,875.87

Vo. Bo.

ELABORO

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ
SUPERVISION CONTRATADO DE OBRA

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO

ING. ENRIQUE LARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE

OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

AUTORIZO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE JULIO DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE \$ **150,875.87**
(CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) ULTIMA CONTRATO No. 143/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 450,185.90
SON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTAY CINCO PESOS 90/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **130,741.65**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL	\$ 130,741.65
		IVA	\$ 20,918.66
		TOTAL	\$ 151,660.31
DIF 0.2%	\$261.48		
CMIC 0.2%	\$261.48		
I.C.I.C. 0.2%	\$261.48		
SUMA	\$784.44		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 450,185.90
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 298,525.59
ESTA ESTIMACION	\$ 151,660.31
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 450,185.90
POR EJERCER	\$ (0.00)

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	DIF 0.2%	CMIC 0.2%	I.C.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 514.70	\$ 514.70	\$ 514.70
ESTA ESTIMACION	\$ 261.48	\$ 261.48	\$ 261.48
ACUMULADO ACTUAL	\$ 776.18	\$ 776.18	\$ 776.18

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR110812528

CONTRATIST: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V. PERÍODO: DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>OBRA NORMAL</u>		
1.00	<u>TERRACERIAS</u>	130,741.65
		\$ 59,459.80
<u>ACABADOS</u>		
4.00		\$ 33,929.35
<u>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</u>		
5.00		\$ 37,352.50
SUBTOTAL		130,741.65
I.V.A.		20,918.66
TOTAL		151,660.31

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) ULTIMA

PERIODO: DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2016

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
1.00	OBRA NORMAL							
	TERRACERIAS							
1.01	Relleno con material sub-base con arena limosa no plástica (vrs 50%), compactada por cualquier medio al 95% en capas no mayores de 0.20 m. de espesor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1,523.83	1,523.83	1,231.04	292.79001	\$ 203.08	\$59,459.80
4.00	ACABADOS							
4.01	Losa de 10 cm. De espesor de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, incluye: regleado, nivelado, suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cimbrado en froteras, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	140.50	140.50	0.00	140.50	\$ 241.49	\$33,929.35
5.00	INSTALACION ELÉCTRICA							
5.01	Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared delgada incluye: canalización, soportes, cableado maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	salida	25.00	25.00	0.00	25.00	\$ 1,494.10	\$37,352.50

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

Pag 1 de 1

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ

TRAMO:

OBRA :	GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA ETAPA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA POURVIKA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2016
-------------------	---------	--

CONCEPTO

Relleno con material sub-base con arena limosa no plástica (vrs 50%), compactada por cualquier medio al 95% en capas no mayores de 0.20 m. de espesor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OPERACIONES ARITMETICAS

CROQUIS

VOLUMEN A
PAGAR

292.79
m3

ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ

~~CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.~~

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO : 143/2016	TRAMO:
OBRA : GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2016
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
4.01 Losa de 10 cm. De espesor de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, incluye: regleado, nivelado, suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado en froteras, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	$\begin{aligned} 40.40 \times .90 &= 36.36 \text{ m}^2 \\ .90 \times .90 &= .81 \text{ m}^2 \\ 1.50 \times 1.00 &= 1.50 \text{ m}^2 \\ 3.50 \times 3.50 &= 12.25 \text{ m}^2 \\ 18.95 \times 4.25 &= 78.42 \text{ m}^2 \\ 13.5 \times .90 &= 5.4 \text{ m}^2 \\ 2.90 \times 2.40 &= 5.76 \text{ m}^2 \\ \hline &140.50 \text{ m}^2 \end{aligned}$	VOLUMEN A PAGAR 140.50 m2



ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNÁNDEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO : 143/2016	TRAMO:
OBRA : GIMNASIO DE LA NORMAL SUPERIOR "JOSE E. MEDRANO" 2DA. ETAPA	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2016
-------------------	---------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
5.01 Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared delgada incluye: canalización, soportes, cableado maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			25.00 salida




ARQ. NANCY MAGDALENA PALLARES HERNANDEZ



CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.




GINNASIO DE LA ESCUELA NORMAL PROF. JOSE MEDRANO CONCEPTO EXTRAORDINARIO SL

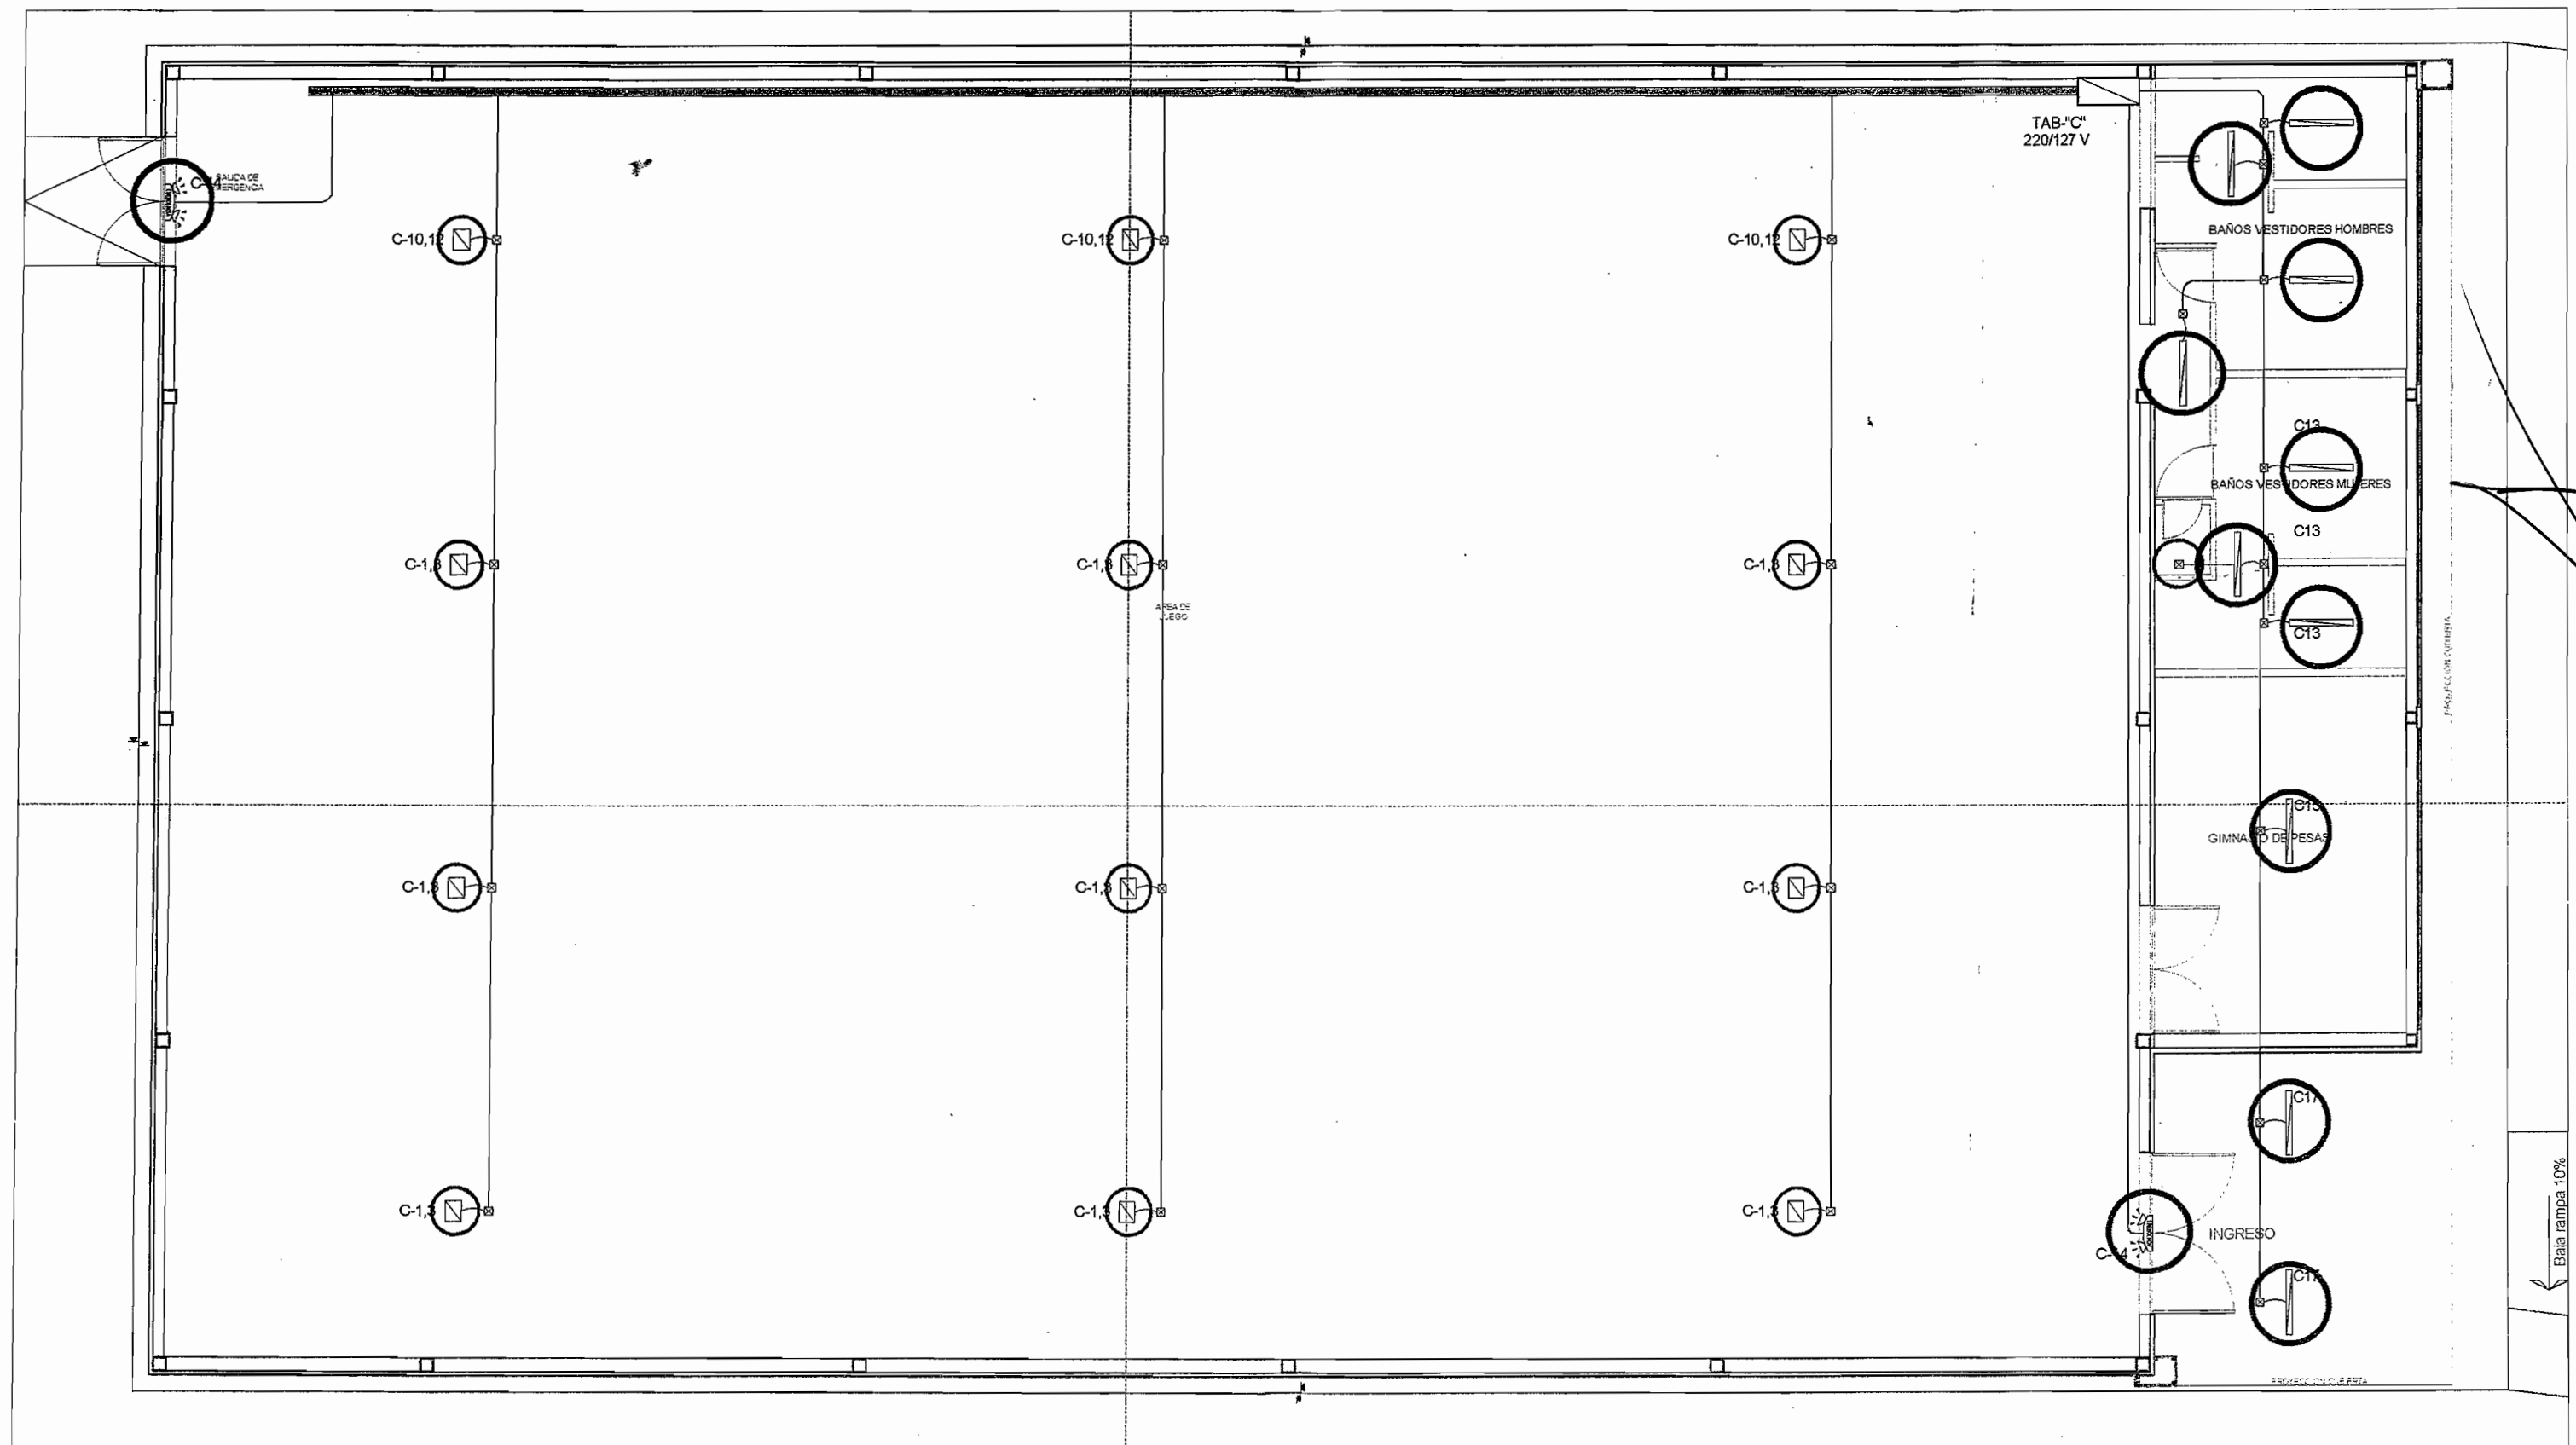


CANTIDAD ESTIMADA:




$1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=$ 25zas.

- CONCEPTO EXTRAORDINARIO SL
SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO
CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA INCLUYE : CANALIZACIÓN,
SOPORTES, CABLEADO MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

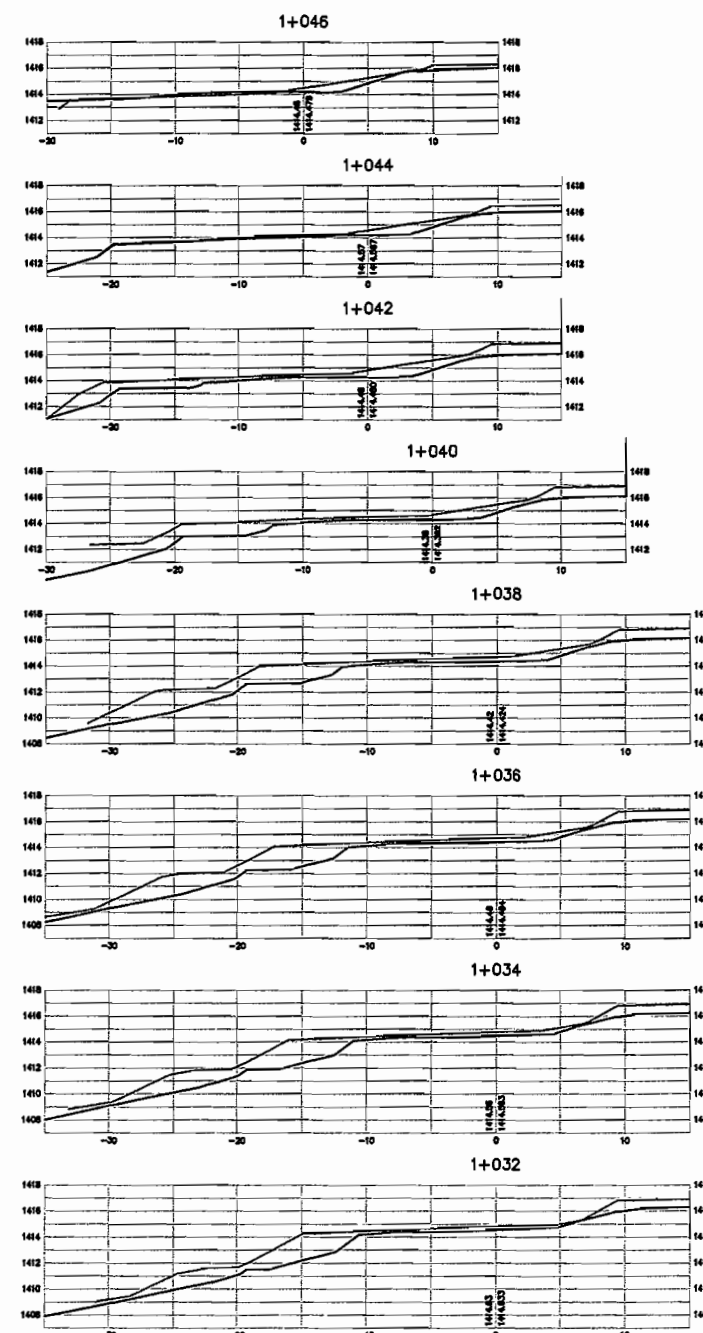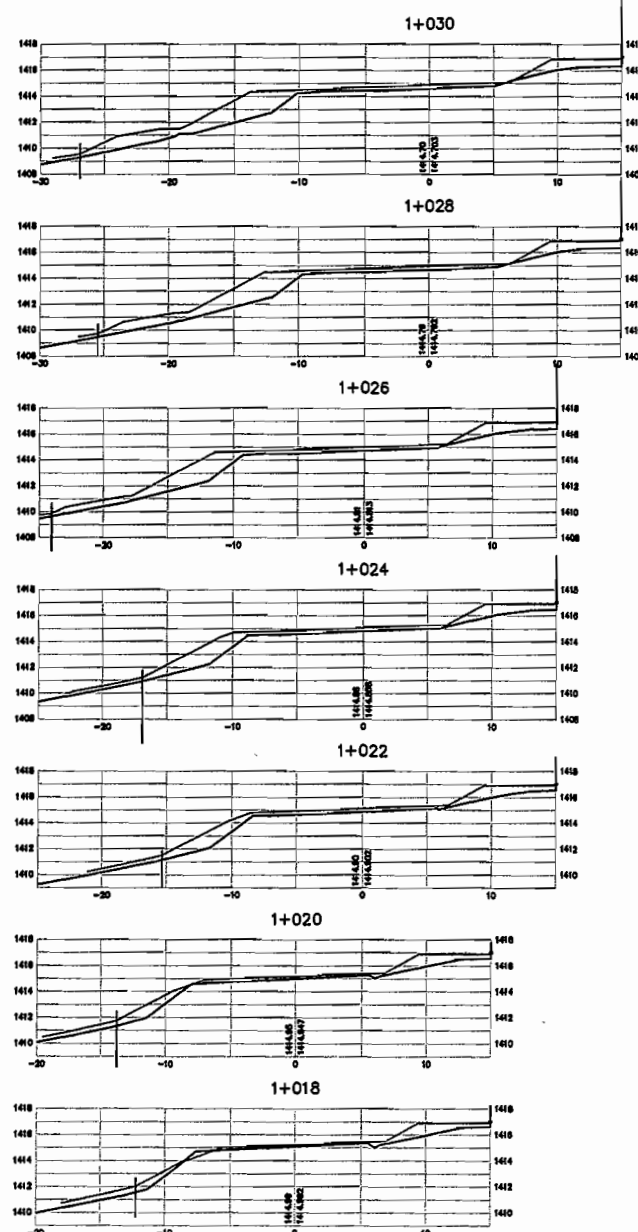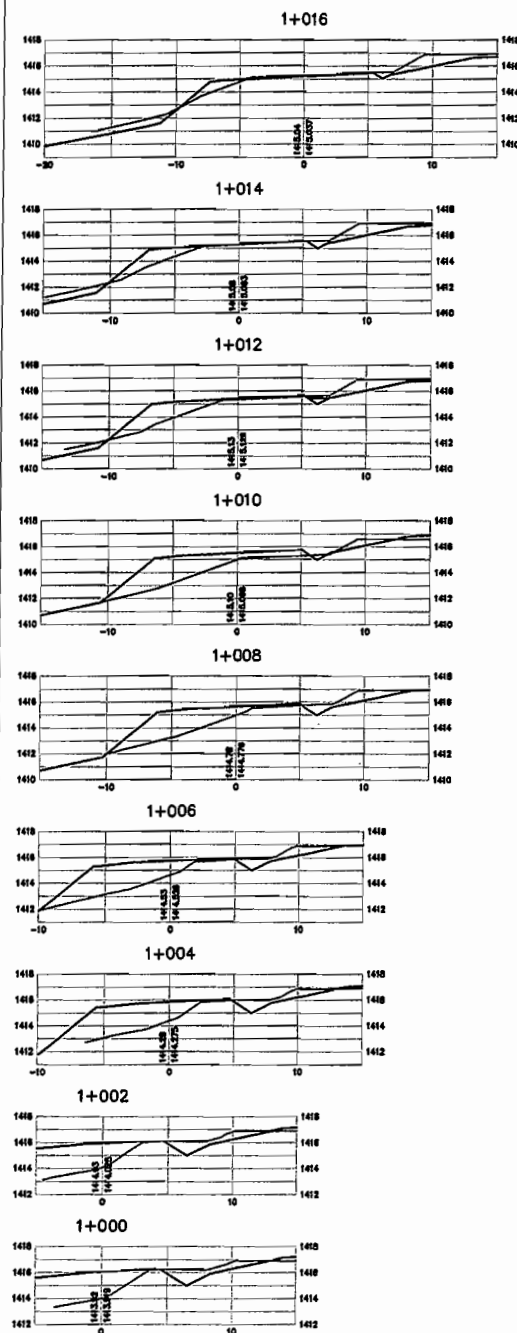

ESTACION	DISTANCIA	AREA	VOLUMEN
0		4.38	
2	2	4.11	8.49
4	2	3.91	8.02
6	2	3.83	7.74
8	2	4.18	8.01
10	2	1.88	6.06
12	2	4.57	6.45
14	2	4.79	9.36
16	2	5.95	10.74
18	2	9.24	15.19
20	2	12.46	21.70
22	2	15.67	28.13
24	2	20.11	35.78
26	2	23.18	43.29
28	2	25.81	48.99
30	2	27.74	53.55
32	2	29.58	57.32
34	2	32.23	61.81
36	2	34.72	66.95
38	2	37.05	71.77
40	2	26.34	63.39
42	2	24.43	50.77
44	2	7.89	32.32
46	2	5.75	13.64
48	2	2.91	8.66
50	2	1.50	4.41
52	2	0.99	2.49
52.66	0.66	1.02	0.66
TOTAL			745.69

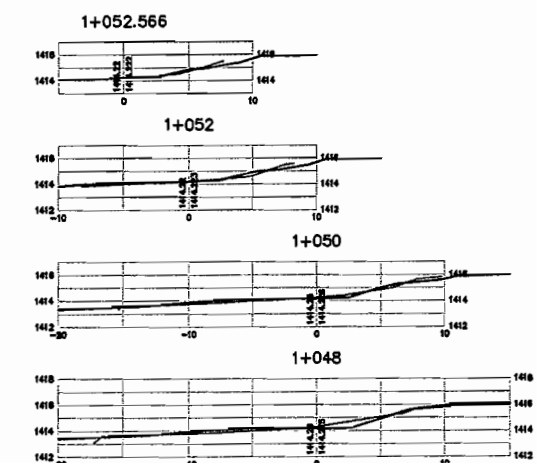

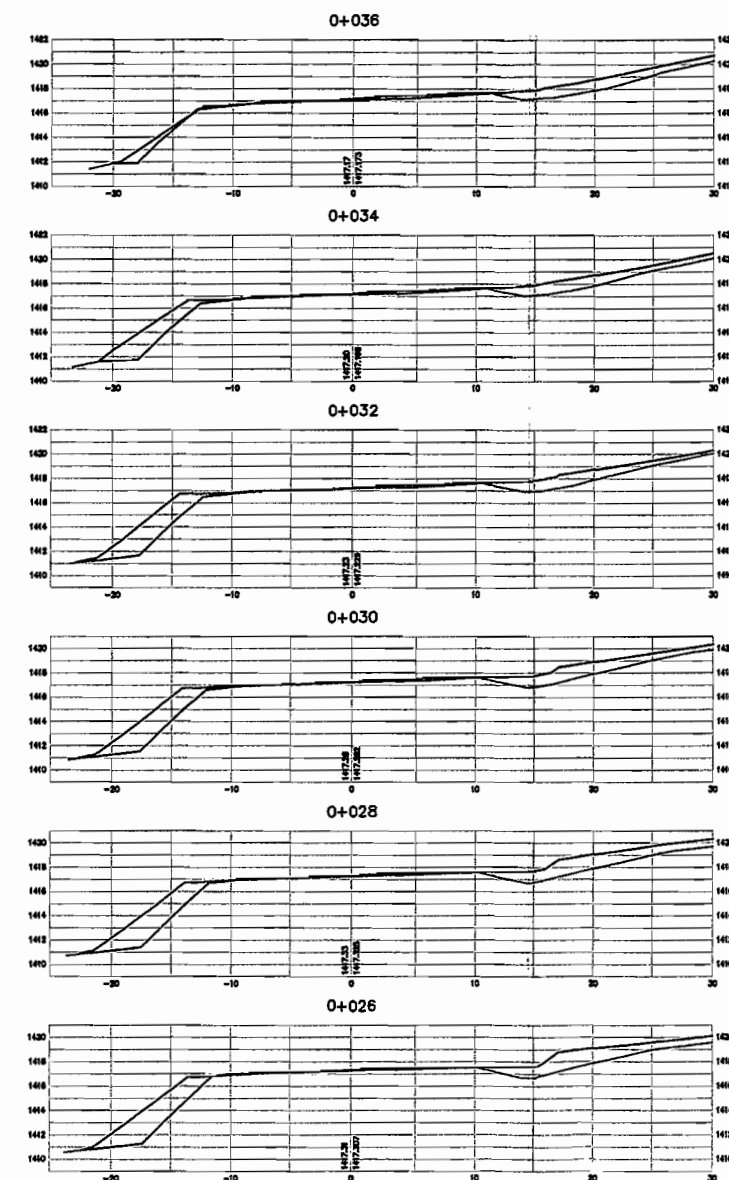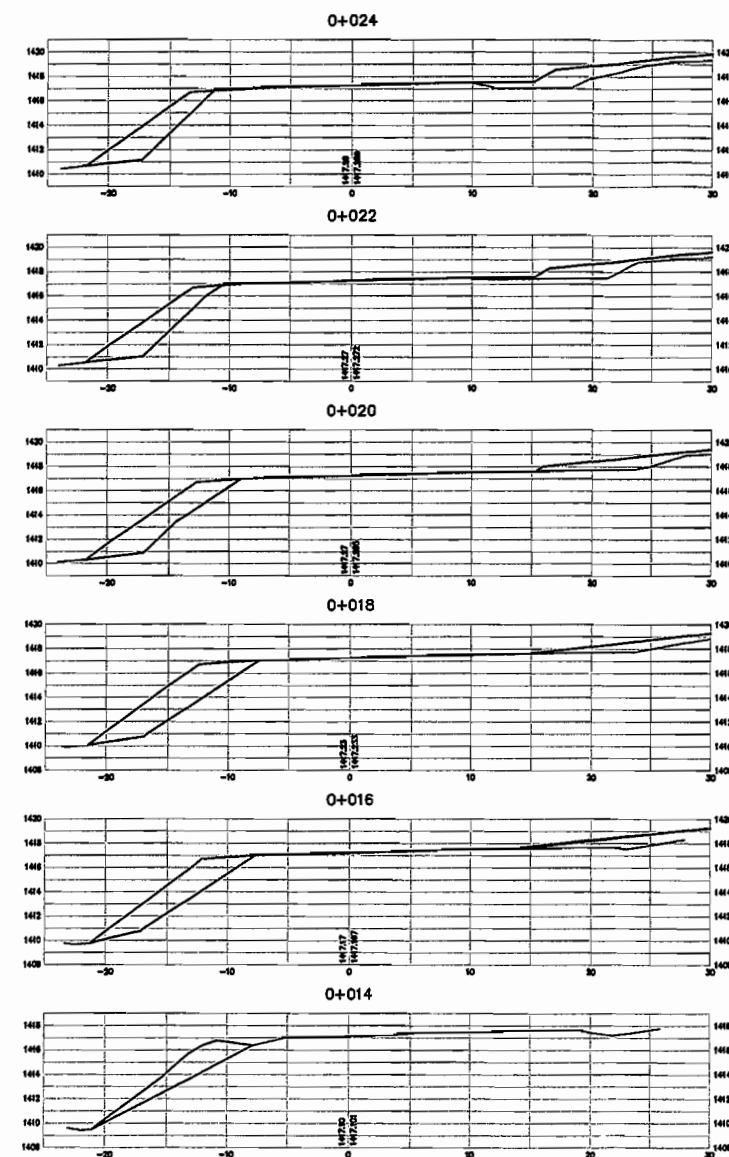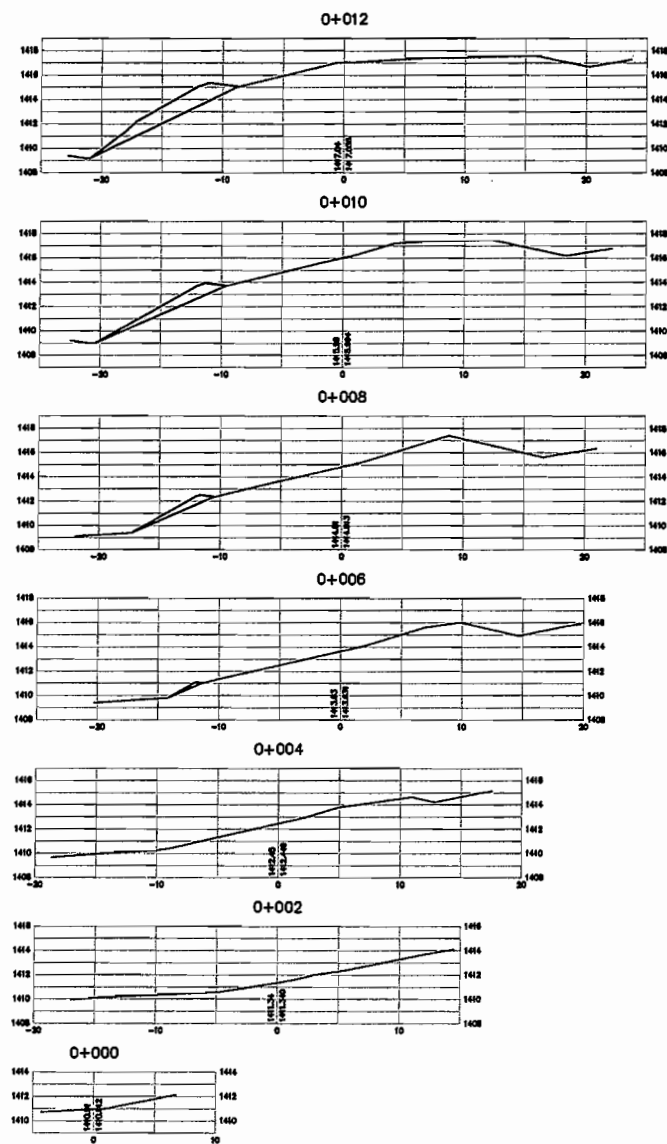

ESTACION	DISTANCIA	AREA	VOLUMEN
0		0.00	
2	2	0.00	0.00
4	2	0.00	0.00
6	2	0.38	0.38
8	2	2.33	2.71
10	2	5.92	8.25
12	2	12.13	18.05
14	2	15.51	27.64
16	2	21.74	37.45
18	2	26.35	48.09
20	2	20.89	47.24
22	2	17.74	38.63
24	2	16.96	34.70
26	2	15.98	32.94
28	2	15.28	31.26
30	2	14.90	30.18
32	2	14.48	29.38
34	2	11.24	25.72
36	2	2.82	14.06
TOTAL			426.48

