



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV
COS120125CA2
Domicilio Fiscal
HUANCUNE 1808
Col. ARBOLEDAS 31114
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 4217627

Factura No: 190

FOLIO FISCAL (UUID):

42AC2715-9705-4A63-A74C-FF27D7943C88

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000302529149

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-10-27T16:02:53

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-10-27T15:57:53

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua

Fecha de Expedición: 27 octubre 2016

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Clave de Moneda: MXN

Método de Pago: 02-Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCION DDE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) SEGUN CONTRATO NUM 144/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 37,938.35 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 75.87 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 75.87 D.I.F. DEL 0.2% \$ 75.87 SUMA \$ 227.61 NETO A RECIBIR \$ 43,780.87	\$ 37,938.35	\$ 37,938.35

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS, 48/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 37,938.35
IVA(IVA 16.00%): \$ 6,070.13
TOTAL: \$ 44,008.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aW2PHO2uA2U0kXw0RyoQLnR5JmRGSLLPdUfAdXyRFBXOPzFyzBzNRYxd3B0dUzTQo1KAZClpH4RHmH9ZsksGH7BmIz9MF75ezCe7/RQGHsdka1NnA1pE4Dy1rQLbXEC9W9AwS2edc9f8tY8evT7ZA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

8vXNK7oRvyrEJT3X61SdVpDYs4FkAnChIKhmNMN8vY441YA3n0QvDvKjHQSOQys4Ac5yhuJmC83qB230mapbWCGKTVX7WtAJ8aBdnSvyBTW0K3YKQz/TPOSH6APhWwEo74sGbFkDQnY0Xwps76Tng9BSzLM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1101042AC2715-9705-4A63-A74C-FF27D7943C88(2016-10-27T16:02:53)aW2PHO2uA2U0kXw0RyoQLnR5JmRGSLLPdUfAdXyRFBXOPzFyzBzNRYxd3B0dUzTQo1KAZClpH4RHmH9ZsksGH7BmIz9MF75ezCe7/RQGHsdka1NnA1pE4Dy1rQLbXEC9W9AwS2edc9f8tY8evT7ZA=0000100000203495276



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
Cof. SAT 55716






Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor



Proporcione los dígitos de la imagen

[Verificar CFDI](#)

CustomValidator

RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
COS120125CA2	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
42AC2715-9705-4A63-A74C-FF27D7943C88	2016-10-27T15:57:53	2016-10-27T16:02:53	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	Fecha de Cancelación
\$44,008.48	ingreso	Vigente	

Handwritten signature

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 144/2106	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE	ESTIMACIÓN No. 2 ULTIMA	\$ 422,880,27
	PERÍODO EJEC. 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	
UBICACIÓN: EJIDO GUADALUPE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 44.008,48 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 364.068,47 CON IVA
RFC COS-120125-CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 408.076,95 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 33.155,03	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 4.783,32	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 37.938,35	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.		75,87
0.2% I.C.I.C.	\$	75,87
0.2% D.I.F.	\$	75,87
0.5% INSP. Y VIGILANCIA.		0,00
SUMA DESCUENTOS	\$	227,61
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	37.938,35
AMORT ANTICIPO	\$	0,00
SUB-TOTAL	\$	37.938,35
I.V.A.	\$	6.070,13
TOTAL	\$	44.008,48
(CON LETRA)		
(CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS 48/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	227,61
SALDO NETO A RECIBIR	\$	43.780,87

AUTORIZO	ELABORO
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
URBANA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 87/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 2 ULTIMA CONTRATO No. 144/2106 POR LA CANTIDAD DE : \$ 422,880,27
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100
REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE

\$ 43.780,87
COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 37.938,35
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

SUBTOTAL \$ 37.938,35
IVA \$ 6.070,13
TOTAL \$ 44.008,48

C.M.I.C. DEL 0.2% 75,87
I.C.I.C. DEL 0.2% 75,87
D.I.F. DEL 0.2% 75,87
INSP. Y VIGILANCIA. DEL 0.5% 0,00
SUMA 227,61

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 422,880,27

\$ -
\$ 364.068,47
\$ 44.008,48
\$ 408.076,95
\$ 14.803,32

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0,2% IC.I.C. 0,5% INSP. Y VIGILANCIA

ACUMULADO ANTERIOR \$ 627,70 \$ 627,70 \$ 627,70 \$ -
ESTA ESTIMACION \$ 75,87 \$ 75,87 \$ 75,87 0,00
ACUMULADO ACTUAL \$ 703,57 \$ 703,57 \$ 703,57 \$ -

RECIBIMOS

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
COS-120125-CA2

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E
IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE

MUNICIPIO: EJIDO GUADALUPE No. CONTRATO: 144/2106

ESTIMACIÓN No. 2 ULTIMA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.

PERÍODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	33.155,03
	<u>EXCEDENTES</u>	4.783,32
	<u>EXTRAS</u>	0,00

SUBTOTAL 37.938,35 ✓

I.V.A. 6.070,13 ✓

TOTAL 44.008,48

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

POR EL RESIDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO	OL. ESTIMADO	UNITARIO	

OBRA NORMAL

33.155,03 ✓

CIMENTACION Y PISO

2)	1.- RENIVELACION DE PISO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO ,ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. PICADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA , Y PEGACRETO.	M2	296,00	280,69	0,00	280,69	100,93	28.330,04 ✓
14	REPIJADO DE LAMINA EXISTENTE Y SELLO DE LAS PIJAS EXISTENTES.	M2	264,00	264,00	261,54	2,46	16,70	41,08 ✓
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE AISLAMIENTO CON POLIURETANO DE 1" DE ESPESOR EN LAMINA.	M2	264,00	264,00	261,54	2,46	168,70	415,00 ✓
17	ROTULACION DE EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS Y MUNICIPIO (LOGOTIPO DE 1.5 X 2.5 MTS.) DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,00	2,00	0,00	2,00	1.218,88	2.437,76 ✓
19	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	296,00	280,69	0,00	280,69	6,88	1.931,15 ✓

EXEDENTES

4.783,32 ✓

14	REPIJADO DE LAMINA EXISTENTE Y SELLO DE LAS PIJAS EXISTENTES.	M2	264,00	289,80	264,00	25,80	16,70	430,86 ✓
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE AISLAMIENTO CON POLIURETANO DE 1" DE ESPESOR EN LAMINA.	M2	264,00	289,80	264,00	25,80	168,70	4.352,46 ✓

EXTRAS

0,00

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

POR EL RESIDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1 / 2

CONTRATO : 144/2106		TRAMO:	EJIDO GUADALUPE
OBRA : REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.
No DE ESTIMACION: 2	PERIODO :1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	CROQUIS	VOLUMEN

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
VER CROQUIS	
VER CROQUIS	280.69
	28.26 M2
	28.26 M2


RÉSIDENTE

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 2/2

CONTRATO : 144/2016	TRAMO:	EJIDO GUADALUPE
OBRA : REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A DE C.V.

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO :1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016

[illegible]

Stamuel E. Berch
RESIDENTE


CROQUIS	VOLUMEN
	A PAGAR
VER CROQUIS	2.0 PZAS.
	280.69 M2

CONTRATIS




REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA Y
ELEMENTOS PECUARIOS EN EJIDO GUADALUPE.


FACHADA FRONTAL INTERIOR

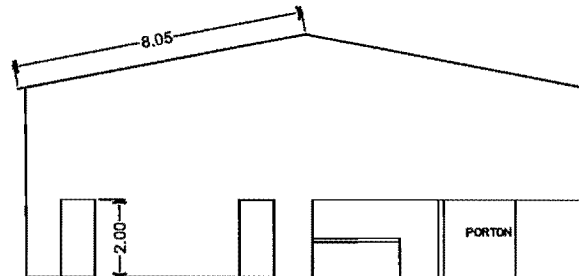

FACHADA POSTERIOR INTERIOR

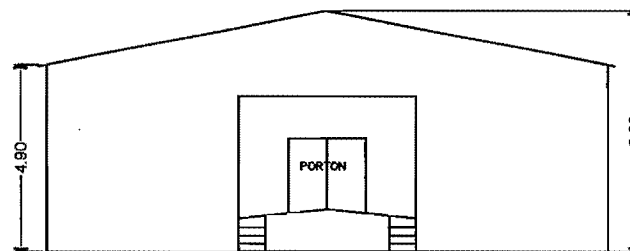








FACHADA LATERAL INTERIOR

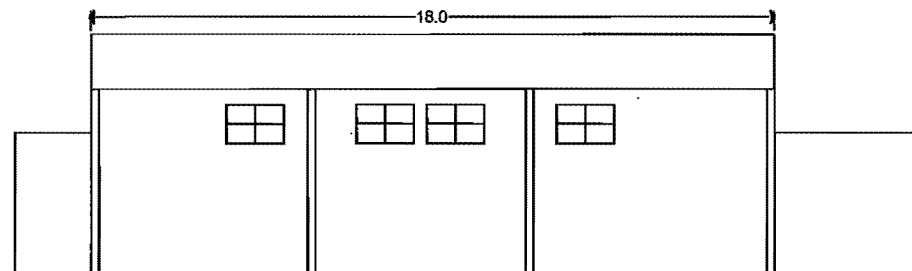

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

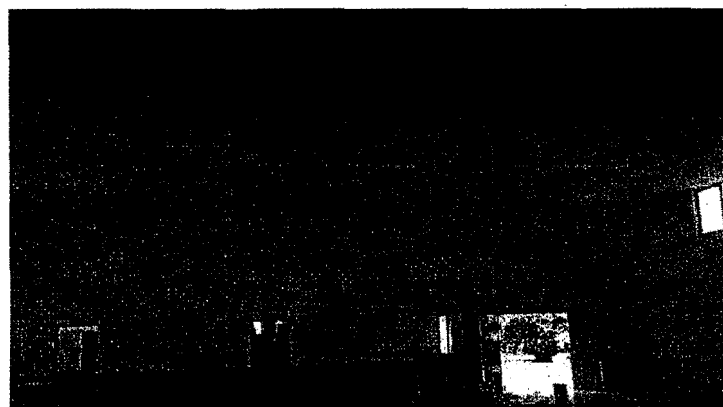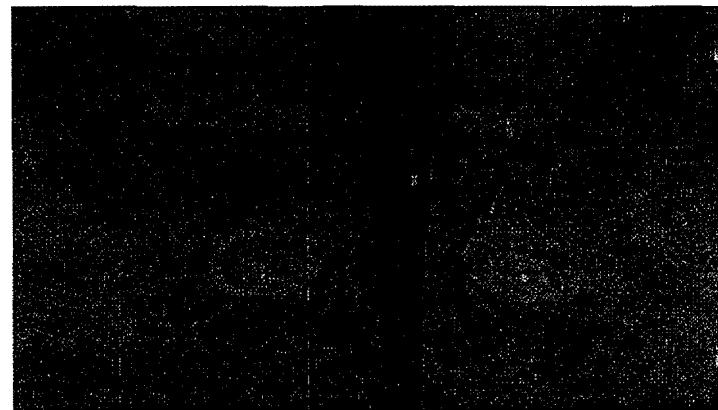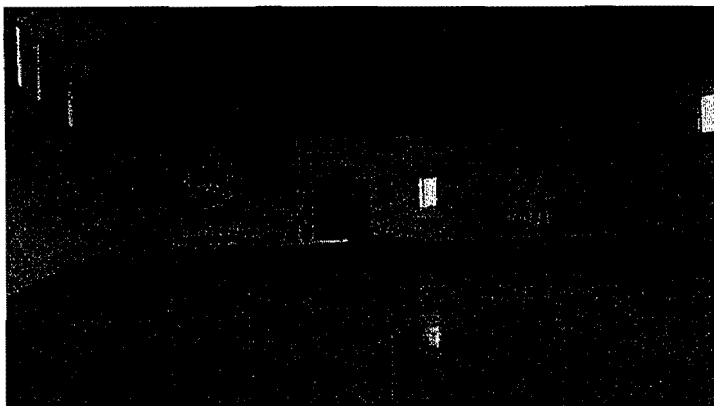

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
