



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 149/2016

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186, 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2016, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS BÁSICOS: CONTRATO NÚMERO: 149/2016 P.D. DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2016.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$196,865.97 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 149/2016

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

MUNICIPAL: 2016-PDM-FISMREF/11-DR-001, 016-PDM-FISMREF/12-DR-001, 016-PDM-FISMREF/13-DR-001, 016-PDM-FISMREF/14-DR-011 Y 2016-PDM-FISM-DR-081

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	PAGARÉ	FOLIO 1/1	FECHA 11 DE JULIO DE 2016	IMPORTE \$99,816.08
---	--------	--------------	---------------------------------	------------------------

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 06 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2016.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 11 DE JULIO DE 2016.

BITÁCORA

FECHA DE INICIO

06/07/2016

FECHA DE CIERRE 11/07/2016.

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	\$196,865.97
SUBTOTAL	\$196,865.97
I.V.A	\$31,498.56
TOTAL	\$228,364.53

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$00.00 C/IVA

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 149/2016

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA C. JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 149/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 149/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO.

En Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 20 de Julio de 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 05 de JULIO de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 149/2016 con el contratista C. JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ, por un monto de: \$196,865.97 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$196,865.97 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **20 de Julio de 2016.**



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 149/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua Chih., del día 20 de Julio de 2016 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO

Ejecutada por: JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ

R.F.C. GAFL670419GGA

Contrato No. 149/2016	Monto con Iva \$ 228,364.53	Período Contratado: 06 al 20 de Julio de 2016	Elaborado: Julio 5 del 2016
Anticipo del 0%	\$0.00	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:

Recursos 2016
OFICIO AUTORIZACION 2016-POM-FISMREF/11-DR-001 \$ 228,364.53
2016-POM-FISMREF/12-DR-001, 2016-POM-FISMREF/13-DR-001,
2016-POM-FISMREF/14-DR-011 Y 2016-POM-FISM-DR-081
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 228,364.53

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCION
Anticipo Estimación 1		Normales	Nº 115	196,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul 6 del 2016
TOTALES				196,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,183.34	228,364.53	228,364.53	Jul 11 del 2016

COSTO DE OBRA:	228,364.53	AMORTIZACIÓN:	0.00	EJERCIDO:	228,364.53	PERÍODO REAL:	Jul 6 del 2016	Jul 11 del 2016
POR CANCELAR:	0.00	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET 0.2% C.M.I.C.	393.73	RET 0.2% D.I.F.
				</				

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ

JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

ING. ENRIQUE VALARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO						
1	COPIA DE COMPLETO PARA LA COMUNIDAD EL VALLECILLO	0	0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE 15 HP, 460 V 6" PH3 MARCA FRANKLIN.	PZA	1	\$ 40,877.50	\$ 40,877.50	1.00	40,877.50	0.00	40,877.50
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE P/15 HP MODELO R150-37 MARCA ALTAMIRA PARA 1 CTD DE 176 MTS.	PZA	1	\$ 28,451.45	\$ 28,451.45	1.00	28,451.45	0.00	28,451.45
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BOMBA SUMERGIBLE No. 3X6 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE.	MTS	145	\$ 120.95	\$ 17,537.75	145.00	17,537.75	0.00	17,537.75
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE ROSCAS Y COPLS.	ML	131.2	\$ 373.47	\$ 48,999.26	131.20	48,999.26	0.00	48,999.26
1.1	METODO Y EQUIPO A UTILIZAR PARA AFORO DE POZO EN LA COMUNIDAD DEL VALLECILLO	0	0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	BOMBA TIPO TURBINA DE 10 PASOS DE 6" LUBRICADA POR AGUA	PZA	1	\$ 18,519.59	\$ 18,519.59	1.00	18,519.59	0.00	18,519.59
1.1.2	COLUMNA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 220 MTS.	ML	220	\$ 78.90	\$ 17,358.00	220.00	17,358.00	0.00	17,358.00
1.1.3	SONDA NEUMATICA PARA DETECCION DE NIVEL.	ML	220	\$ 17.47	\$ 3,843.40	220.00	3,843.40	0.00	3,843.40
1.1.4	CABEZAL DE 6" X6"	PZA	1	\$ 1,345.50	\$ 1,345.50	1.00	1,345.50	0.00	1,345.50
1.1.5	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 150HP CON CABEZAL DE ENGRANES PARA VELOCIDAD VARIABLE.	PZA	1	\$ 5,885.19	\$ 5,885.19	1.00	5,885.19	0.00	5,885.19

9

gab

CA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
1.1.6	EL AFORO SE DESARROLLARA DURANTE 8 HORAS DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTO PRETENDIDO 3.30 LPS: 0 A 1/2 HORA ARRANQUE DE BOMBEO CON 100 RPM. 1/2 A 1 HORA AUMENTO DE VELOCIDAD A 200 RPM. 1 A 1 1/2 HORA AUMENTO DE VELOCIDAD A 400 RPM. 1 1/2 A 2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 600 RPM. 2 A 2 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 800 RPM. 2 1/2 A 3 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1000 RPM. 3 A 3 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1200 RPM. 3 1/2 A 4 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1400 RPM. 4 A 4 1/2 HORAS AUMENTO DE VELOCIDAD A 1500 RPM. HASTA ESTE PUNTO SE SONDEARA EN CADA INCREMENTO DE VELOCIDAD PARA REGISTRAR EL ABASTECIMIENTO DEL POZO. 4 1/2 A 5 HORAS DESACELERACION A 1300 RPM. 5 A 5 1/2 HORAS DESACELERACION A 1100 RPM. 5 1/2 A 6 HORAS DESACELERACION A 900 RPM. 6 A 6 1/2 HORAS DESACELERACION A 700 RPM. 6 1/2 A 7 HORAS DESACELERACION A 500 RPM. 7 1/2 A 8 HORAS DESACELERACION A 100 RPM. HASTA ESTE PUNTO SE SONDEARA EN CADA CAMBIO DE VELOCIDAD A LA BAJA PARA REGISTRAR EL NIVEL DE RECUPERACION DEL POZO. POR ULTIMO SE ACCELERARA HASTA LAS 1500 RPM PARA DETERMINAR EL NIVEL DINAMICO CON UN GASTO DE 3.30 LPS. NOTA: SI LOS NIVELES NO MUESTRAN ABATIMIENTO CON 3.30 LPS SE INCREMENTARA EL GASTO HASTA CONOCER EL MAXIMO DE APORTACION DEL POZO.	HR	8	\$ 693.54	\$ 5,548.32	8.00	0.00	5,548.32
0	MANO DE OBRA PARA LA RELOCALIZACIÓN DE EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN DE POZO TANQUE EN LA COMUNIDAD DE EL VALLECILLO, QUE INCLUYE: VIATICOS Y TRANSPORTACIÓN ASOCIADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	UNIDAD	1	\$ 8,500.01	\$ 8,500.01	1.00	0.00	8,500.01
					SUBTOTAL \$ 196,865.97	\$ 196,865.97		\$ 196,865.97
					IVA \$ 31,498.56	\$ 31,498.56		\$ 31,498.56
					TOTAL \$ 228,364.53	\$ 228,364.53		\$ 228,364.53

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 20 de Julio de 2016 según contrato de obra pública 149/2016.

POR EL CONTRATISTA

JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNÁNDEZ

POR EL CONTRATANTE


ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

Cat. 149/2016

ESTADO	CHIHUAHUA
MUNICIPIO	CHIHUAHUA
LOCALIDAD	EJIDO EL VALLECILLO
NO. AGEB	INDICAR EL NUMERO DE AGEB EN LA QUE SE ENCUENTRA LA OBRA
NOMBRE DE LA OBRA	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL VALLECILLO
CONSECUTIVO ID IMMSI	

FECHA	DA	MES	AÑO
25	6	2016	


DOMICILIO CONOCIDO	
CALLE	S/N
NO.	
COLONIA	EJIDO EL VALLECILLO
CODIGO POSTAL	31001



1.- ¿SE INFORMÓ A LA POBLACIÓN SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA?	SI ☒ NO ☐	SE LES DIO AVISO A LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO VECINOS AL LUGAR
2.- ¿DURANTE EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, ¿ESTUVO PRESENTE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA?	SI ☒ NO ☐	SI, SE INVITO A LA POBLACIÓN
3.- ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS BENEFICIARIOS CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA REALIZADA?	SI ☐ NO ☒	NINGUN VECINO O AUTORIDAD MANIFESTÓ INCONFORMIDADES
4.- ¿LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CONCORDAN CON LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTÓ EN LA IMOS?	SI ☒ NO ☐	
5.- ¿LA OBRA CUENTA CON UNA PLACA DONDE SE INDIQUE SU FINANCIAMIENTO CON RECURSOS MAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS?	SI ☒ NO ☐	

NOMBRE	CARGO	CONTACTO
ING. GERARDO FERNANDEZ PEREZ	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	CELULAR: 314 254 9965
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CELULAR: 314 254 9965

ING. GERARDO FERNANDEZ PEREZ	FIRMA

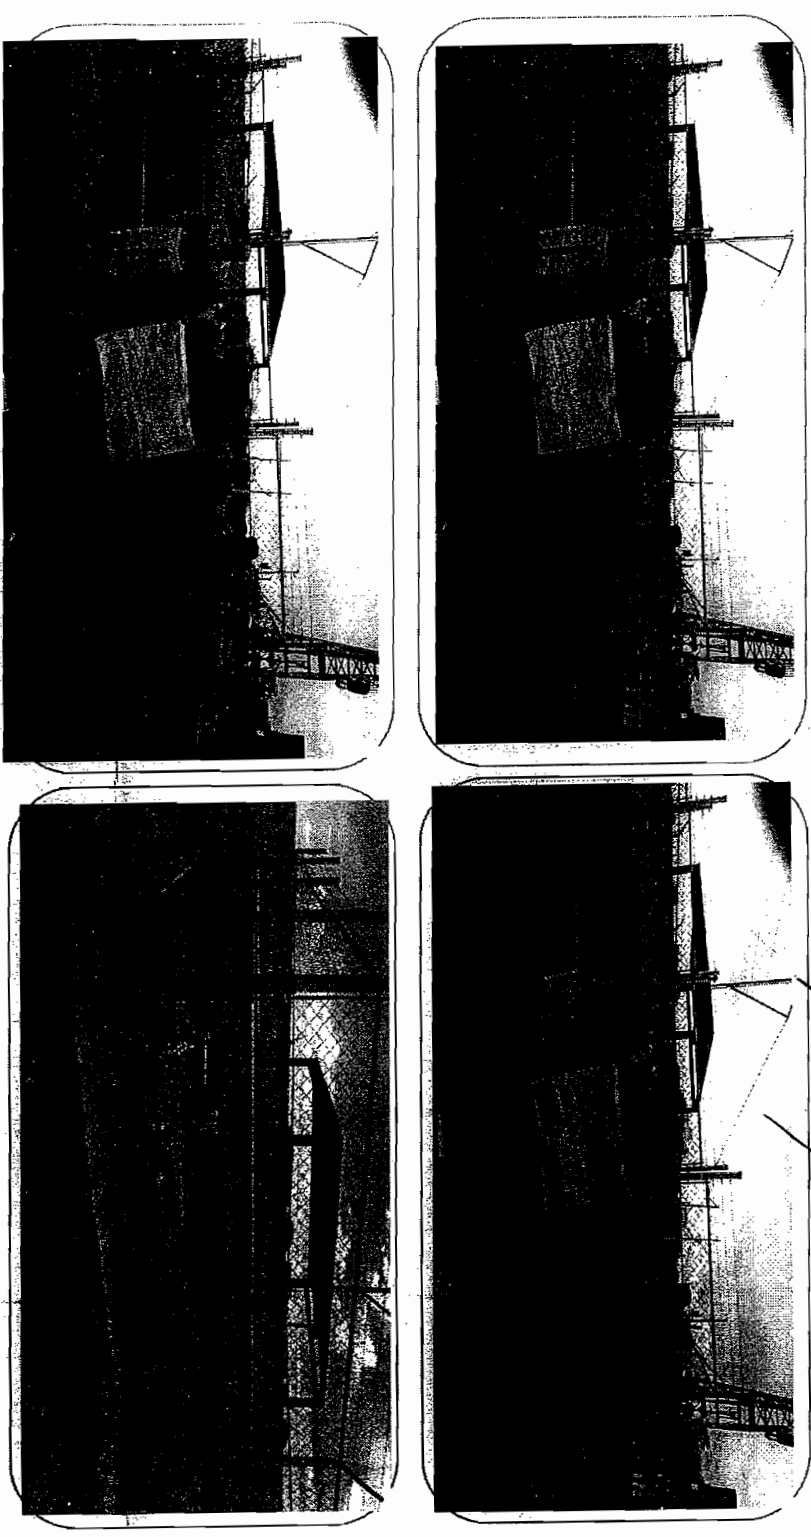

SE CONVOCÓ A POBLADORES Y AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EL VALLECILLO, SE LES DIO EXPLICACIÓN ACERCA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y SE PROCEDIO A LA FIRMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

ING. GERARDO FERNANDEZ PEREZ	FIRMA
