

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua,
Chihuahua
Chihuahua, México C.P. 31125
RFC:HCO110712730
Regimen Fiscal:
No Aplica

FACTURA**Folio Fiscal:**

289127D5-85AA-48AF-B94C-FA5E8FE23061

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2017-01-31T18:17:31

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2017/01/31 T 18:17:31

Serie y Folio:


A269

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA, No. 408, Colonia CENTRO,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. C.P. 31000
RFC:MCI651010V22

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA ESTIMACION NUMERO 3(TRES) SEGUN CONTRATO NUM. 153/2016	1.00	\$ 39,040.77	\$ 39,040.77


FIRMA DEL CONTRATISTA
ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 39,040.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO
0.1% sancion por retraso \$ 294.37
0.2% DIF \$ 78.08
0.2% CMIC \$ 78.08
0.2% ICIC \$ 78.08
SUMA \$ 528.61
NETO A RECIBIR \$ 44,758.68



Total con letra:
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100.-MXN

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:
NA No Aplica

Número de Cuenta:
No Aplica

SUBTOTAL \$ 39,040.77
IVA 16.00% \$ 6,246.52

TOTAL \$ 45,287.29

Sello digital del Emisor:

fXd4YrN5Oxk/ZcBhmuEpCwTavcu0StBF0sLuLGZxMJ53KEO07XObMVg8ad8kEjVfDRnr1s8OVxGt60+LijKc+5njNEa1ncHi4IF8Yz41w8IPz5cxP/IK4AIVW56bvL1sxQSNcJiYazxq7mcCQTalEVH8dc4jFPEPLaF3n0k8n3smCDzyTZA1Jt4EikEbx6RV/bGhLA8HWIKgwGqNiyI7SBHIEpEaG1VeoP3qs0MIRYczZfh6JiG8+ycUrgeWzAGrmZzGp+mPVTEeqHcFqFUF9HLQU0rgUXrqQxa12NXBkrRnQVD5BVzAyKBw7BXSHtW+3eyoTKWa2eD+g==

Sello digital del SAT:

RiHjpL6KIK8Cv0jIk6yM8kOBR011xVtaqsY0CcXTfp66GkbRfVhZ4Sxjk5vdlIAwJp3sT5jWrg9x5dV1XhzzJq0vLUnh+SCIG0Yk4JEtE6rGH6d7SLgOtB873xxQj36UErAv0IN17XluMksiyEPWkmy5kAZ32mO5oSfB7wV0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|289127d5-85aa-48af-b94c-fa5e8fe23061|2017-01-31T18:17:31|fXd4YrN5Oxk/ZcBhmuEpCwTavcu0StBF0sLuLGZxMJ53KEO07XObMVg8ad8kEjVfDRnr1s8OVxGt60+LijKc+5njNEa1ncHi4IF8Yz41w8IPz5cxP/IK4AIVW56bvL1sxQSNcJiYazxq7mcCQTalEVH8dc4jFPEPLaF3n0k8n3smCDzyTZA1Jt4EikEbx6RV/bGhLA8HWIKgwGqNiyI7SBHIEpEaG1VeoP3qs0MIRYczZfh6JiG8+ycUrgeWzAGrmZzGp+mPVTEeqHcFqFUF9HLQU0rgUXrqQxa12NXBkrRnQVD5BVzAyKBw7BXSHtW+3eyoTKWa2eD+g==|00001000000301251152|



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

HCO110712730

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

289127D5-85AA-48AF-B94C-
FA5E8FE23061

2017-01-31T18:17:31

2017-01-31T18:17:31

CFA110411FW5

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$45,287.29

ingreso

Vigente

Imprimir



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONTRATO

153/2016

IMPORTE CONTRATO \$441,721.42 CON IVA

CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION

18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

OBRA/ SERVICIO

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE 08EJN0376K,
UBICADA EN C. 1A Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

REPROGRAMACIÓN AUTORIZADO
CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$380,794.33 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$39,040.77 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO

IMPORTE FUERA
DE PROGRAMA

SANCIÓN / RETENCIÓN DEL
1.0%/MES

NUMERO DE
MESES DE
RETRASO

IMPORTE DE
SANCIÓN

IMPORTE DE
REINTEGRO

ESTIMACION No.3 (PERIODO 20 SEPTIEMBRE AL 09
DE OCTUBRE DEL 2016)

INCISO B

\$39,040.77

\$390.41

0.75

\$294.37

TOTAL

\$294.37 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. EVER GARCIA PALMA

REVISO:

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

Vo.Bo.

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

CHIHUAHUA, CHIH., OCTUBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No.	153/2016	CONTRATADOS
OBRA:	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA"	ESTIMACIÓN No.	3 TRES	\$ 441,721.42 CON IVA
UBICACIÓN:	CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	PERÍODO EJEC.	20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016	
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	45,287.29 CON IVA
RFC	HCO110712730	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	381,444.65 CON IVA
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	426,731.94 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 38,287.31	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 753.46	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 39,040.77	

DESCUENTOS	
0.1% Sancion por Retraso	\$ 294.37
0.2% I.C.I.C.	\$ 78.08
0.2% DIF.	\$ 78.08
0.2% CMIC	\$ 78.08
SUMA DESCUENTOS	\$ 528.61

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 39,040.77
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 39,040.77
I.V.A.	\$ 6,246.52
TOTAL	\$ 45,287.29

(CON LETRA)
(CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 528.61
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 44,758.68

AUTORIZO

ELABORO

ING. EVER SARFIO PALMA
RESIDENTE D.C.P.M

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO



CHIHUAHUA, CHIH.,

09 DE OCTUBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 45,053.05
(CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 5/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 TRES CONTRATO No. 153/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 441,721.42 INCLUYE CONVENIO
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 42/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	39,040.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 39,040.77
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	IVA	\$ 6,246.52
SANCION POR RETRASO 0.5%		
C.M.I.C. DEL 0.2%	0	
DIF 0.2%	78.08	
I.V.C.S 0.2%	78.08	
SUMA	234.24	
	TOTAL	\$ 45,287.29

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 441,721.42
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 381,444.65
ESTA ESTIMACION	\$ 45,287.29
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 426,731.94
POR EJERCER	\$ 14,989.48

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 657.67	\$ 657.67	\$ 657.67
ESTA ESTIMACION	\$ 78.08	\$ 78.08	\$ 78.08
ACUMULADO ACTUAL	\$ 735.75	\$ 735.75	\$ 735.75

R E C I B I M O S

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V. =
HCO110712730



OBRA:	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"
MUNICIPIO:	CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERÍODO:	20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No.	3 TRES
No. CONTRATO:	153/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	

NORMALES	\$	38,287.31
EXCEDENTES	\$	753.46
EXTRAS	\$	-

SUBTOTAL	\$	39,040.77
I.V.A.	\$	6,246.52
TOTAL	\$	45,287.29

POR EL CONTRATISTA HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V. ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA	POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION. ING. EVER GARFIO PALMA
---	--



OBRA:	CONSTRUCCION DE AJUA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"
MUNICIPIO:	CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No.	3 TRES
No. CONTRATO:	153/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO				VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			

OBRA NORMAL									
									\$ 38,287.31

7 RED HIDRAULICA Y SANITARIA									
									\$ 9,106.46
7.1	INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. MATERIA. M. DE OBRA. ACCESORIOS PRUEBAS HIDRAULICAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	25	25	0	25		25.03	625.75
7.2	SALIDA PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. CONEXIONES, ACCESORIOS, PEGAMENTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2	2	0	2		254.16	508.32
7.3	SALIDA SANITARIA DE CPVC DE 2" INC. CONEXIONES, COPIES, ACCESORIOS, PEGAMENTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1	1	0	1		302.15	302.15
7.4	SALIDA SANITARIA DE CPVC DE 4" INC. CONEXIONES, COPIES, ACCESORIOS, PEGAMENTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2	2	0	2		447.32	894.64
7.5	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAVABO TIPO OVALIN INC. CONEXIONES, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1	1	0	1		1897.14	1897.14
7.6	INSTALACION DE SANITARIO BLANCO LINEA ECONOMICA INC. SANITARIO, ACCESORIOS, CUELLO DE CERA, GUIA, BOQUILLA, ASIENTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1	1	0	1		1240.07	1240.07
7.7	REGISTRO HIDRAULICO DE 30X 50 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS INC. TAPA DE FO.FO. Y APLANADOS INITS	PZA	1	1	0	1		771.01	771.01
7.8	REGISTRO SANITARIO DE 60X 40 X 80 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS INC. TAPA DE CONCRETO Y APLANADOS INITS	PZA	1	1	0	1		1310.63	1310.63

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. BRIAN JAVIER PINOJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING EYER GARIBO PALMA



OBRA:	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"
MUNICIPIO:	CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No.	3 TRES
No. CONTRATO:	153/2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

	RECUBRIMIENTO DE CERAMICA DE 20X30 CMS INC. PEGAZUELO, BOQUILLA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO 7.9 NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2		8	6.17	0		252.31	1556.75
8	OBRA EXTERIOR(ANDADORES)							\$	29,160.85
	8.1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	M2		80	43.2	0	43.2	8.9	384.48
	EXCAVACION A MANO HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD Y 50 CMS DE ANCHO INC. HERRAMIENTA, M. DE OBRA Y TODO 8.2 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3		10	10	0	10	158.5	1585
	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO INC. MATERIAL M. DE OBRA Y 8.3 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		20	20	0	20	113.94	2278.8
	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS RELLENO CON CONCRETO DE 100 KG/CM2 Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 60 KG/CM2 INC. MATERIAL M. DE OBRA CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS ARMADO CON UNA V# 3 DE FORMA VERTICAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 8.4 CORRECTA EJECUCION	M2		32	32	0	32	450.14	14404.48
	8.5 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3		13	11.95	0	11.95	72.25	863.39
	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE 8.6 AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	M2		67.02	43.2	0	43.2	223.72	9664.7
	OBRA EXCEDENTE							\$	753.46

	INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. MATERIA. M. DE OBRA. ACCESORIOS PRUEBAS HIDRAULICAS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 7.1 CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML		25	30	25	5	25.03	125.15
--	---	----	--	----	----	----	---	-------	--------

POR EL CONTRATISTA:
ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

ING EVER GARCIA PALMA
POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

CONTRATISTA


--	--

CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 153/2016	TRAMO:	CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
OBRA :	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION:	3 TRES	PERIODO: 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
CONCEPTO	8.1	OPERACIONES ARITMETICAS		
OBRA EXTERIOR(ANDADORES)				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION		6 X 7.2=43.2 M2		43.2 M2
EXCAVACION A MANO HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD Y 50 CMS DE ANCHO INC. HERRAMIENTA, M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	8.2	6+6+7.2+1.24+8.18+2.43+1.25+18.3+18.3=68.9 X .3X.5= 10.33 M3		10.33 M3
PLANTILLA DE CONCRETO F/C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO INC. MATERIAL M. DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	8.3	6+6+7.2+1.24+8.18+2.43+1.25+18.3+18.3=68.9 X .3= 20.67 M3		20.67 M2
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS RELLENO CON CONCRETO DE 100 KG/CM2 Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 60 KG/CM2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS ARMADO CON UNA VS# 3 DE FORMA VERTICAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	8.4	6.0+7.2+6.0+11.30+11.30+2.43+1.25+4.83+50.31 x 0.42= 21.13 m2 8.18+1.16+1.24+7.2+1.24=19.02 x 0.63=11.98 m2 21.13+11.98=33.11 M2		33.11 M2

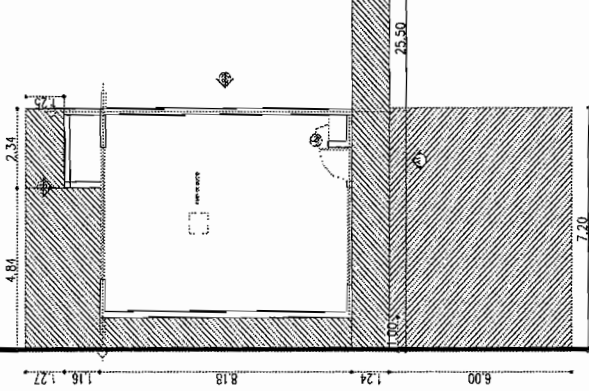

[Signature]
PRESIDENTE





[Signature]
CONTRATISTA

No DE ESTIMACION;	3 TRES	PERIODO: 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2016	CROQUIS	VOLUMEN
-------------------	--------	--	---------	---------

Architectural floor plan of a building. The plan shows a central rectangular area labeled "OFFICE" with a door. To the left is a smaller rectangular area labeled "RECEPTION". To the right is a larger rectangular area labeled "MEETING ROOM". The plan includes dimensions for the overall building and individual rooms. The overall width is 11.95 M3 and the overall depth is 43.2 M2. The "OFFICE" room is 2.34 M wide and 4.84 M deep. The "RECEPTION" room is 2.34 M wide and 2.34 M deep. The "MEETING ROOM" is 7.40 M wide and 25.50 M deep. The plan also shows a staircase and a small square area labeled "TOILET".

CONTRATISTA

FOTOGRAFIAS

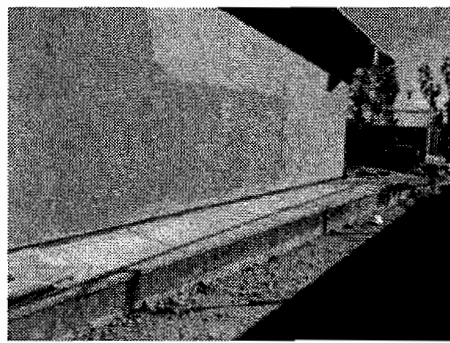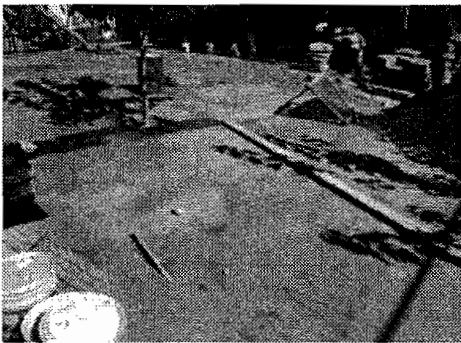

1
2

