

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua,
Chihuahua
Chihuahua, México C.P. 31125
RFC:HCO110712730
Regimen Fiscal:
No Aplica

FACTURA**Folio Fiscal:**

02DC67CB-AA8C-4938-8772-D0104C916329

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA, No. 408, Colonia CENTRO,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. C.P. 31000
RFC:MCI651010V22

Nó. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2017-01-31T18:37:22

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2017/01/31 T 18:37:22

Serie y Folio:

A275

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------	------------------	-------------	----------	--------	-------

0001	N/A	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA ESTIMACION NUMERO 2(DOS) SEGUN CONTRATO NUM. 155/2016	1.00	\$ 65,261.99	\$ 65,261.99
------	-----	--	------	--------------	--------------

FIRMA DEL CONTRATISTA
ALCANJE DE LA ESTIMACION \$ 65,261.99
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO
0.1% sancion por retraso \$ 461.79
0.2% ICIC \$ 130.52
0.2% CMIC \$ 130.52
0.2% DIF \$ 130.52
SUMA \$ 853.35
NETO A RECIBIR \$ 74,850.55



Total con letra:
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 91/100.-MXN

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:
NA No Aplica

Número de Cuenta:
No Aplica

SUBTOTAL \$ 65,261.99
IVA 16.00% \$10,441.92

TOTAL \$ 75,703.91

Sello digital del Emisor:

IEjLDz50uK/6qxziqdVpzeHpS7GY4drWp+alwJV7N1QAKOY2gJNjHwB3c6s3FS26EBf/zlgopRT9DsK/QLM4X3NxD/RBOcZopceTsM/XnvOs5c1ZumpVmp+ZmaP09jti9YbUgxeQ7+bgq6j6a4kxMRgughb1wHtS9Zm4kpfMM6eiyR5hYmb+1xZTom9cq6TRVZTcEMjVVeS7W+yc2xlcMgoZXEI2UTvEag802GkZsa0tHabPpA1IK0ALoeMS9QA658j7cKGUvFzdm0QJfJixvi4QvYtMPP4DuD9YUYTaSWCVkAixV8I3/GF79kldYJ5p9sBSa2Z+0MA31eSGvVA==

Sello digital del SAT:

XXfLOYeXLD8zvyJBdYpVxpoq/zozja+S9VLn4OFQJb44krfzJGfNLOkqC9GKRTXq/HU6aP4c+iQjUMBKtV4DEG2FuSa2m3q2RTJLjv6bOApf5dE8W9aWD3S+0sHK4qQZx1U46m0NncUCJHPn2JEXvgz6QdipPly6gkVXGint6M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0||02dc67cb-aa8c-4938-8772-d0104c916329|2017-01-31T18:37:22||IEjLDz50uK/6qxziqdVpzeHpS7GY4drWp+alwJV7N1QAKOY2gJNjHwB3c6s3FS26EBf/zlgopRT9DsK/QLM4X3NxD/RBOcZopceTsM/XnvOs5c1ZumpVmp+ZmaP09jti9YbUgxeQ7+bgq6j6a4kxMRgughb1wHtS9Zm4kpfMM6eiyR5hYmb+1xZTom9cq6TRVZTcEMjVVeS7W+yc2xlcMgoZXEI2UTvEag802GkZsa0tHabPpA1IK0ALoeMS9QA658j7cKGUvFzdm0QJfJixvi4QvYtMPP4DuD9YUYTaSWCVkAixV8I3/GF79kldYJ5p9sBSa2Z+0MA31eSGvVA==|00001000000301251152||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

HCO110712730

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

02DC67CB-AA8C-4938-8772-
D0104C916329

2017-01-31T18:37:22

2017-01-31T18:37:22

CFA110411FW5

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$75,703.91

ingreso

Vigente

Imprimir



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONTRATO

155/2016

IMPORTE CONTRATO

\$483,448.93

CON IVA

CONTRATISTA

PERIODO DE EJECUCION

OBRA/ SERVICIO

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA" CON CLAVE
08EJN0376K, UBICADA EN C. 1A Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

REPROGRAMACIÓN AUTORIZADO
CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$416,766.32 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$65,261.99 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCIÓN / RETENCIÓN DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE SANCION	IMPORTE DE REINTEGRO	ESTIMACION No.2 (PERIODO 19 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016)
INCISO B	\$65,261.99	\$652.62	0.71	\$461.79		

TOTAL \$461.79 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. EVER GARCIA PALMA

REVISO:

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

Vo.Bo.

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

CHIHUAHUA, CHIH., SEPTIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 155/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 483,448.93 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
UBICACIÓN: CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 75,703.91 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 345,691.45 CON IVA
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 421,395.36 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 44,238.12	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ 21,023.87	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 65,261.99	

DESCUENTOS		
0.1% Sancion por Retraso	\$	461.79
0.2% I.C.I.C.	\$	130.52
0.2% DIF.	\$	130.52
0.2% CMIC	\$	130.52
SUMA DESCUENTOS	\$	853.35
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	65,261.99
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	65,261.99
I.V.A.	\$	10,441.91
TOTAL	\$	75,703.90

(CON LETRA)

(SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 90/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	853.35
SALDO NETO A RECIBIR	\$	74,850.55

AUTORIZO	ELABORO
ING. EVER GARFIO PALMA	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

09 DE OCTUBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 75,312.35
(SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 35/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 155/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 483,448.93 INCLUYE CONVENIO
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	65,261.99
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$	-
	SUBTOTAL	\$	65,261.99
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		IVA	\$ 10,441.92
SANCION POR RETRASO 0.5%	0	TOTAL	\$ 75,703.91
C.M.I.C. DEL 0.2%	130.52		
DIF 0.2%	130.52		
I.V.C.S 0.2%	130.52		
SUMA	391.56		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 483,448.93
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 345,691.45
ESTA ESTIMACION	\$ 75,703.91
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 421,395.36
POR EJERCER	\$ 62,053.57


2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 596.02	\$ 596.02	\$ 596.02
ESTA ESTIMACION	\$ 130.52	\$ 130.52	\$ 130.52
ACUMULADO ACTUAL	\$ 726.54	\$ 726.54	\$ 726.54

R E C I B I M O S


HORIZONTE CORPORACIÓN S.A. DE C.V.
RCOT110712730



OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"

MUNICIPIO: CALLE 1ª Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

PERÍODO: 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)

No. CONTRATO: 155/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	\$ 44,238.12
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -
	<u>EXTRAS</u>	\$ 21,023.87

SUBTOTAL	\$ 65,261.99
I.V.A.	\$ 10,441.91
TOTAL	\$ 75,703.90

POR EL CONTRATISTA

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
ARG. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION.

ING. EVER GABRIEL PALMA



OBRA:	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"
MUNICIPIO:	CALLE 1a Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
CONTRATISTA:	HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PERIODO:	19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)
No. CONTRATO:	155/2016

No.	CONCEPCIOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL									
									\$ 44,238.12

5	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	114	83.9	1.34	82.56	535.83	44238.12

OBRA EXTRAORDINARIA									
									\$ 21,023.87

EXT-01	RETIRO DE MALLA CICLONICA Y POSTERIA INCLUYE DEMOLUCION DE DALA DE 20X30 CM PARA RETIRO DE POSTE PARA COLOCACION DE CASTILLO K-1	PZA	0	173.15	0	173.15	121.42	21023.87

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. BRIAN JAVIER HERNANDEZ PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.


POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING EVER GARCIA PALMA

1000

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) **PERIODO:** 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

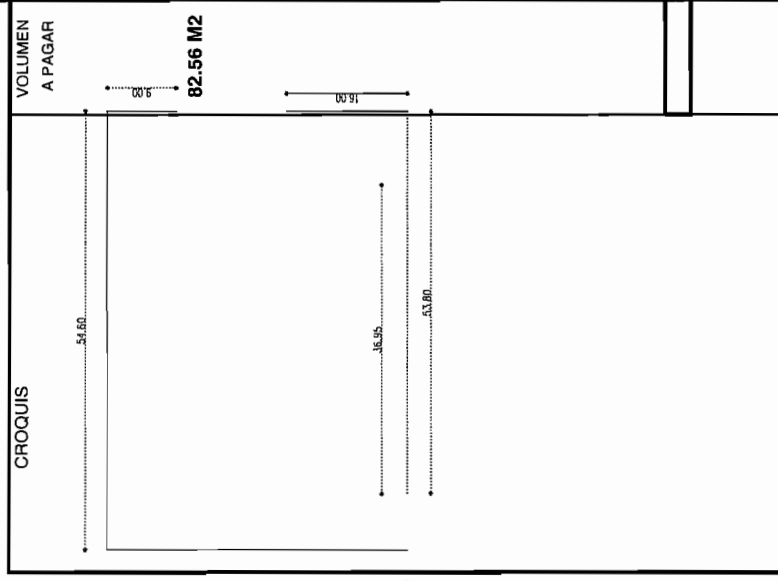[illegible]

RESIDENTE

CONTRATISTA



1000

No DE ESTIMACION: 2 (DOS) **PERIODO:** 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

~~RESIDENTE~~



FOTOGRAFIAS

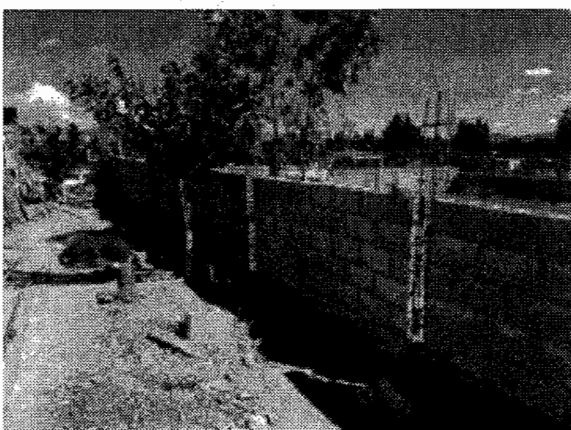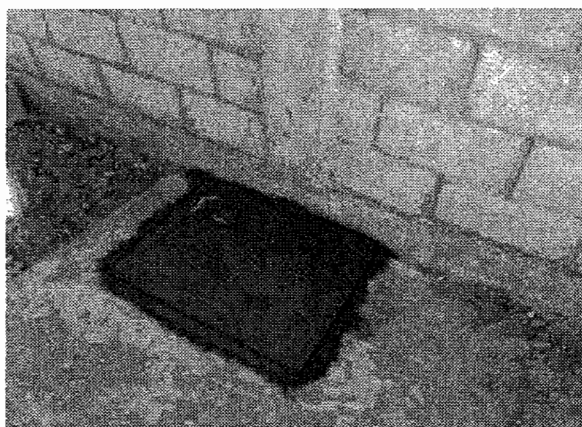

1

2

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO No. D/3680/2016

26 DE AGOSTO DE 2016

ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA
REPRESENTANTE LEGAL DE
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Con relación a su solicitud mediante escrito **S/N** de fecha 25 de agosto del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE: 08EJN0376K, UBICADO EN CALLE 1ª Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE** que al amparo del contrato No. 155/2016 ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT.-01	RETIRO DE MALLA CICLONICA Y POSTERIA INCLUYE: MOLICION DE DALA DE 20 X 30 CMS PARA RETIRO DE POSTE Y COLOCACION DE CASTILLO K-1.	PIEZA	\$121.42	\$121.42
EXT-02	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 0.80X0.80X0.15 MTS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; COLADO, ARMADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 A LOS 7.14 Y 28 DIAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VER PLANO.	PIEZA	\$742.92	\$742.92
EXT.-03	RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 90 %.	M3	\$72.25	\$72.25

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00



SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO No. D/3680/2016

EXT.-04	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	\$6.84	\$6.84
EXT.-05	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE; AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	\$231.47	\$231.47
EXT.-07	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	M2	\$111.53	\$111.53
EXT.-08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y SELLADOR.	M2	\$49.14	\$49.14

[Handwritten signature]
ANEXO 1

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO. SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
C.C.P. ING. EVER GARFIO. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/RDRA/XPB/JVA/jlcc

Proxa Chuviscar No. 1108
C. de Chihuahua Nueva
C. de Chihuahua
C. de Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Pág. 2 de 2

