

HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.

Avenida Cristobal Colon No. 14301 Int. B Colonia Paseos de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31125

RFC: HCO110712730

Regimen Fiscal: No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 Colonia CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO C.P. 31000

RFC: MCI651010V22

FACTURA**Folio Fiscal:**

CD00E441-A383-4D46-A1E2-A3E029D01674

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402234727

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301251152

Fecha y hora de certificación:

2016-10-04T16:06:31

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Chihuahua 2016/10/04 T 16:06:31

Serie y Folio:

A247

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0001	N/A	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA" ESTIMACION NUMERO 1(UNO) SEGUN CONTRATO NUMERO 155/2016	1.00	\$298,009.87	\$298,009.87

FIRMA DEL CONTRATISTA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 298,009.87
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% I.C.I.C.	\$ 596.02
0.2% DIF	\$ 596.02
0.2% CMIC	\$ 596.02
SUMA	\$ 1,788.06

NETO A RECIBIR \$ 343,903.38

**Total con letra:**

Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y uno pesos 45/100.-MXN

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición.

Método de Pago:

02 Cheque nominativo

Número de Cuenta:

0098825070201

SUBTOTAL

\$298,009.87

IVA 16.00%

\$47,681.58

TOTAL

\$345,691.45

Sello digital del Emisor:

Xw4C3xtRwgmF9u4xdZ1F29C4h0lrmElOHY5sRipb3g1kyIR3+bVz6UxiX+yu/LyxAR0iHplEWiJnNLiguXkrw387ejCbd0aV112eZuAb699JkODtVwS+ECF2NABpOWxy9cEh8PChbQ3klIRP81MoyF33G52WqgMdwzNiy852AsojqFkz6vcjnYdHingbjWuFY00aleUH2/FTS2yh5sbtgkYQ9fqargxLiUmbyhUN5u48jCOYC9CY5siFh6Fk4FuWYagFtiANr3xRKWsDDyswnlyGa2A0mipplsmgd+GUlhu5Nulx0LYRUPY5s4sqFoV1yISbAvX+B1dJmLg==

Sello digital del SAT:

lxVp8slAE9jFUhLctnXknZex5bDuMQ/+u2KIVdyhEUAfMntXhovHksNzqCXjhe3kdz3NtTCUzo7eIMhk2mwf+5k2Fry78+3D4Ogv3RGc4wsEBp/tw1RMSPxOqaX6iOievQp4bJHj6GU7kncuUGN+6ixA8gzkP7r0eYhXfEZ1P4c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]cd00e441-a383-4d46-a1e2-a3e029d01674|2016-10-04T16:06:31|Xw4C3xtRwgmF9u4xdZ1F29C4h0lrmElOHY5sRipb3g1kyIR3+bVz6UxiX+yu/LyxAR0iHplEWiJnNLiguXkrw387ejCbd0aV112eZuAb699JkODtVwS+ECF2NABpOWxy9cEh8PChbQ3klIRP81MoyF33G52WqgMdwzNiy852AsojqFkz6vcjnYdHingbjWuFY00aleUH2/FTS2yh5sbtgkYQ9fqargxLiUmbyhUN5u48jCOYC9CY5siFh6Fk4FuWYagFtiANr3xRKWsDDyswnlyGa2A0mipplsmgd+GUlhu5Nulx0LYRUPY5s4sqFoV1yISbAvX+B1dJmLg==[00001000000301251152]]



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HCO110712730	HORIZONTE CODONOR, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
CD00E441-A383-4D46-A1E2-A3E029D01674	2016-10-04T16:06:31	2016-10-04T16:06:31	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$345,691.45	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 155/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 483,448.93 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2016	
UBICACIÓN: CALLE 1ª Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 345,691.45 CON IVA
CONTRATISTA: HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HCO110712730	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 345,691.45 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 298,009.87	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 298,009.87	

DESCUENTOS 0.1% Sancion por Retraso \$ 0.00 0.2% I.C.I.C. \$ 596.02 0.2% DIF. \$ 596.02 0.2% CMIC \$ 596.02 SUMA DESCUENTOS \$ 1,788.06 RESUMEN SUMA ESTA ESTIMACION \$ 298,009.87 AMORT ANTICIPO \$ 0.00 SUB-TOTAL \$ 298,009.87 I.V.A. \$ 47,681.57 TOTAL \$ 345,691.44 (CON LETRA) (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.) DESCUENTOS \$ 1,788.06 SALDO NETO A RECIBIR \$ 343,903.38	AUTORIZO ELABORO ING. EVER GARCIA PALMA RESIDENTE D.O.P.M. Vo. Bo. ING. Xóchitl PEREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION Vo. Bo. ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO
---	--



CHIHUAHUA, CHIH..

1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 343,903.39
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 39/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 155/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 483,448.93 INCLUYE CONVENIO
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 298,009.87

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL	\$ 298,009.87
SANCION POR RETRASO 0.5%	0	IVA	\$ 47,681.58
C.M.I.C.. DEL 0.2%	596.02	TOTAL	\$ 345,691.45
DIF 0.2%	596.02		
I.V.C.S 0.2%	596.02		
SUMA	1,788.06		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 483,448.93
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 345,691.45
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 345,691.45
POR EJERCER	\$ 137,757.48

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO


	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF.	0.2% DIF.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 596.02	\$ 596.02	\$ 596.02
ACUMULADO ACTUAL	\$ 596.02	\$ 596.02	\$ 596.02

R E C I B I M O S

HORACIO CODONOR S.A. DE C.V.
HCO110712730

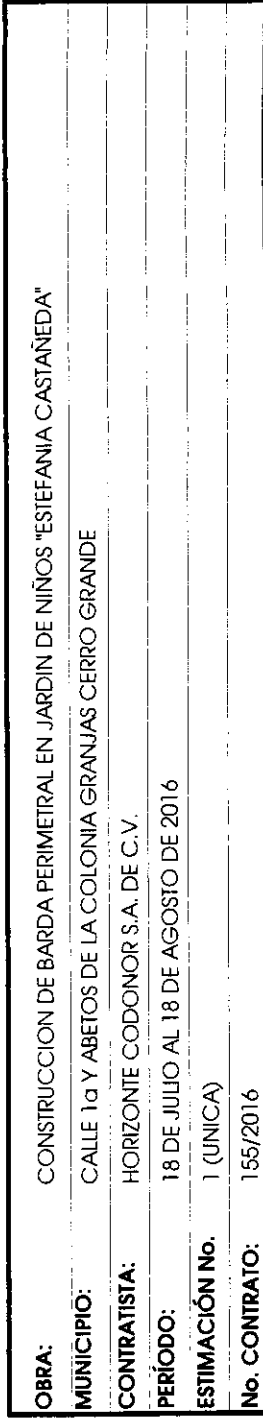

<u>NORMALES</u>	\$	298,009.87
<u>EXCEDENTES</u>	\$	-
<u>EXTRAS</u>	\$	-

 POR EL CONTRATISTA HORACIO EUBONOR S.A. DE C.V. ARQ. BRIAN JAVIER HINOJOS PALMA	 POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION. ING. EVER GARFIO PALMA
--	--



 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2013-2016										
CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				
	OBRA:									
	MUNICIPIO:									
	CONTRATISTA:									
	PERIODO:									
	ESTIMACIÓN No.									
	No. CONTRATO:									




OBRA NORMAL										\$ 298,009.87
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

CIMENTACION Y PISO										\$ 298,009.87
1	TRAZO Y NIVELACION	ML		181.6	173.15	0		173.15	5.47	947.13
2	CORTE DE CONCRETO SIMPLE CON MAQUINA DE DISCO INC. EQUIPO DE CORTE. M. DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		181.6	39.9	0		39.9	41.61	1660.24
3	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	M3		114	23.712	0		23.712	149.45	3543.76
4	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M2		108.99	36.48	0		36.48	124.37	4537.02
5	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA. RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2	M2		114	1.34	0		1.34	535.83	718.01
6	COLOCACION DE DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS. A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4vs #4 Y ST DEL #3 @ 20 CMS INC. MATERIAL. M. DE OBRA. CIMBRA COMUN. DESCIMBRA. CONCRETO. CURACRETO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		182	173.15	0		173.15	347.05	60091.71
7	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS INC. MATERIAL. M. DE OBRA. CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 4:1 Y ACABADO APARENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		272.5	243.9	0		243.9	348.7	85047.93
8	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 Vs#3 Y ST DE #2 INC. MATERIAL. M. DE OBRA. CIMBRA Y DESCIMBRA. CURACRETO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		182	173.15	0		173.15	265.32	45940.16
9	MALLA CICLONICA DE 1.25 MT DE ALTURA CAL 10.5 Y POSTES DE ARRANQUE DE 2 1/2" CAL 30. POSTES DE LINEA DE 1 1/2" CAL 30. BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" INC. MATERIAL. M. DE OBRA. ACCESORIOS DE SUJECION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML		182	173.15	0		173.15	268.27	46450.95

POR CONTRATISTA
ARG. BRIAN J. GARCIA PALMA
HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ERIC GARCIA PALMA

FOTOGRAFIAS

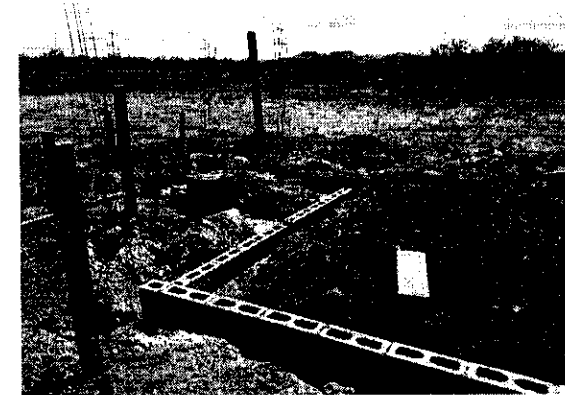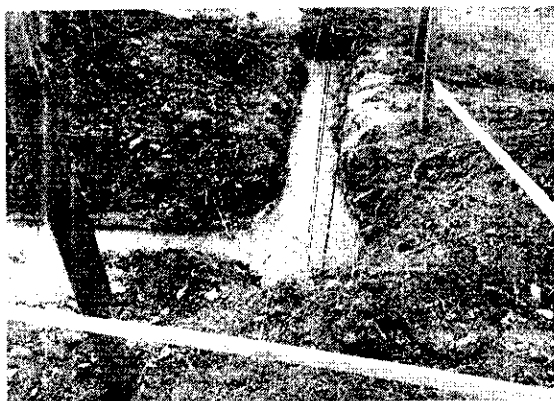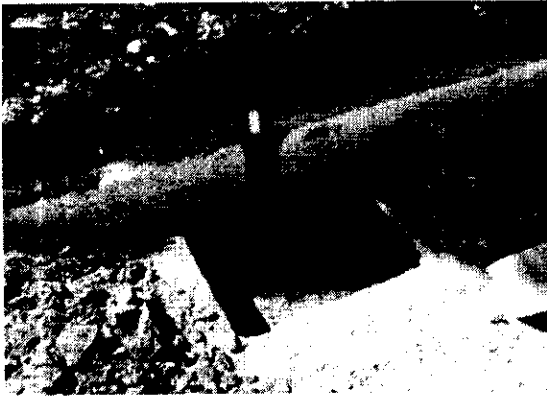

7

8
