



CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV
CLR031126L65
Domicilio Fiscal
PRIV TRASVIÑA Y RETES 6706
Col. PANAMERICANA 31200
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144261925

Factura No: 642
FOLIO FISCAL (UUID): 46E6D9F7-A024-4C9B-9EF2-2D303D3E6D25
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301816221
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-09-13T16:27:01
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-09-13T16:22:04

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA NO. 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 13 septiembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO, COL. SIERRA AZUL ESTIMACION NO. 2 (DOS) SEGÚN CONTRATO NO. 157/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION: 6,946.10 MENOS ANTICIPO 0.00 SUBTOTAL.- 6,946.10 MENOS RETENCIONES PACTADAS: 0.2% I.C.I.C. 13.89 0.2% INSTITUTO 13.89 0.2% D.I.F. 13.89 TOTAL RETENCIONES: 41.67 NETO A RECIBIR: 8,015.81	\$ 6,946.10	\$ 6,946.10

IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS, 48/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 6,946.10
IVA(IVA 16.00%): \$ 1,111.38
TOTAL: \$ 8,057.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

uVeSBZnd3GRQWHR2aw7P6d8BDp3CH4nQ2aYRh5v6RjpyYvSPaYUX4dSx0e7ALPEVn0SGwcX09M3vyGO+Zh3pzdOq105cW4JNQWWLgyOuSno+H56m+uLp6w7LaZYhPyfjgiz+po5VhdVCj1kaU2+TbUNKQGFp83n5Y+

SELLO DIGITAL DEL SAT

KpEe3XV2CaUBAV3nQHz+PQYvGd8wOnD4+2ndOofYz+JCMu9EBw0C2MQVhcbY118AAAd7shbRnLgF+YX5hWYFBD92qdHq5qEl+ca2PHKGBRtaC3TJg794TtpEcaRuo3g6dHem0R6E7+caW7nECn1MnZaThqoRg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.046ERD9F7-A024-4C9B-9EF2-2D303D3E6D25|2016-09-13T16:27:01|uVeSBZnd3GRQWHR2aw7P6d8BDp3CH4nQ2aYRh5v6RjpyYvSPaYUX4dSx0e7ALPEVn0SGwcX09M3vyGO+Zh3pzdOq105cW4JNQWWLgyOuSno+H56m+uLp6w7LaZYhPyfjgiz+po5VhdVCj1kaU2+TbUNKQGFp83n5Y+|00001000000203495475|



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la Imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

CLR031126L65

Folio Fiscal

46E6D9F7-A024-4C9B-9EF2-
2D303D3E6D25

Total del CFDI

\$8,057.48

Nombre o Razón Social del
Emisor

CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA
DE CV

Fecha de Expedición

2016-09-13T16:22:04

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-09-13T16:27:01

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

STA0903206B9

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 157/2016	CONTRATADOS
OBRA: ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 466,216.12 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 8,057.48 CON IVA
RFC CLR 031126 L65	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 220,549.35 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 228,606.83 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 6,946.10	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 6,946.10	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	13.89
0.2% INSTITUTO	\$	13.89
0.2% D.I.F.	\$	13.89
SUMA DESCUENTOS	\$	41.67
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	6,946.10
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	6,946.10
I.V.A.	\$	1,111.38
TOTAL	\$	8,057.48
(CON LETRA)		
(OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	41.67
SALDO NETO A RECIBIR	\$	8,015.81

AUTORIZO	ELABORO
ING. RODOLFO ORTE MARTÍNEZ RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

12 de agosto de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ **8,015.81**
{OCHO MIL QUINCE PESOS 81/100 M.N.} COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 157/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 466,216.12 INCLUYE CONVENIO
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 12/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL
SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TO: EDANO COL. SIERRA AZUL

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **6,946.10**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ **6,946.10**
IVA \$ **1,111.38**
TOTAL \$ **8,057.48**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 13.89
INSTITUTO 0.2% 13.89
D.I.F. 0.2% 13.89
SUMA **41.67**

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 466,216.12
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 220,549.35
ESTA ESTIMACION	\$ 8,057.48
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 228,606.83
POR EJERCER	\$ 237,609.29

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 380.26	\$ 380.26	\$ 380.26
ESTA ESTIMACION	\$ 13.89	\$ 13.89	\$ 13.89
ACUMULADO ACTUAL	\$ 394.15	\$ 394.15	\$ 394.15

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV
CLF 031126 L65



OBRA: ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES,
ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV

PERÍODO: 7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)

No. CONTRATO: 157/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

<u>NORMALES</u>	\$	6,946.10
<u>EXCEDENTES</u>	\$	
<u>EXTRAS</u>	\$	

SUBTOTAL	\$	6,946.10
I.V.A.	\$	1,111.38
TOTAL	\$	8,057.48

POR EL CONTRATISTA

POR LA OFICINA DE CONTRUCCION

CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV
ING. FELIPE RUBIO NIETO

ING. RODOLFO ORTEGA MARTINEZ



OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SACRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL				
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV				
PERIODO:	7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016				
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)				
No. CONTRATO:	157/2016				

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL								
1010	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 MTS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION.							
1010.02	HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	74.03	34.20	30.75	3.45	\$ 122.58	\$ 422.90
F.C. 026	INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE PVC O SLANT DE CONCRETO, SEGUN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE PVC INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INSTALACION HASTA 0.50 METROS DESPUES DE LA GUARNICION O REGISTRO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO; ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.							
F.C. 026A	EN MATERIAL "B" (EXCAVACIONES Y RELLENOS)	DESC	39.00	24.00	21.00	3.00	\$ 2,174.40	\$ 6,523.20
								\$ 6,946.10

SUBTOTAL	\$	6,946.10
IVA	\$	1,111.38
TOTAL	\$	8,057.48

POR EL CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV
ING. FELIPE RUBIO NIETO

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSE LITO ORTIZ MARTINEZ.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	157/2016	TRAMO:	
OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO - RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV

No. DE ESTIMACION:		2 (005)	PERIODO 7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016		
CONCEPTO	1010.02	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 MTS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPAALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD		SONDEOS DESCARGA 22 1 SONDEO DESCARGA 23 1 SONDEOS DESCARGA 24 1 SONDEOS TOTAL= 3 SONDEOS SECCION = ANCHO 0.80 LARGO 1.20 h= 1.20 VOL= 1.15 * 3 = 3.45 m³ TOTAL= 3.45 m³		(CROQUIS EN HOJAS ANEXAS)	3.45 M3

Reduccion

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	157/2016	TRAMO:	
OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV

No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO:	7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016
--------------------	---------	----------	-------------------------------------


CONCEPTO	F.C. 026A	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE PVC O SLANT DE CONCRETO, SEGUN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE PVC INCLUIDO, EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INSTALACION HASTA 0.50 METROS DESPUES DE LA GUARNICION O REGISTRO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO; ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA... EN MATERIAL "B" (EXCAVACIONES Y RELLENOS)		24 descargas totales cobradas estimacion 1 = 21 descargas esta estimacion= 3 descargas	(CROQUIS EN HOJAS ANEXAS)	3.00 DESC

[Handwritten signature]

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	157/2016	TRAMO:	
OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV


NO. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO: 7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016
--------------------	---------	--

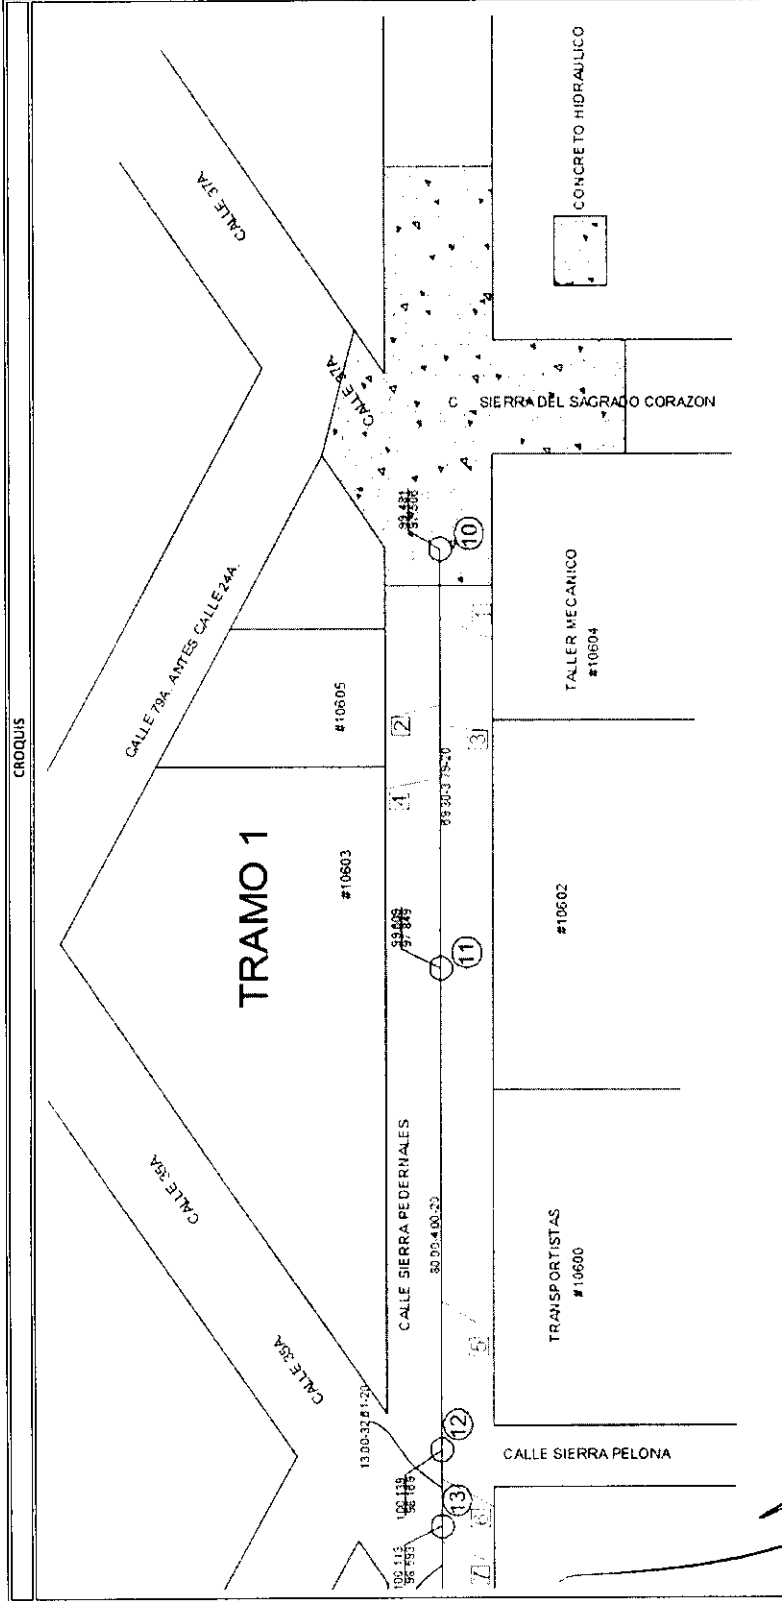

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	157/2016	TRAMO:	
OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV


No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO: 7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016
--------------------	---------	--

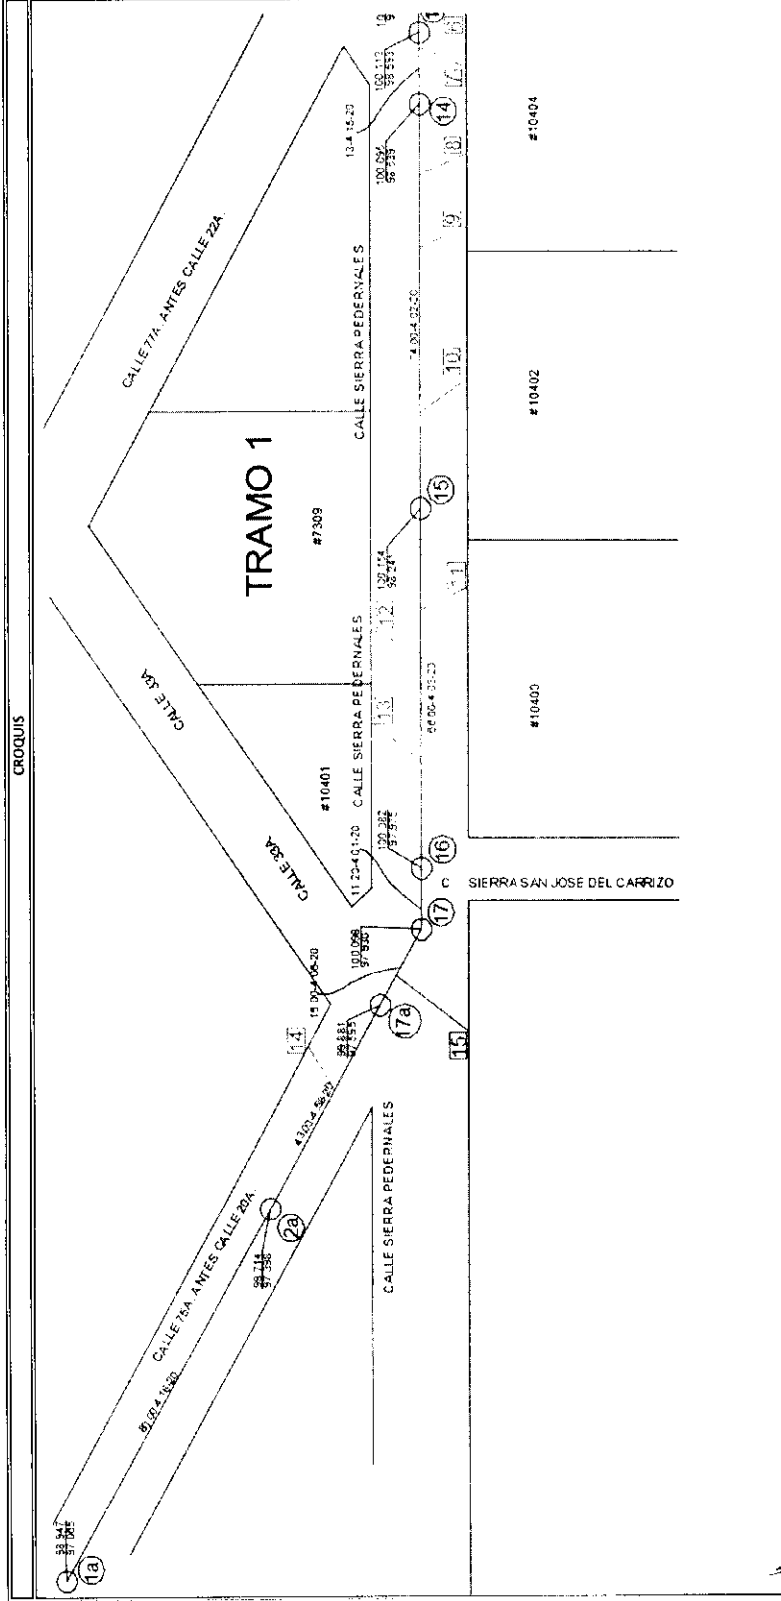

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	157/2016	TRAMO:	
OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV

No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	7 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016
--------------------	---------	---------	-------------------------------------

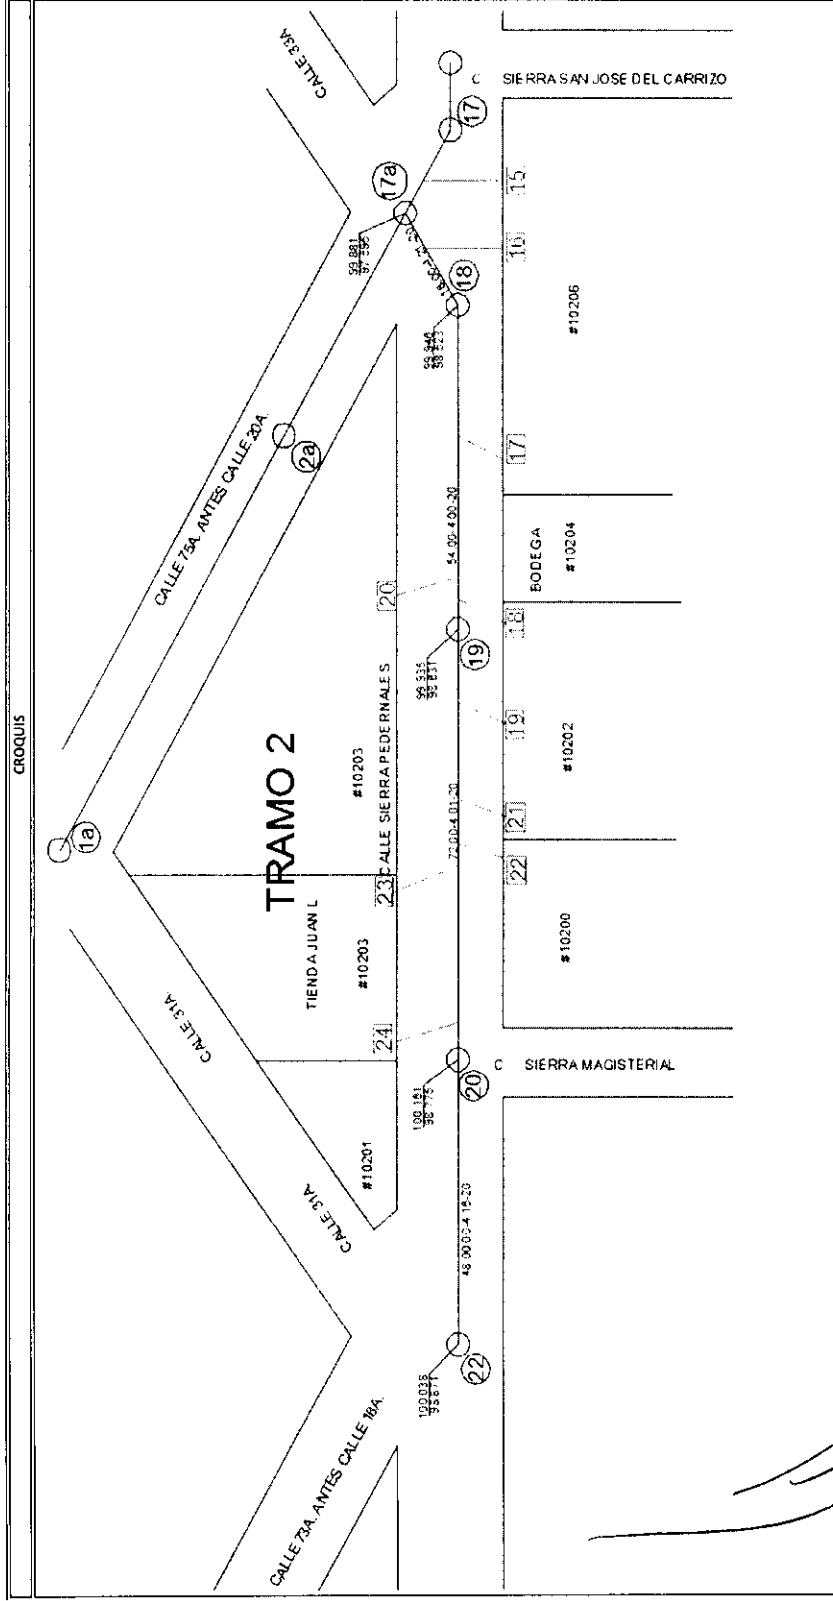

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	157/2016	TRAMO:	
OBRA:	ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SIERRA PEDERNALES, ENTRE C. SIERRA DEL SAGRADO CORAZON Y LOMBARDO TOLEDANO COL. SIERRA AZUL	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO SA DE CV

No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO: 07 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2016
--------------------	---------	---

No. De descarga	Calle	No. De casa	Entre pozos		Longitud	Excavacion promedio Tuberia	Altura Registro	Promedio Excavacion	Vol. Excavacion Zanja	Vol. Plantilla	Vol. Relleno Apisonado	Vol. Tuberia	Vol. Relleno a Volteo
1	C. Pedernales	10604	10	11	7.40	1.89	0.70	1.30	6.73	0.52	2.2	0.13	2.7
2	C. Pedernales	10605	10	11	10.50	1.89	0.70	1.30	9.56	0.67	3.12	0.19	3.83
3	C. Pedernales	10602	10	11	9.50	1.89	0.70	1.30	8.65	0.67	2.82	0.17	3.47
4	C. Pedernales	10603	10	11	10.50	1.89	0.70	1.30	9.56	0.74	3.12	0.19	3.83
5	C. Pedernales	10600	11	12	9.80	1.92	0.70	1.31	8.99	0.69	2.91	0.17	3.58
6	C. Pedernales	10404	13	14	9.00	1.64	0.70	1.17	7.37	0.63	2.68	0.16	3.29
7	C. Pedernales	10404	13	14	9.00	1.64	0.70	1.17	7.37	0.63	2.68	0.16	3.29
8	C. Pedernales	10404	14	15	9.00	1.84	0.70	1.27	8	0.63	2.68	0.16	3.29
9	C. Pedernales	10404	14	15	9.00	1.84	0.70	1.27	8	0.63	2.68	0.16	3.29
10	C. Pedernales	10402	14	15	9.00	1.84	0.70	1.27	8	0.63	2.68	0.16	3.29
11	C. Pedernales	10400	15	16	9.00	2.09	0.70	1.40	8.82	0.63	2.68	0.16	3.29
12	C. Pedernales	7309	15	16	10.00	2.09	0.70	1.40	9.8	0.7	2.97	0.18	3.65
13	C. Pedernales	10401	15	16	10.20	2.09	0.70	1.40	10	0.71	3.03	0.18	3.72
14	C. 75a.	10207	17-A	2-A	9.40	2.48	0.70	1.59	10.46	0.66	2.79	0.17	3.43
15	C. Pedernales	10206	17	17-A	13.50	1.45	0.70	1.08	10.21	0.95	4.01	0.24	4.93
16	C. Pedernales	10206	17-A	18	13.00	1.96	0.70	1.33	12.1	0.91	3.87	0.23	4.75
17	C. Pedernales	10203	18	19	8.40	1.45	0.70	1.08	6.35	0.59	2.5	0.15	3.07
18	C. Pedernales	10202	18	19	9.40	1.45	0.70	1.08	7.11	0.66	2.79	0.17	3.43
19	C. Pedernales	10202	18	19	9.20	1.45	0.70	1.08	6.96	0.64	2.74	0.16	3.36
20	C. Pedernales	10203	18	19	9.00	1.45	0.70	1.08	6.8	0.63	2.68	0.16	3.29
21	C. Pedernales	10202	19	20	9.20	1.45	0.70	1.08	6.96	0.64	2.74	0.16	3.36
22	C. Pedernales	10201	19	20	9.20	1.45	0.70	1.08	6.96	0.64	2.74	0.16	3.36
23	C. Pedernales	10201	19	20	9.40	1.45	0.70	1.08	7.11	0.66	2.79	0.17	3.43
24	C. Pedernales	10201	19	20	9.40	1.45	0.70	1.08	7.11	0.66	2.79	0.17	3.43
TOTAL=									198.98	16.19	68.69	4.11	84.36
231.00													

DIAMETRO TUBERIA=	6
ANCHO DE ZANJA =	0.7
CONSTANTE PLANTILLA=	0.07
CONSTANTE RELLENO APISONADO=	0.29733
CONSTANTE VOL. TUBERIA=	0.01767
CONSTANTE RELLENO A VOLTEO=	0.365

Reduccion

Fotos Estimación 2

Alcantarillado Sanitario.- Red de atarjeas y descargas domiciliarias en C. Sierra Pedernales, entre C. Sierra del Sagrado Corazón y Lombardo Toledano.

