

EDUARDO RAYNAL PRIETO

RFC Emisor : RAPE830726QF6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Guelatao de Juarez No. Exterior 2414 Colonia Margarita Maza de Juarez
Localidad Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua México CP.
31470

Sucursal- :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

953AE496-EA78-47AE-90A7-17B2837B7503

No de Serie del CSD:

00001000000304971943

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-08-05T14:34:11

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

071 ERA

Régimen Fiscal:

Régimen de Actividad Empresarial y Profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		ESTIMACION 1 UNICA DE CONTRATO 176/2016 REFERENTE A CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774a, 4675,6525,6756,7364, 7398, 8061, 8678, Y 8714 SEGUNDA ETAPA, RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO I.C.I.C. 2% \$83.24, CMIC 2% \$83.24, DIF 2% \$83.24, TOTAL DE RETENCIONES \$249.72 SALDO NETO A RECIBIR \$48,031.09	41621.39	41621.39

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO ESPECIFICADO

Método de Pago: NO ESPECIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 41621.39

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 6659.42

TOTAL \$ 48280.81

Total con letra:

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 81/100 MN

Sello digital del CFDI:

AICF58NM/8IQxd/JoBNeAD8f+cQtpV9lb1d8V7EPdH5gYOEmSjA/TYLUIaWYNDNPC2D8Dm2nVLmInGPTYNvJYKivr3XUzIXtz1Kytz42LoC/Z839DopjQVjueWT+Tmoau7ij2cpa
+QqIR6ehAbm6OPWDBW6AvhpL3u8Nkww=

Sello del SAT:

INGl0u1RGUGRyMR307Com2ZFRJAK7QT3H0Ee/PypucwZph71sxEvk9bTJ+zOPIS68cpeqpTCDIILNOKHeNw84XQ54KctbznP8sa0Wq5ZBTmxLGS0QjRhB
+aCngPhsBTIY6MGJGf7QUi5911C2ey3kVF10270YUYjCaoU+r4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.0I953AE496-EA78-47AE-90A7-17B2837B7503I2016-08-05T14:42:15IAICF58NM/8IQxd/JoBNeAD8f
+cQtpV9lb1d8V7EPdH5gYOEmSjA/TYLUIaWYNDNPC2D8Dm2nVLmInGPTYNvJYKivr3XUzIXtz1Kytz42LoC/Z839DopjQVjueWT
+Tmoau7ij2cpa+QqIR6ehAbm6OPWDBW6AvhpL3u8Nkww=100001000000201748120II

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-08-05T14:42:15



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



gob mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

RAPE830726QF6

Folio Fiscal

953AE496-EA78-47AE-
90A7-17B2837B7503

Total del CFDI

\$48,280.81

Nombre o Razón Social del Emisor

EDUARDO RAYNAL PRIETO

Fecha de Expedición

2016-08-05T14:34:11

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-08-05T14:42:15

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SAT970701NN3

05/08/16 13:45



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No.	176/2016	CONTRATADOS
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774*, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. SEGUNDA ETAPA	ESTIMACIÓN No.	1 UNICA	\$ 107,990.48 CON IVA
		PERÍODO EJEC.	25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2016	
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	48,280.81 CON IVA
CONTRATISTA:	ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	-
RFC	RAPE-830726-QF6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	48,280.81 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALBAÑILERIA	\$ 41,621.39 /	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 41,621.39 /

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$	83.24 /
0.2% DIF	\$	83.24 /
0.2% C.M.I.C.	\$	83.24 /
SUMA DESCUENTOS	\$	249.72 /

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	41,621.39 /
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	41,621.39 /
I.V.A.	\$	6,659.42 /
TOTAL	\$	48,280.81 /

(CON LETRA)


(CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
81/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	249.72 /
SALDO NETO A RECIBIR	\$	48,031.09 /

AUTORIZO


ING. JOSE HUITRON LOPEZ
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ELABORO


ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
CONTRATISTA

REVISO


ING. ENRIQUE L. L. ALEMÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCIÓN

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 48,031.09
(CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS 9/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 UNICA CONTRATO No. 176/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 107,990.48/
CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 48/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774ª, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. SEGUNDA ETAPA

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	41,621.39
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 41,621.39
		IVA	\$ 6,659.42
		TOTAL	\$ 48,280.81
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	83.24 /		
DIF. DEL 0.2%	83.24 /		
C.M.I.C. DEL 0.2%	83.24 /		
SUMA	249.72 /		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO		CONTRATO	
IMPORTE CONTRATADO		\$	107,990.48
CONVENIO MODIFICATORIO		\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR		\$	-
ESTA ESTIMACION		\$	48,280.81
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION		\$	48,280.81
POR EJERCER		\$	59,709.67

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO		CONTRATO	
IMPORTE DE ANTICIPO		\$	-
ACUMULADO ANTERIOR		\$	-
ESTA ESTIMACION		\$	-
ACUMULADO ACTUAL		\$	-
POR AMORTIZAR		\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% DIF.	0.20% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 83.24 /	\$ 83.24 /	\$ 83.24
ACUMULADO ACTUAL	\$ 83.24 /	\$ 83.24 /	\$ 83.24

RECIBIMOS

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
RAPE-830726-QF6

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774^a, 4675, 6525, 6756, MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 176/2016
 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. SEGUNDA ETAPA ESTIMACIÓN No. 1 UNICA
 CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO PERÍODO: 25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

ALBAÑILERIA

\$ 41,621.39 /

SUBTOTAL	\$	41,621.39
I.V.A.	\$	6,659.42
TOTAL	\$	48,280.81

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

POR EL CONTRATISTA

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

ING. JOSE HUITRON LOPEZ

CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO PERIODO: 25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2016

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
1	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DEL DESPLANTE, TRASPALEO FUERA DE ZANJA, PERFILADO Y PROTECCIÓN DE LA MISMA, COMPACTACIÓN, Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE. BASE DE PAGO AREA EN PLANTA DE CIMENTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRERO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	3.64	3.55 /	0 /	\$ 180.00	\$ 639.00
3	DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	5.70	4.93 /	0 /	\$ 225.00	\$ 1,109.25
4	CASILLLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	6.50	6.30 /	0 /	\$ 240.00	\$ 1,512.00
5	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE 1:4, ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO, ACARREO, ELEVACION, Y COLOCACION	m2	18.40	15.15	0 /	\$ 360.00	\$ 5,454.00
6	DALA DE CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ml	5.70	5.70	0 /	\$ 225.00	\$ 1,282.50
7	TECHUMBRE METALICA A BASE DE LAMINA CAL. 28 POLIN DE 4" Y PLIA DE 1", MATERIALES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	4.90	4.45	0 /	\$ 443.00	\$ 1,971.35
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	3.00	3.00	0 /	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 60 X 60 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO GOTA DE AGUA, MOSQUITEROS, REJA, PINTURA Y MANO DE OBRA.	pza	3.00	3.00	0 /	\$ 588.99	\$ 1,766.97
10	DETALLADO DE REMATE DE LAMINA EN MURO DE BLOCK, PERIMETRO DE VENTANA Y PUERTA A BASE DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	1.00	0 /	\$ 286.00	\$ 286.00
11	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA DE PVC, COBRE O PAD, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	3.00	2.00	0 /	\$ 1,169.12	\$ 2,338.24
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS. INCLUYENDO WC, LAVABO Y REGADERA, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	9.00	9.00	0 /	\$ 1,850.00	\$ 16,650.00
13	SALIDA DE CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT DE LAMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	8.00	8.00	0 /	\$ 532.76	\$ 4,262.08

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

Arq. Eduardo Raynal Prieto

Pag 1 de 2

ING. JOSE HUITRON LOPEZ

ERA

Construcción y Diseño

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN AGEBS: 774*, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. SEGUNDA ETAPA

GENERADOR

1

17/6/2016

PERIODO DE EJECUCION

CONTRATISTA:




25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2016

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD TOTAL
1	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DEL DESPLANTE, TRASPALCO FLUERA DE ZANJA, PERFILADO Y PROTECCION DE LA MISMA, COMPACTACION, Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE, BASE DE PAGO AREA EN PLANTA DE CIMENTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRERO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	A 2.73	B 1.30			3.55
3	DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE MATERIALES, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	A 2.73				2.73
			B 1.35				1.35
			C 0.85				0.85
							4.93

4	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA ACABADO COMUN, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, GANCHO, TRASLAPES, ECUADRAS, AMARRES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	MURETE CIMENTACION A 2.10 2.10	B 1.00 0.90	DALAS (-) 0.3 0.3	REPETICIONES 1 1.00	3.20 3.10 6.30
5	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE 1:4. ACABADO COMUN DE 0.00 A 30.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO, ACARREO, ELEVACION, Y COLOCACION DEL MISMO, NORMAL 5.40 KG/CM2. APARENTE EN AMBAS CARAS.	M2	LONGITUD A 1.36 B 2.73 C 1.35	ALTURA 3.10 3.00 2.90	DALA CERRAMIENTO (0.15) 0.20 0.41 0.20	PUERTA (1*2) CASTILLO (0.15) VENTANA (0.60 * 0.60) 0.36	3.65 7.78 3.72 15.15


CONTRATISTA
ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETORESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE HUITRONTLOPEZ

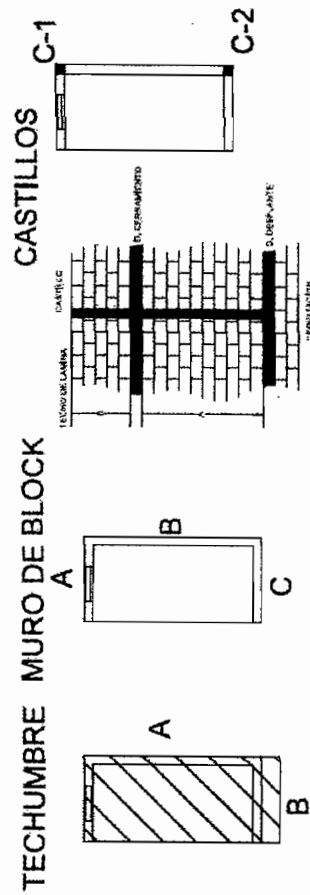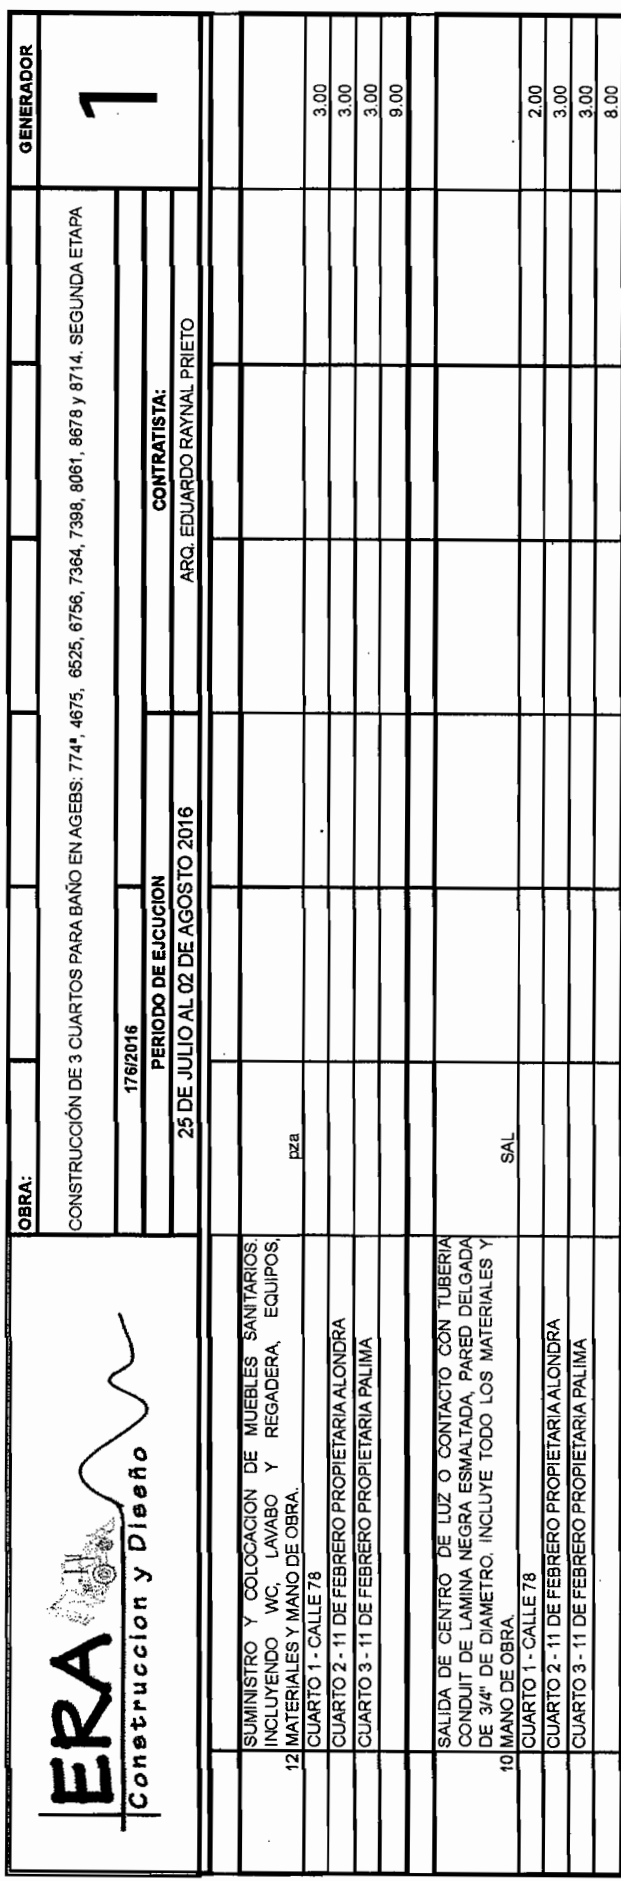

~~RESIDENTE DE OBRA~~
~~ING. JOSE HUITRON LOPEZ~~

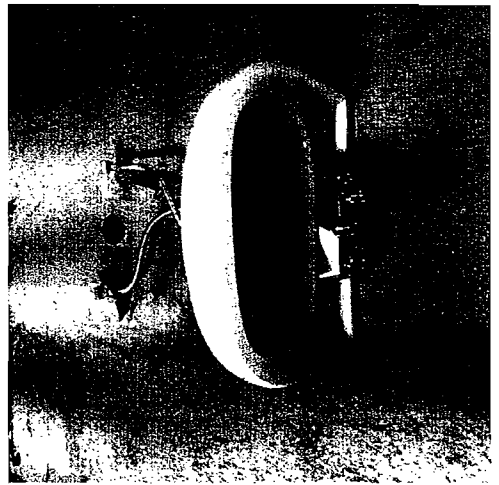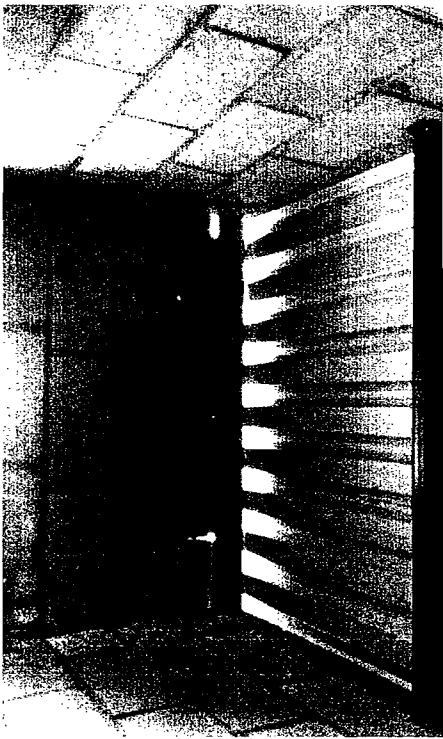

[Handwritten signature]

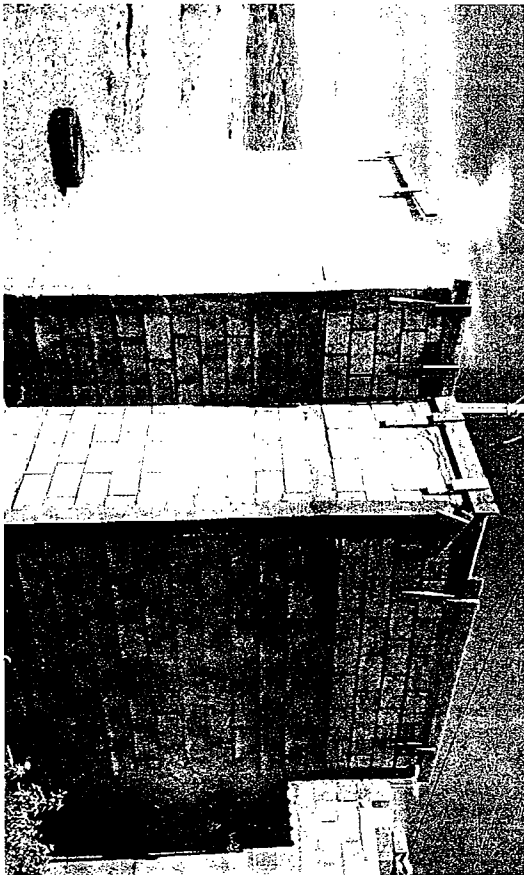

[Handwritten signature]

